

CATEDRA GALAVERNA 2025

ECONOMÍA Y ORGANIZACION DE OBRA

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

ECONOMÍA Y ORGANIZACION
DE OBRA

CATEDRA GALAVERNA 2025

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

MEMORIA TÉCNICA

PLANILLA DE LOCALES

PLANILLA DE PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN DE OBRA

GRÁFICOS DE INVERSION

PLANILLAS DE CERTIFICACIÓN

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham



CATEDRA GALAVERNA 2025

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

CARPETA TÉCNICA


INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

PLANTA BAJA

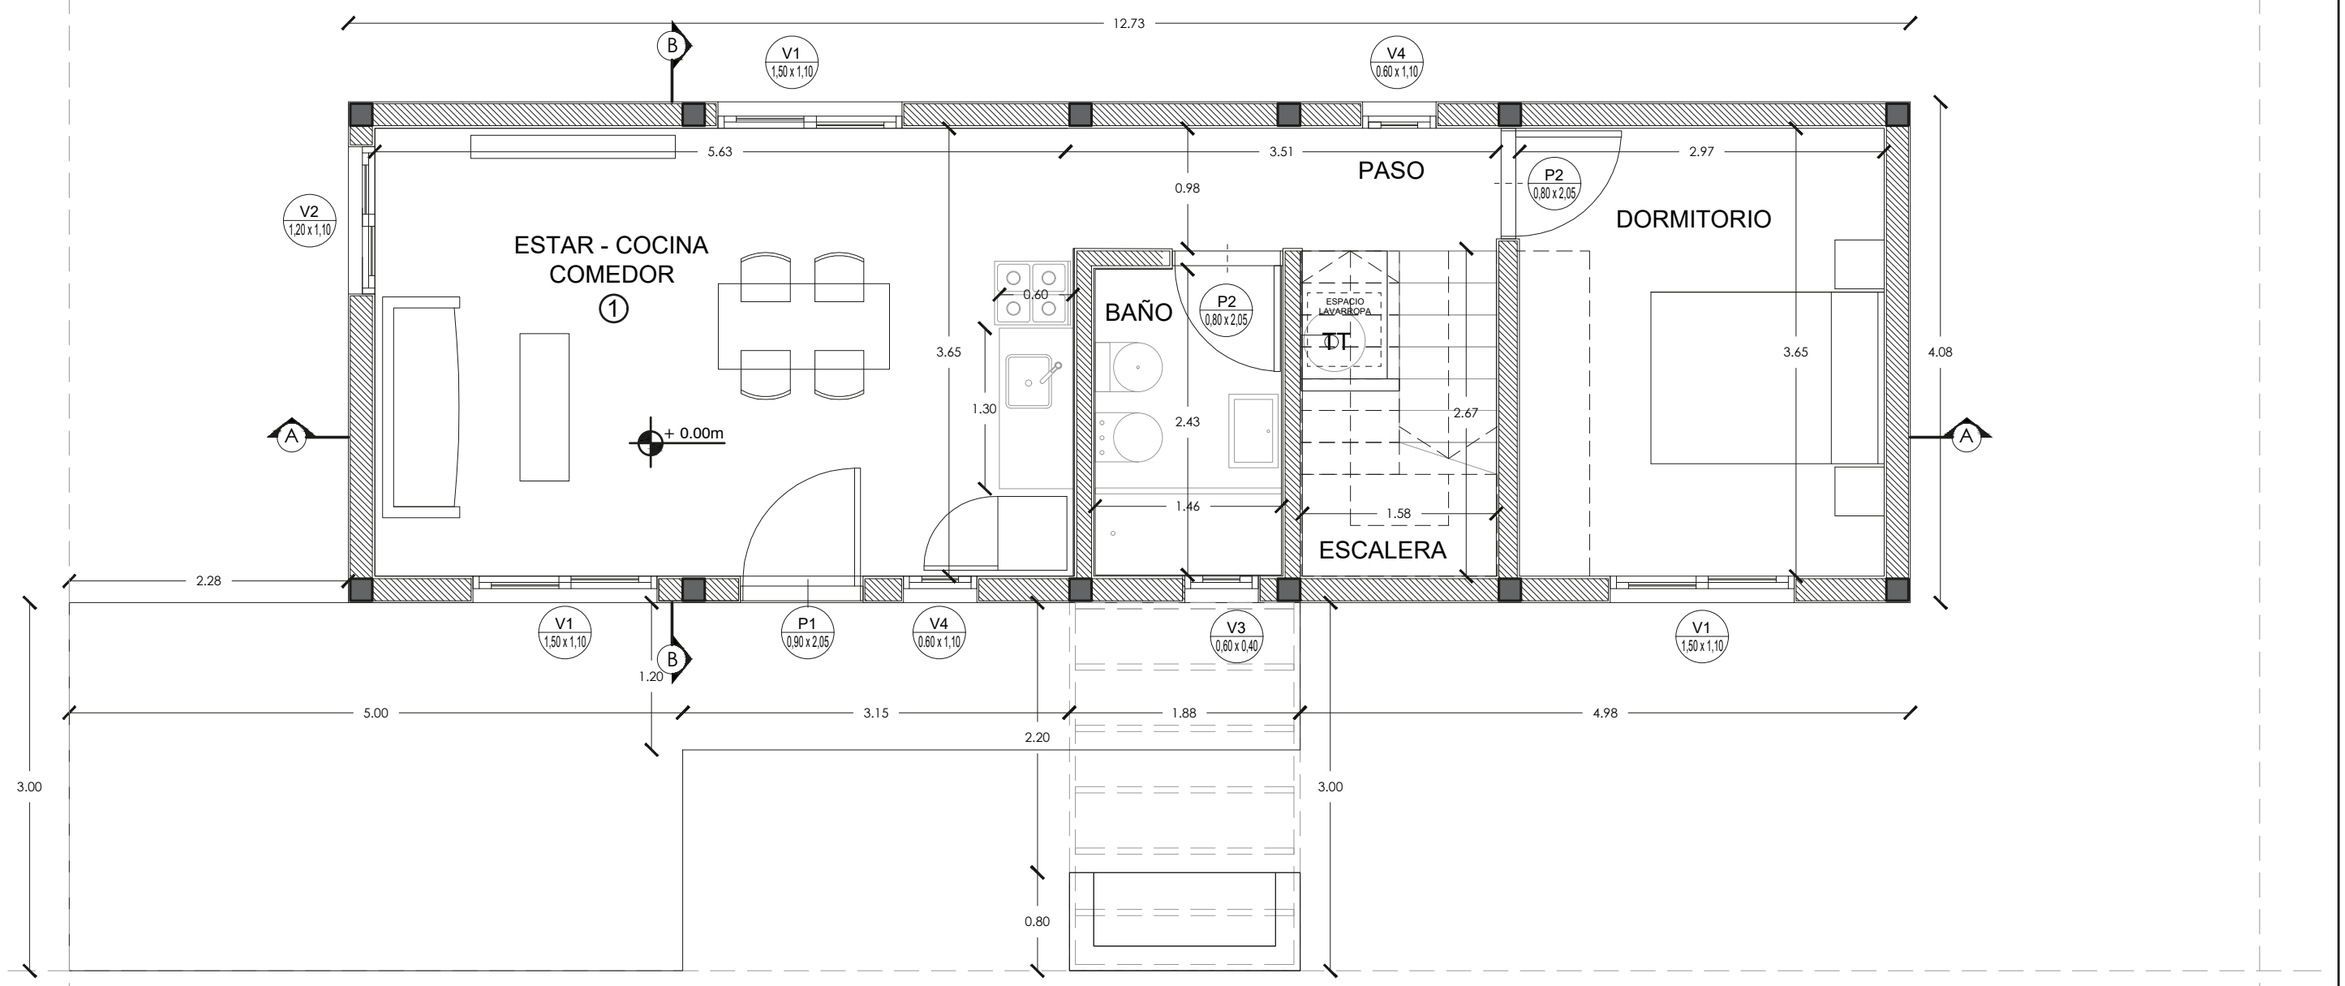

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : PLANTAS

ESC : 1:50

Nº : 1

PLANTA ALTA

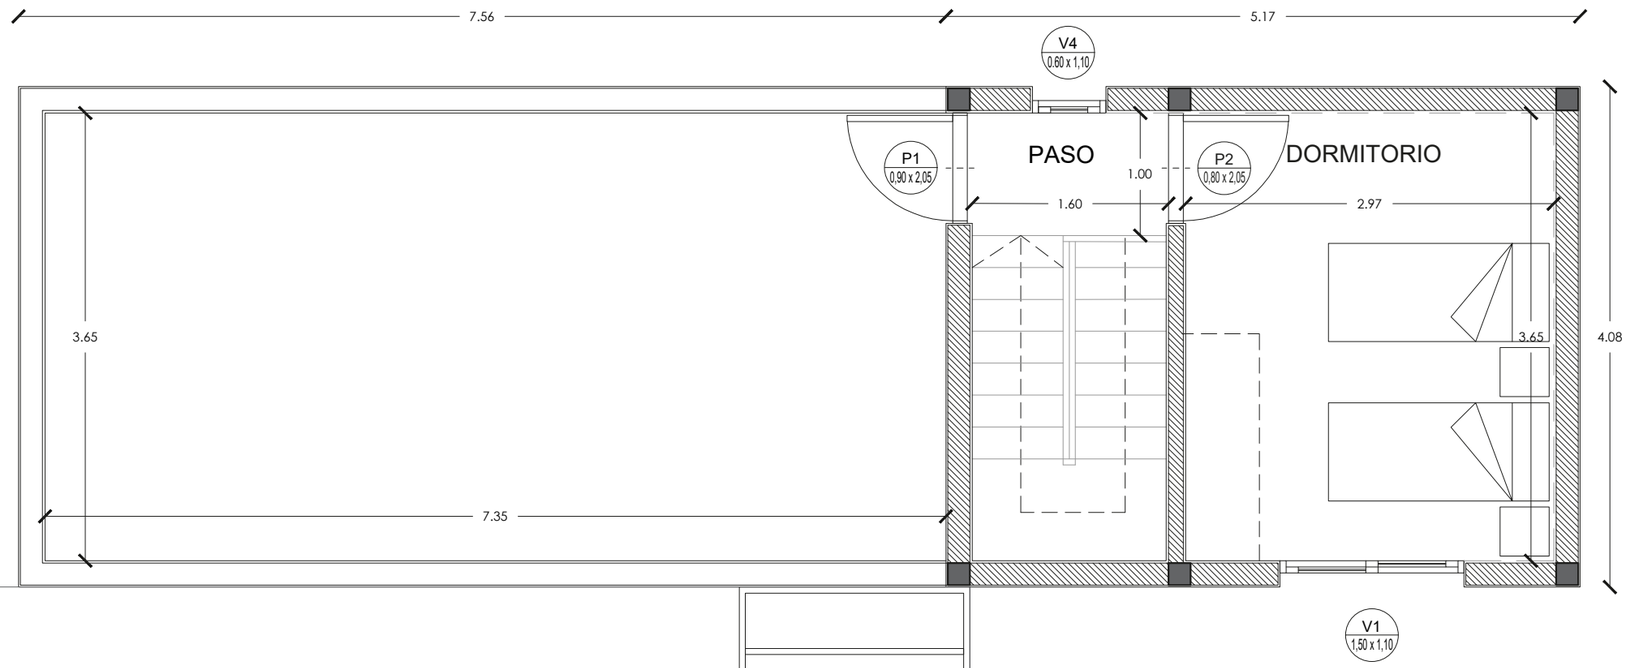

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : PLANTAS

ESC : 1:50

Nº : 2

PLANTA DE TECHOS

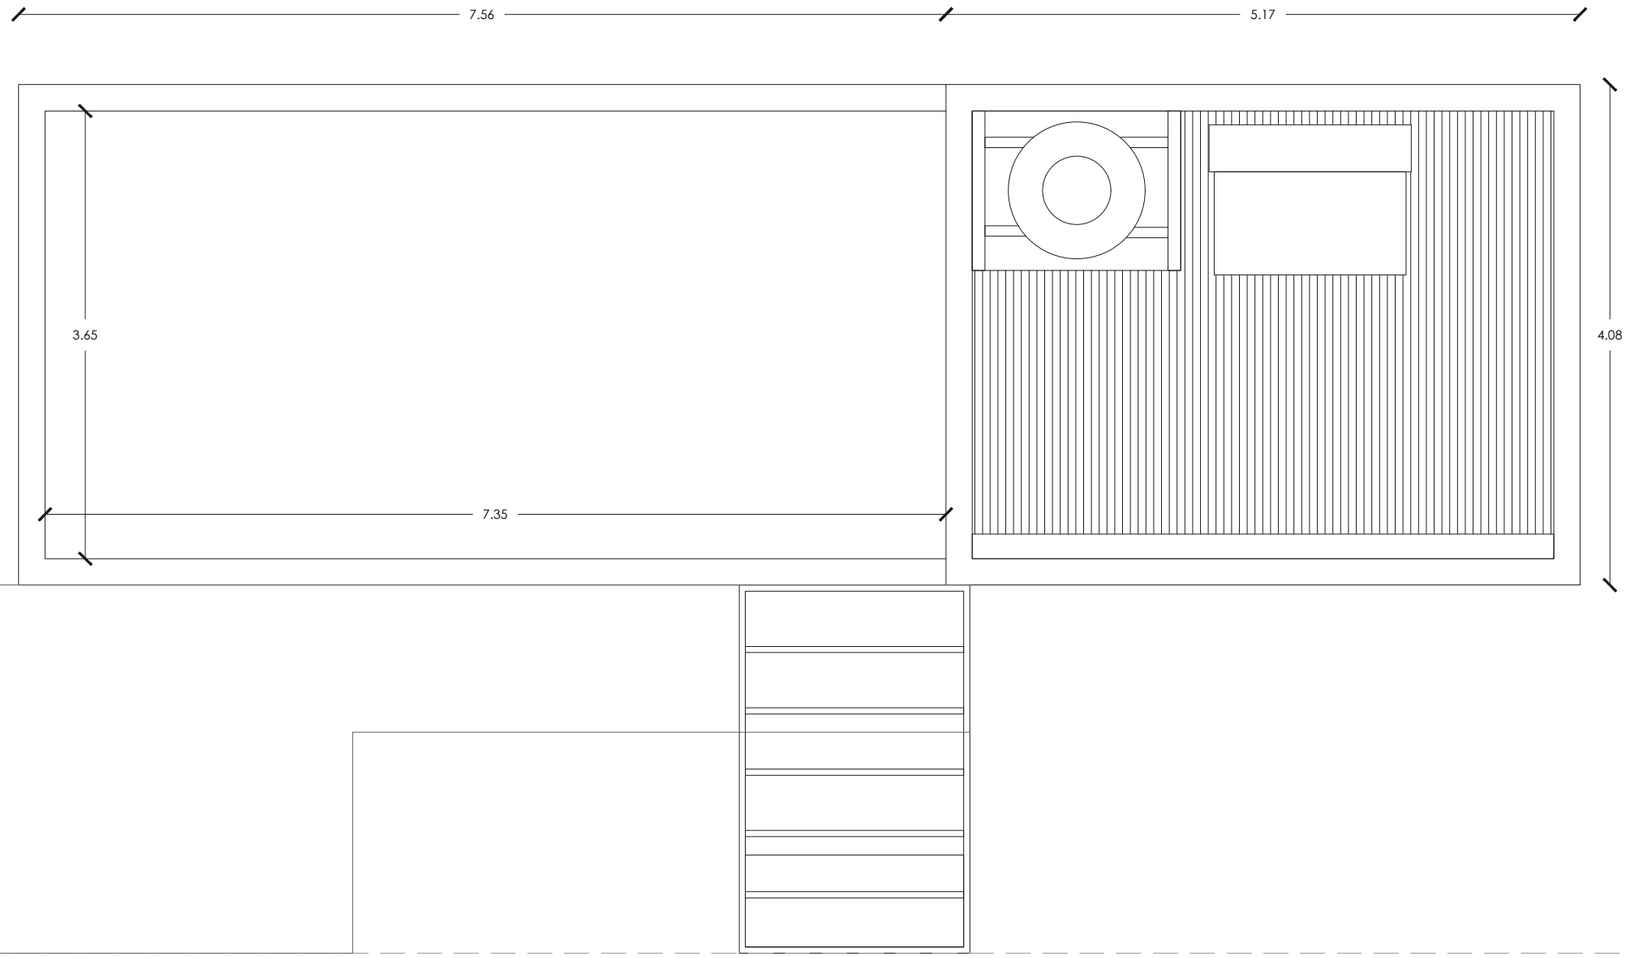

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : PLANTAS

ESC : 1:50

Nº : 3

PLANTA ALTA

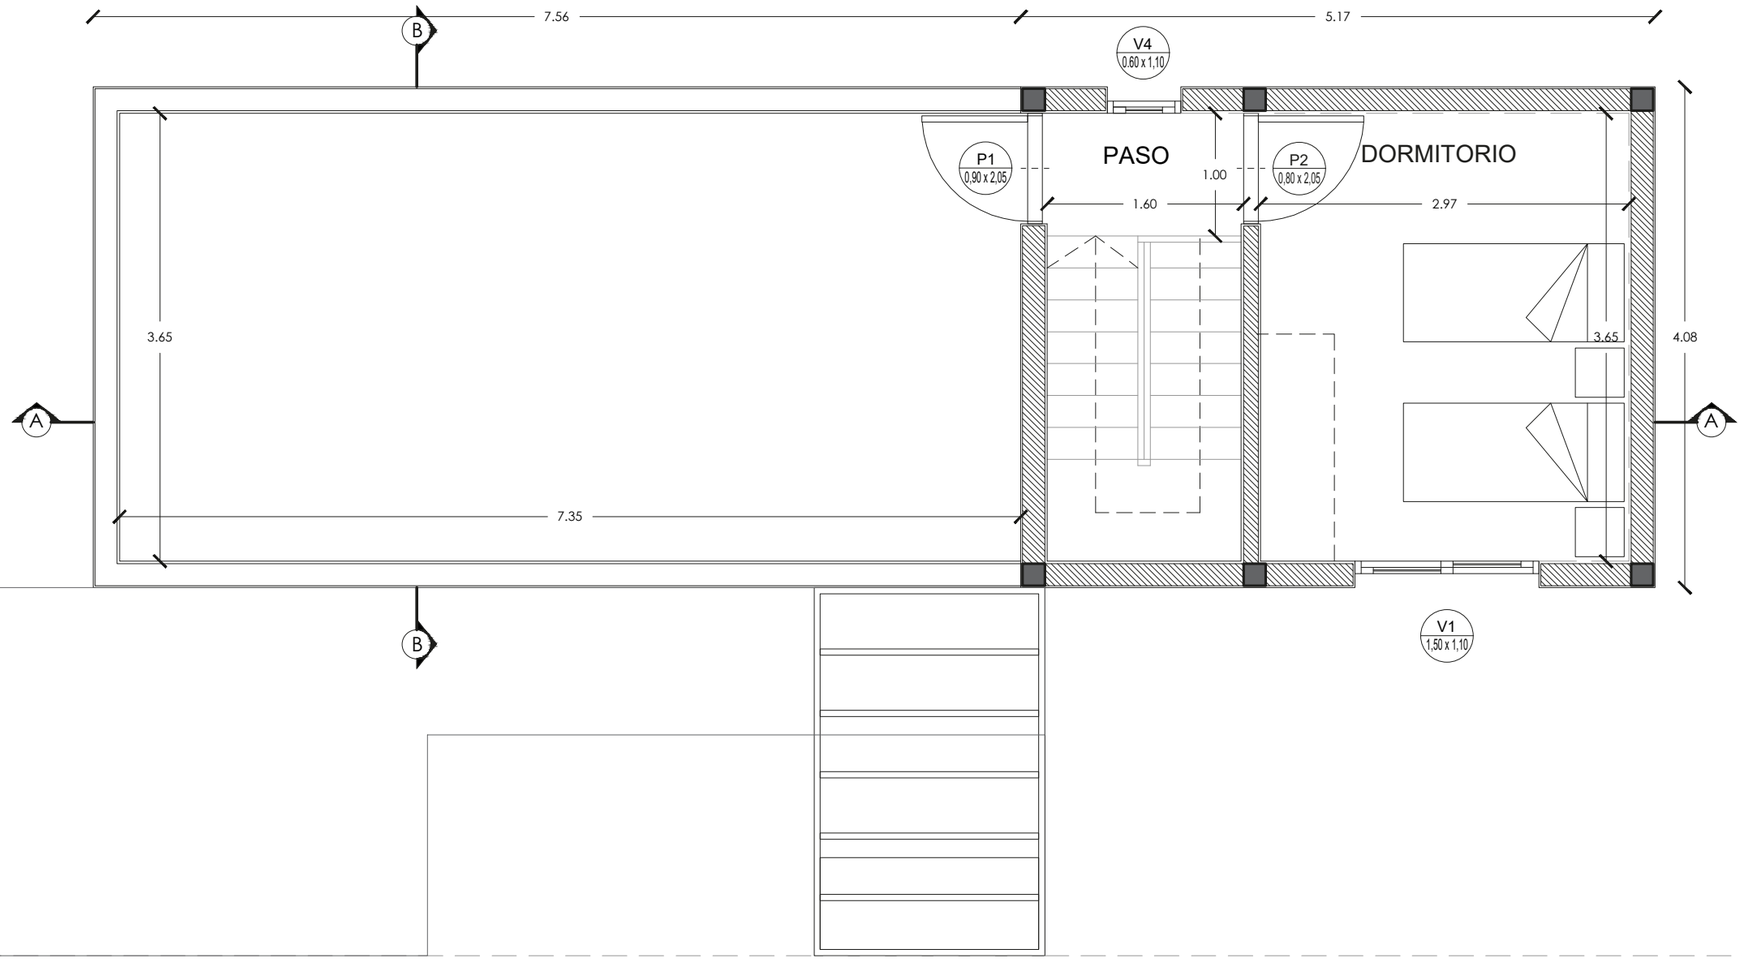

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : PLANTAS


ESC : 1:50

Nº : 2

VISTA LATERAL DER.

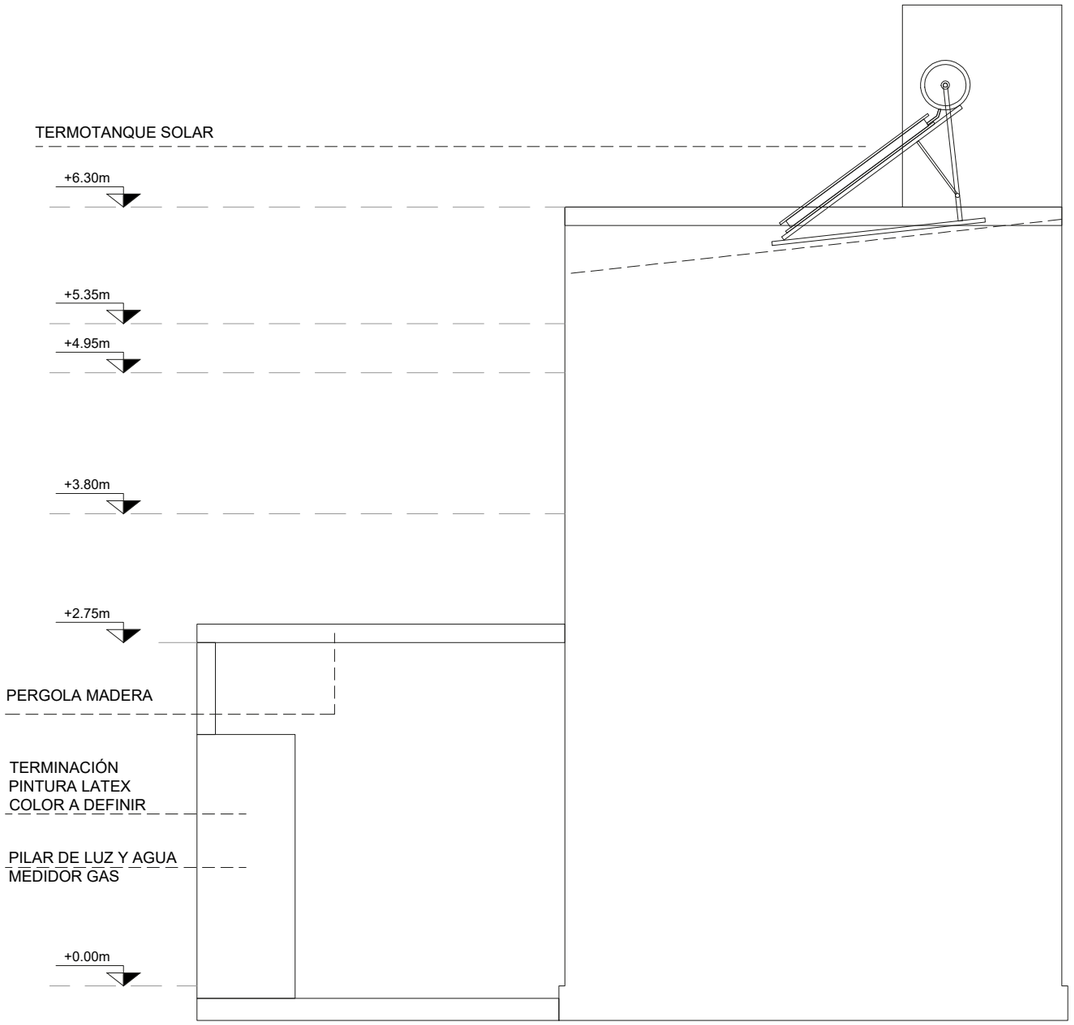

VISTA LATERAL IZQ.

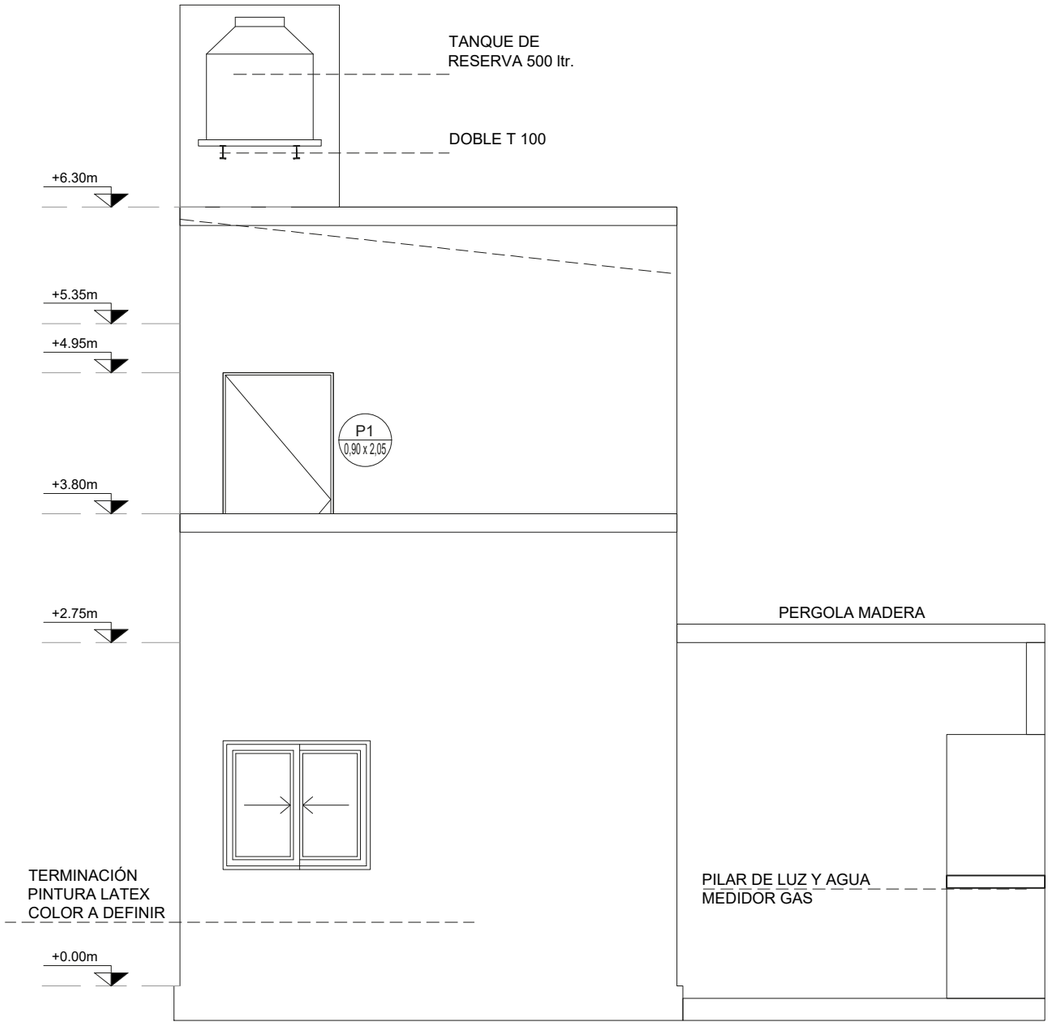

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : VISTAS

ESC : 1:50

Nº : 5

VISTA TRASERA

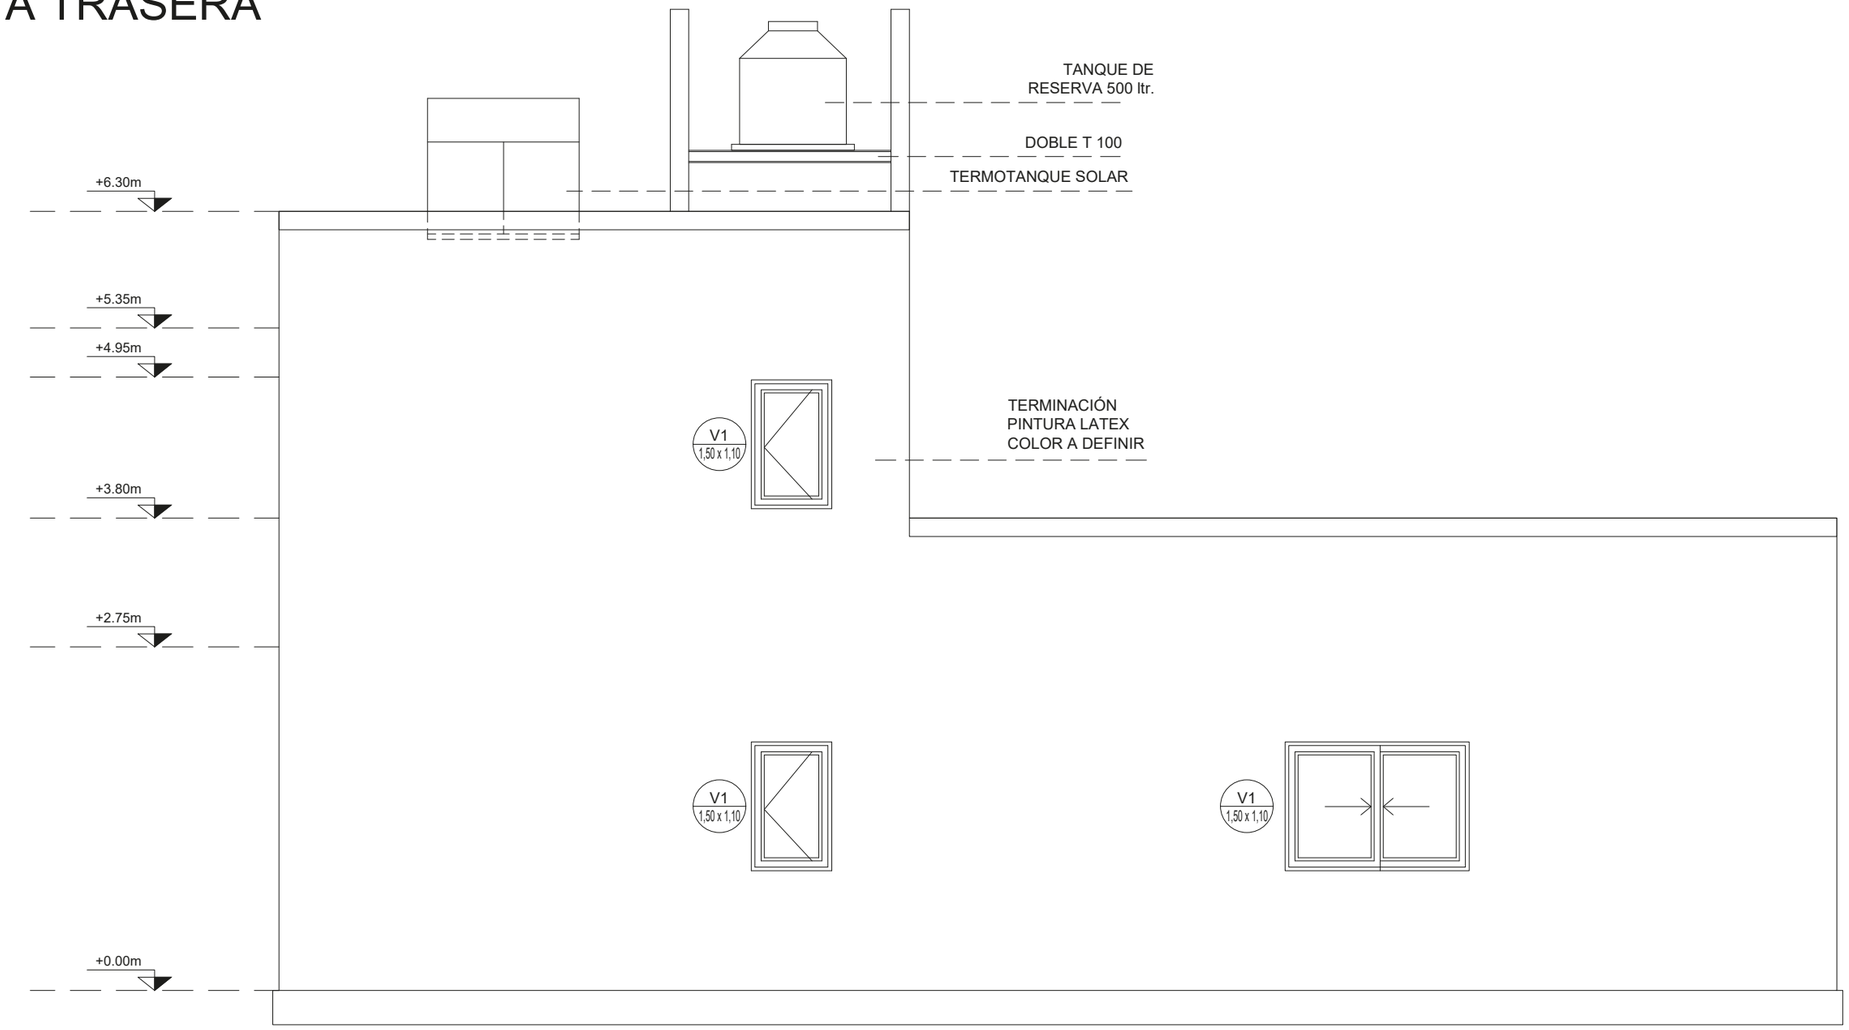

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : VISTAS

ESC : 1:50

Nº :

6

CORTE LONGITUDINAL A-A

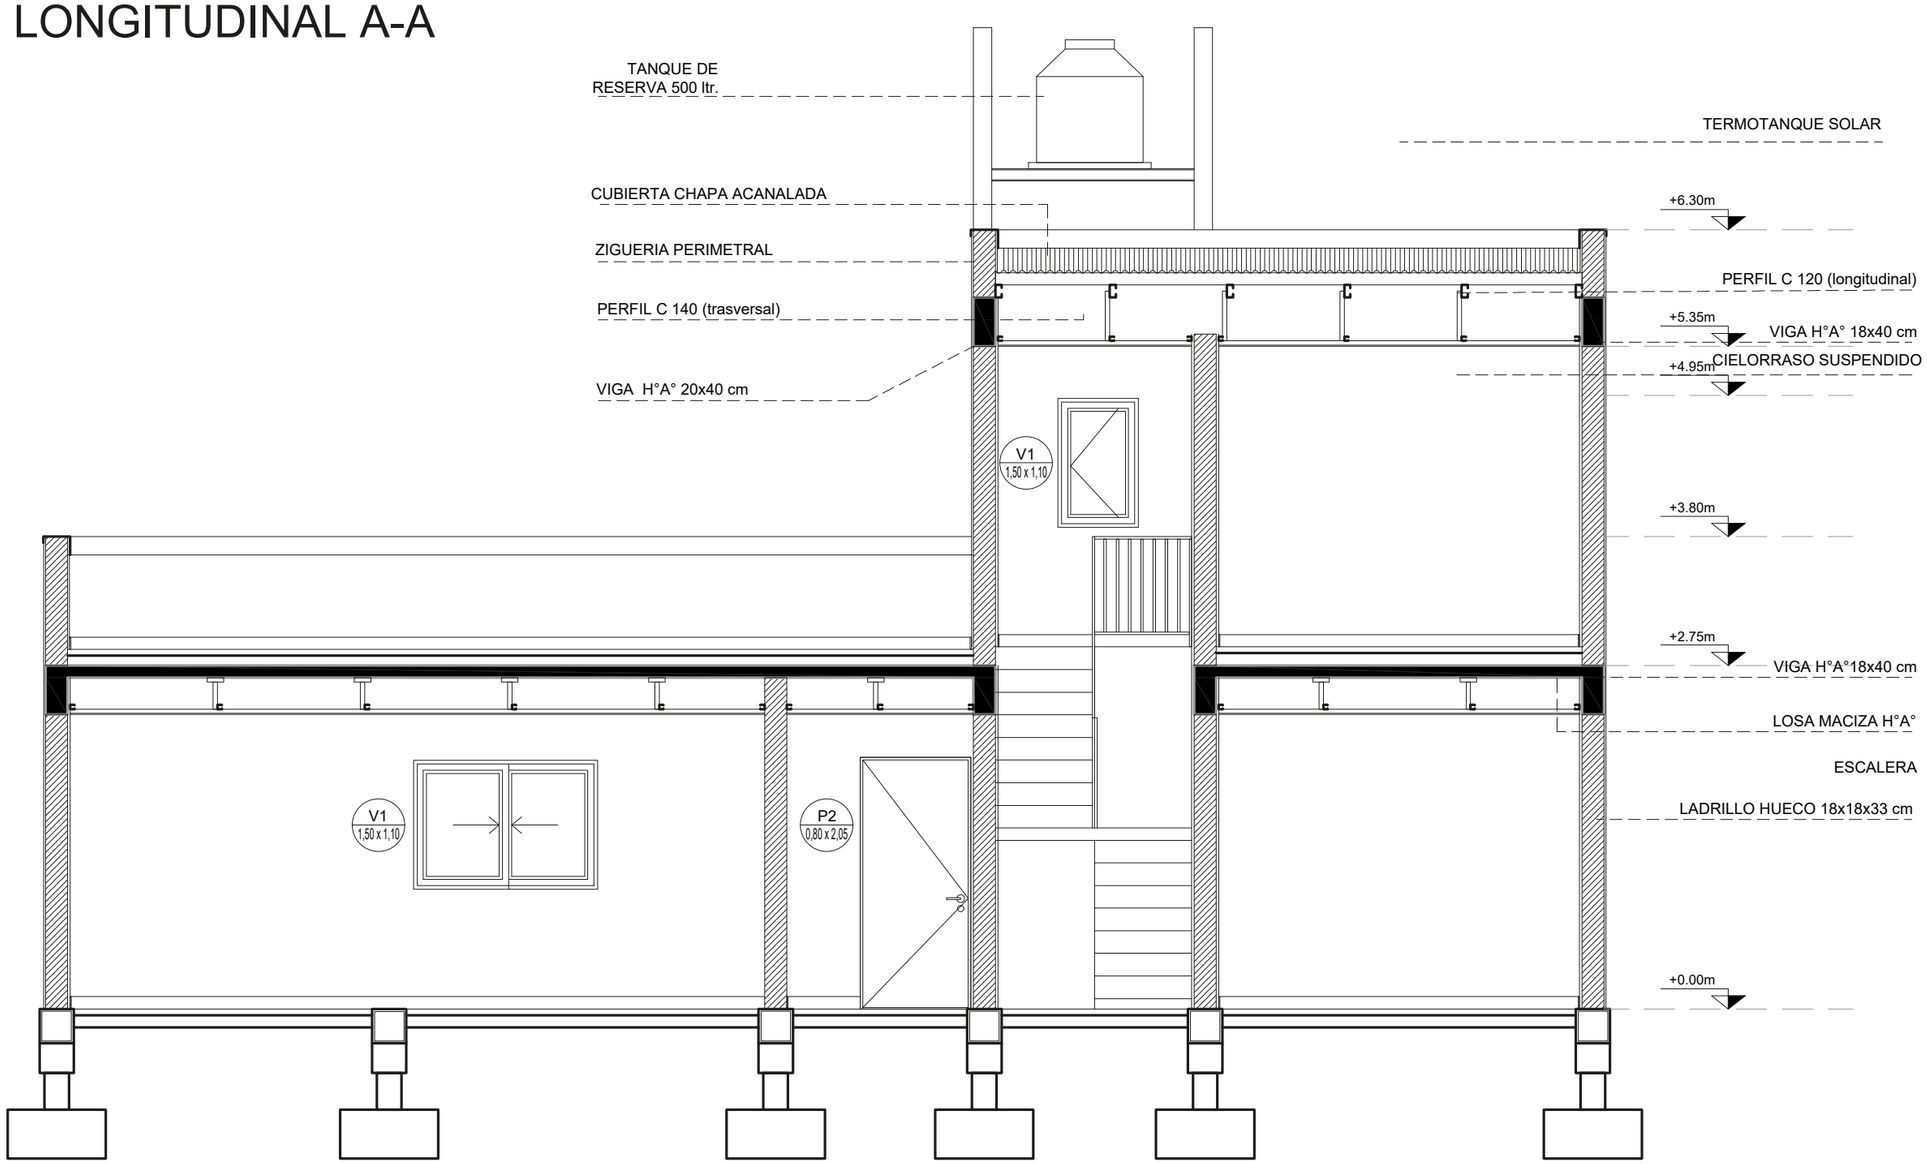

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : CORTES


ESC : 1:50

Nº : 7

CORTE B-B

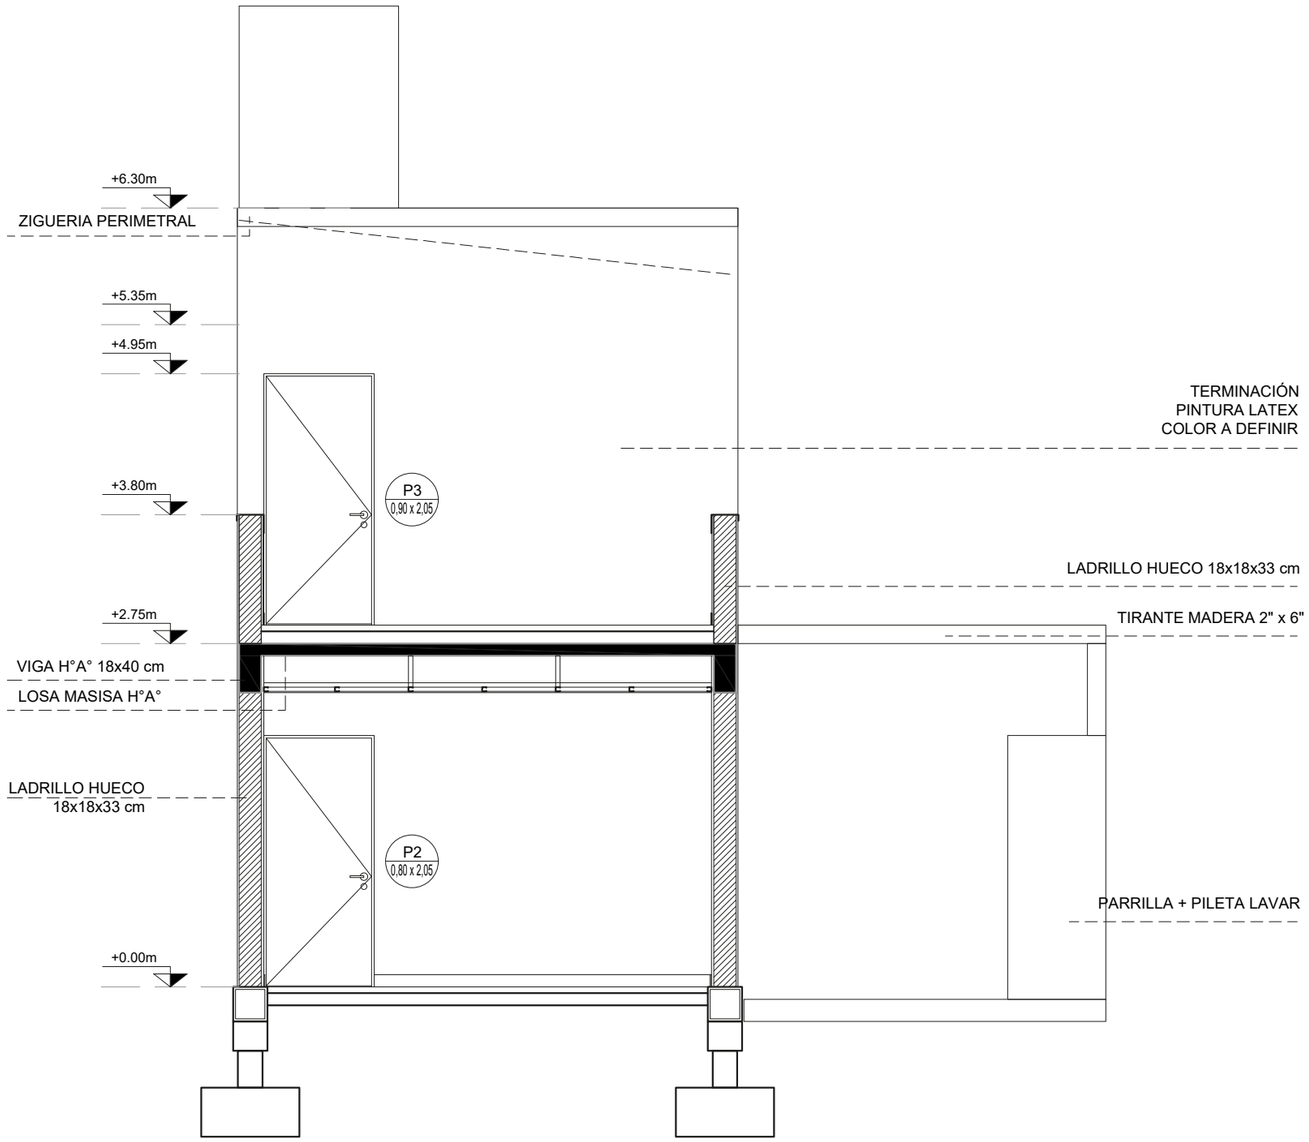

CORTE C-C

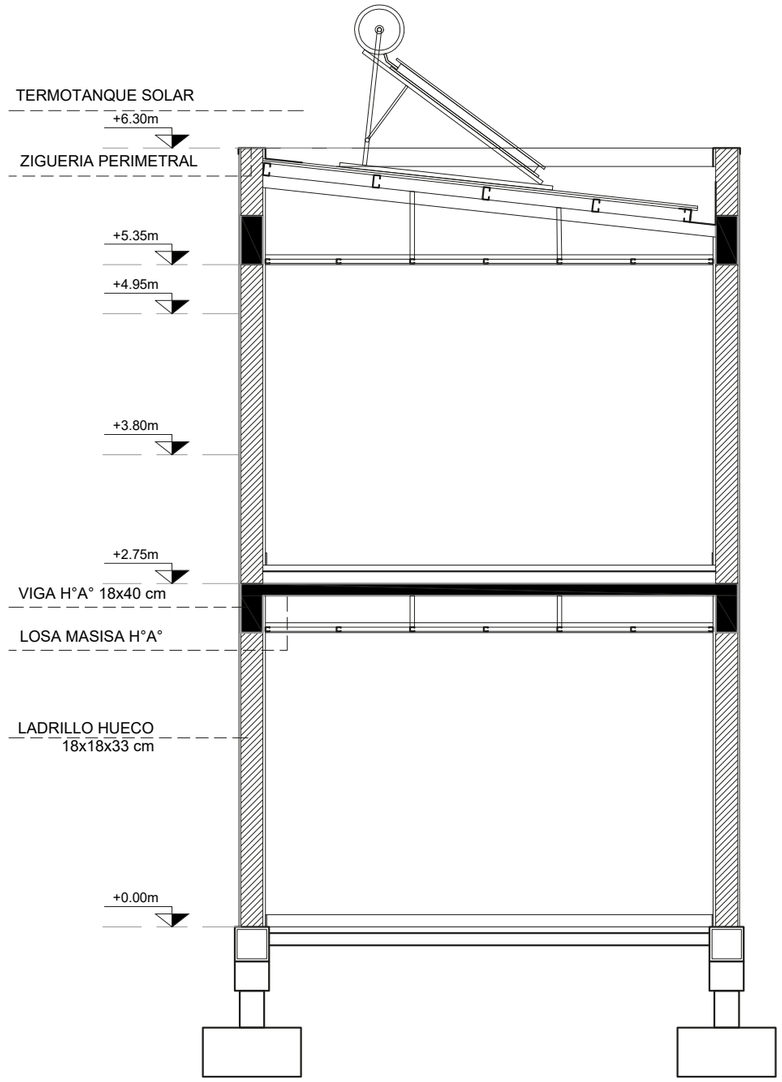

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : CORTES

ESC : 1:50

Nº : 8

ESQUEMATICO DE BASES

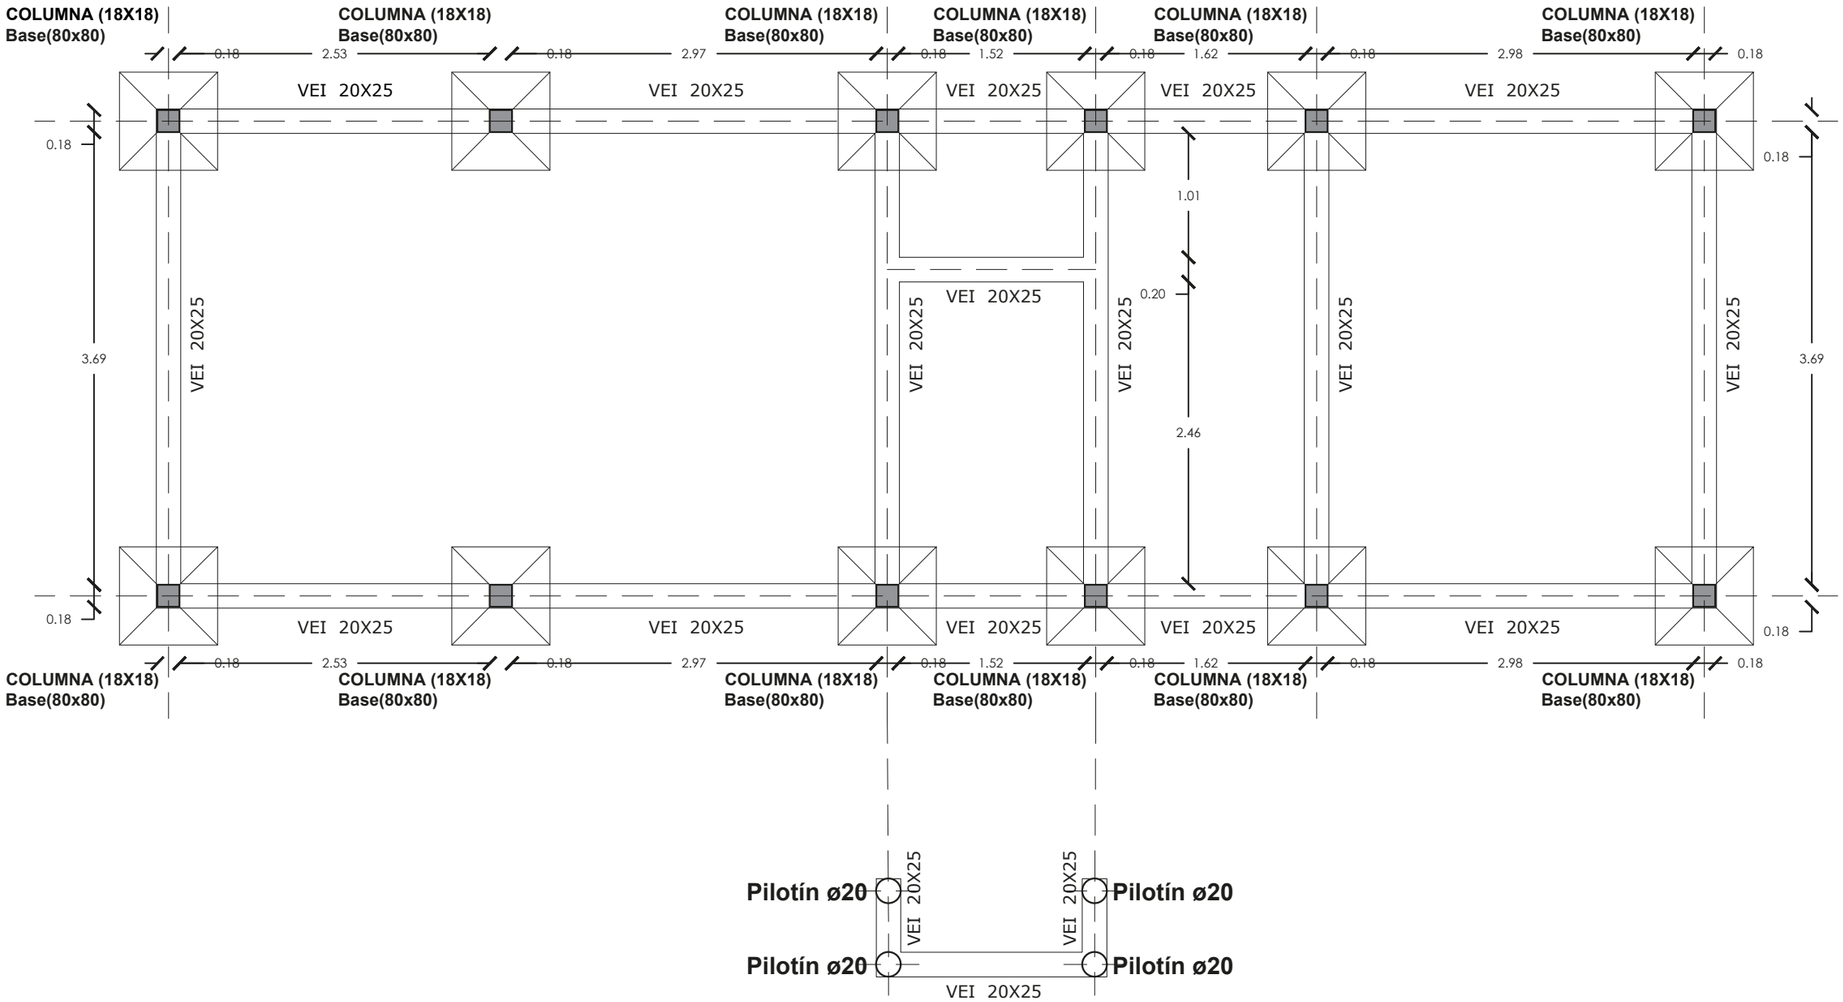

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE: ESQUEMATICO

ESC : 1:50

Nº : 9


REPLANTEO DE BASES

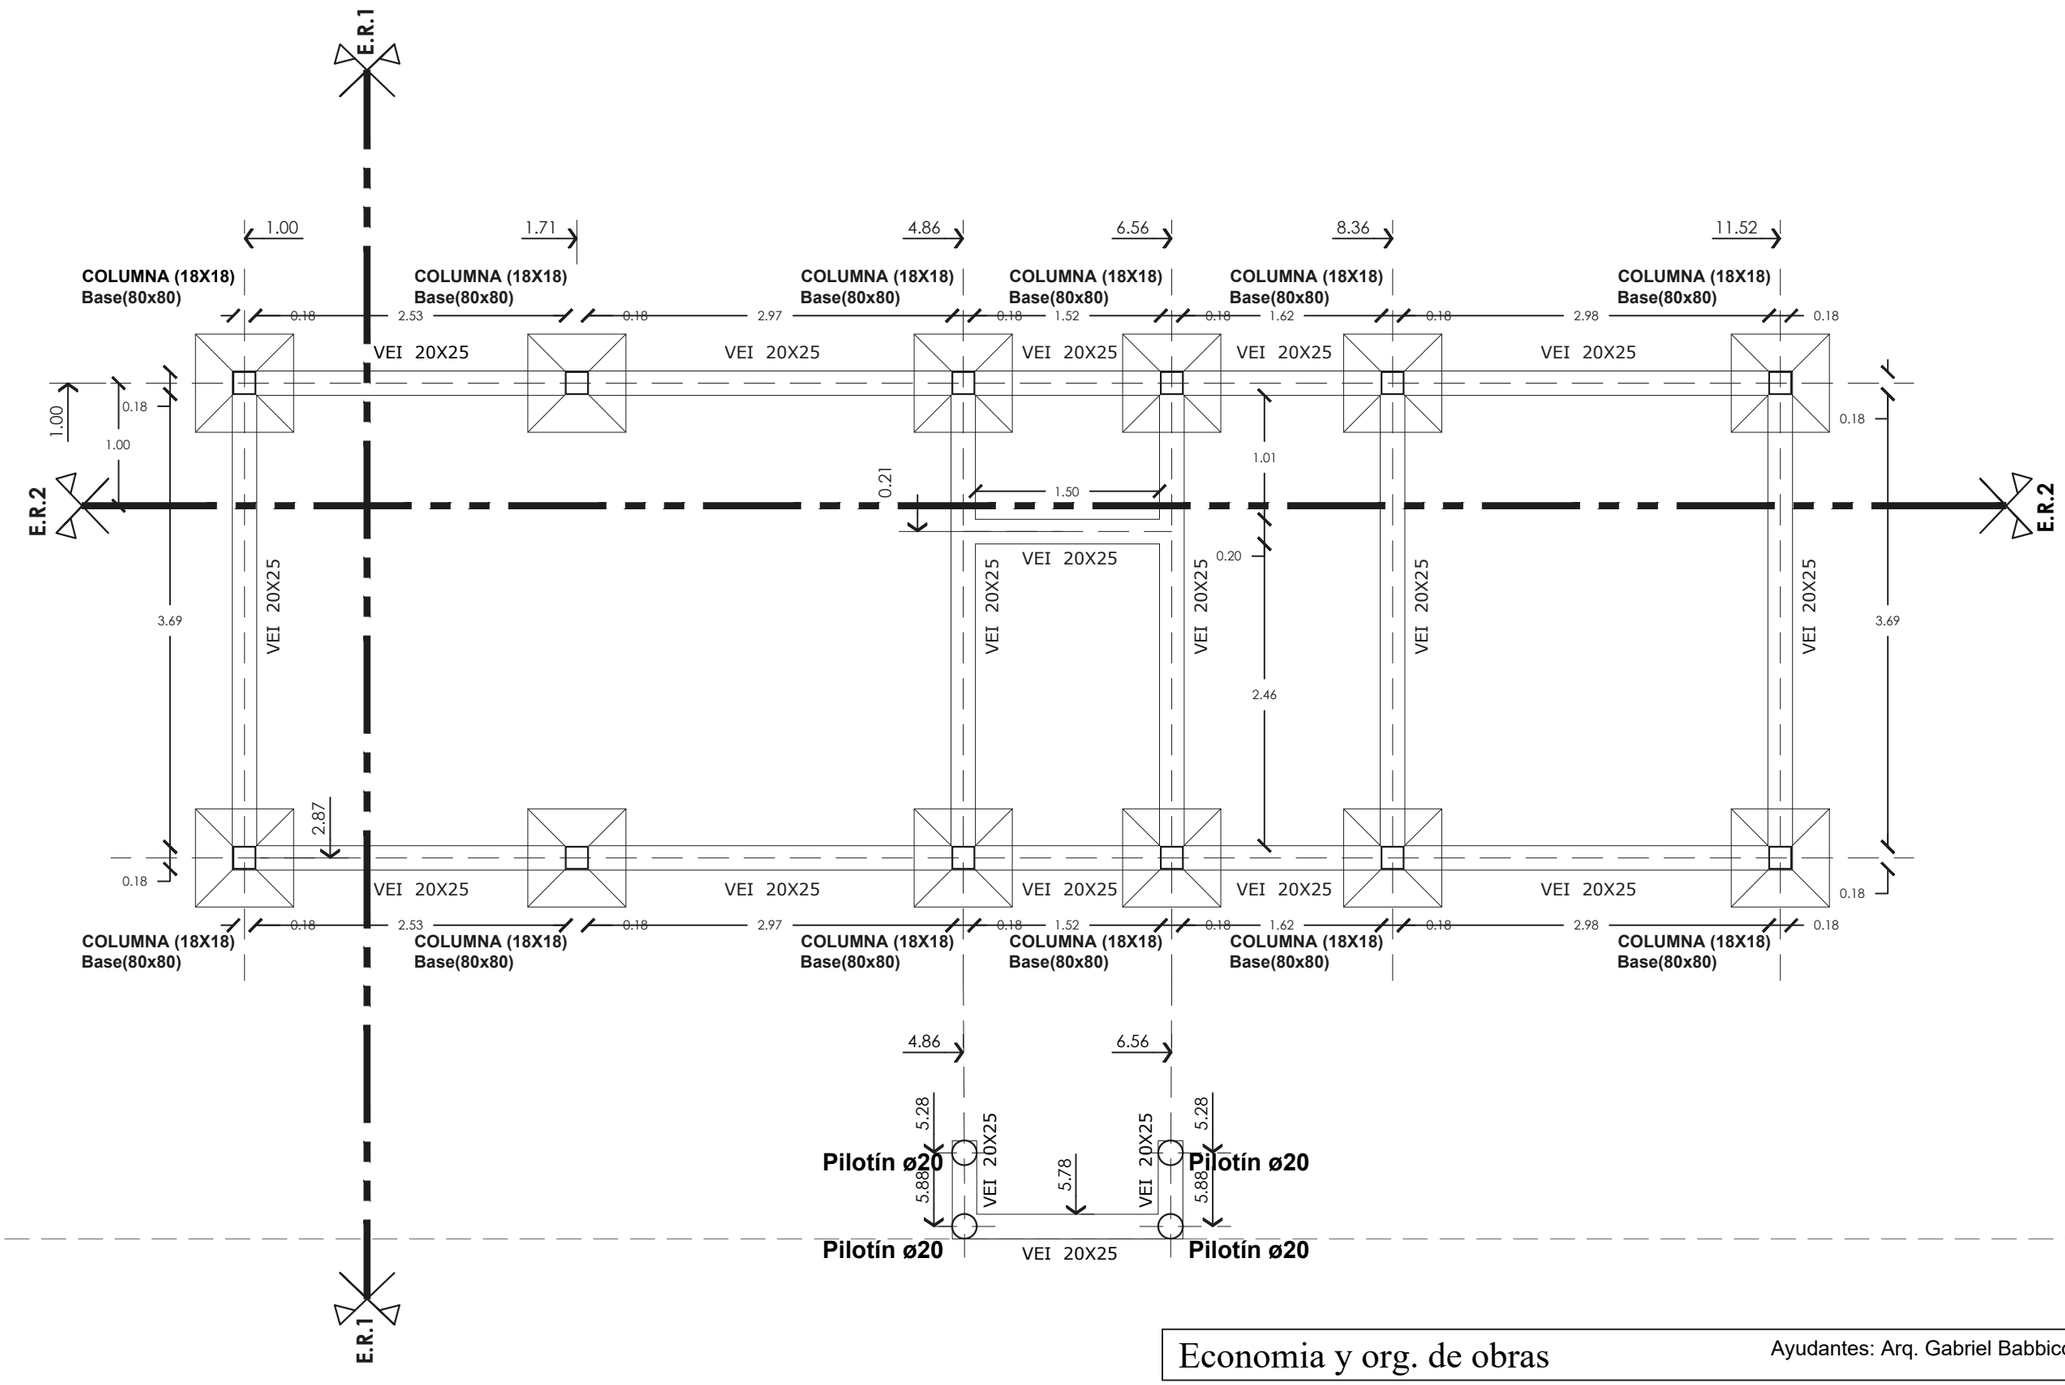


Economia y org. de obras	Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola	
GRUPO Nº: 14 DOMINGUEZ, Juan Ignacio GUAJARDO, Santiago COLAVITA, Juan Cruz	PLANO DE : REPLANTEO ESC : 1:50	Nº : 10

Puerta 1

Tipologia 2 Acceso Vivienda | 2

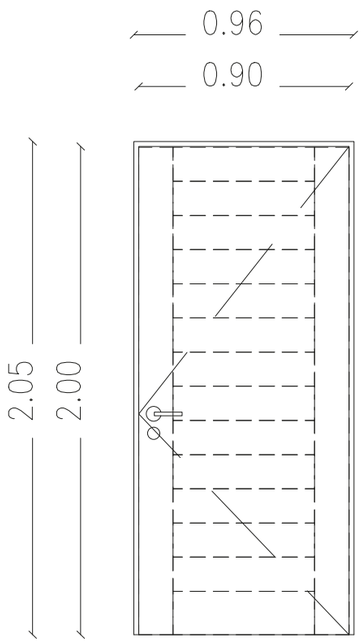





P1
0,90

Puerta Acceso
Alto: 2,05 m
Ancho: 0,90 m
Tipo: Doble contacto
Material: Puerta Tablero 2"
Terminación: Dos manos esmalte sintético.

Puerta 2

Tipologia 2 Acceso Dormitorios | 3

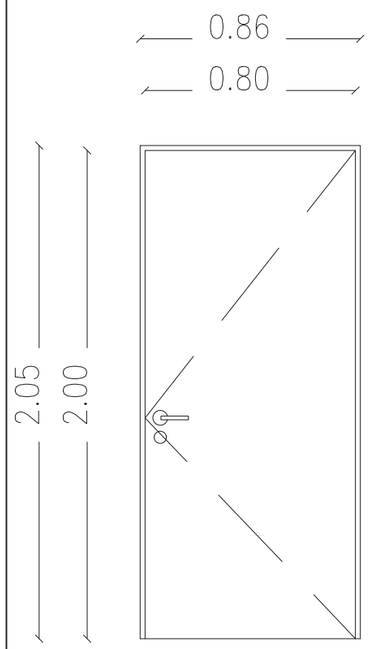





P2
0,80

Puertas Interiores
Alto: 2,05m
Ancho: 0,80 m
Tipo: Placa
Material: Puerta placa
Terminación: Dos manos esmalte sintético.

Ventana 1

Tipologia 2 Estar - comedor | 4

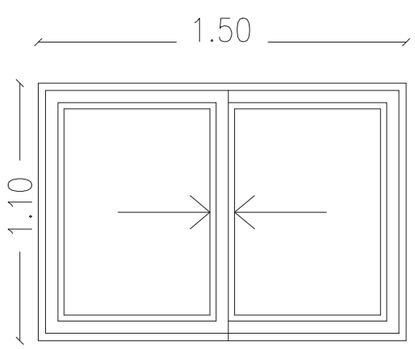





V1
1,50

Ventana
Alto: 1,10 m
Ancho: 1,50 m
Tipo: Aluminio Modena Anodizado
Blanco con DVH y premarco

Ventana 2

Tipologia 2 Dormitorios | 1

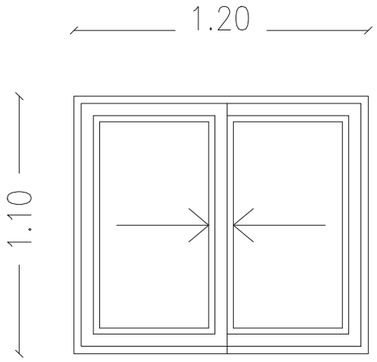





V2
1,20

Ventana
Alto: 1,10 m
Ancho: 1,20 m
Tipo: Aluminio Modena Anodizado
Blanco con DVH y premarco

Ventana 3

Tipologia 2 Baño | 1







V3
0,60

Ventana
Alto: 0,40 m
Ancho: 0,60 m
Tipo: Aluminio Modena Anodizado
Blanco con DVH y premarco

Ventana 4

Tipologia 2 Escalera | 3





V4
0,60

Ventana
Alto: 1,10 m
Ancho: 0,60 m
Tipo: Aluminio Modena Anodizado
Blanco con DVH y premarco

PLANILLA DE CARPINTERIAS

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE: CARPINTERIAS

ESC : 1:20

Nº : 11

DETALLE CONSTRUCTIVO: FUNDACIONES

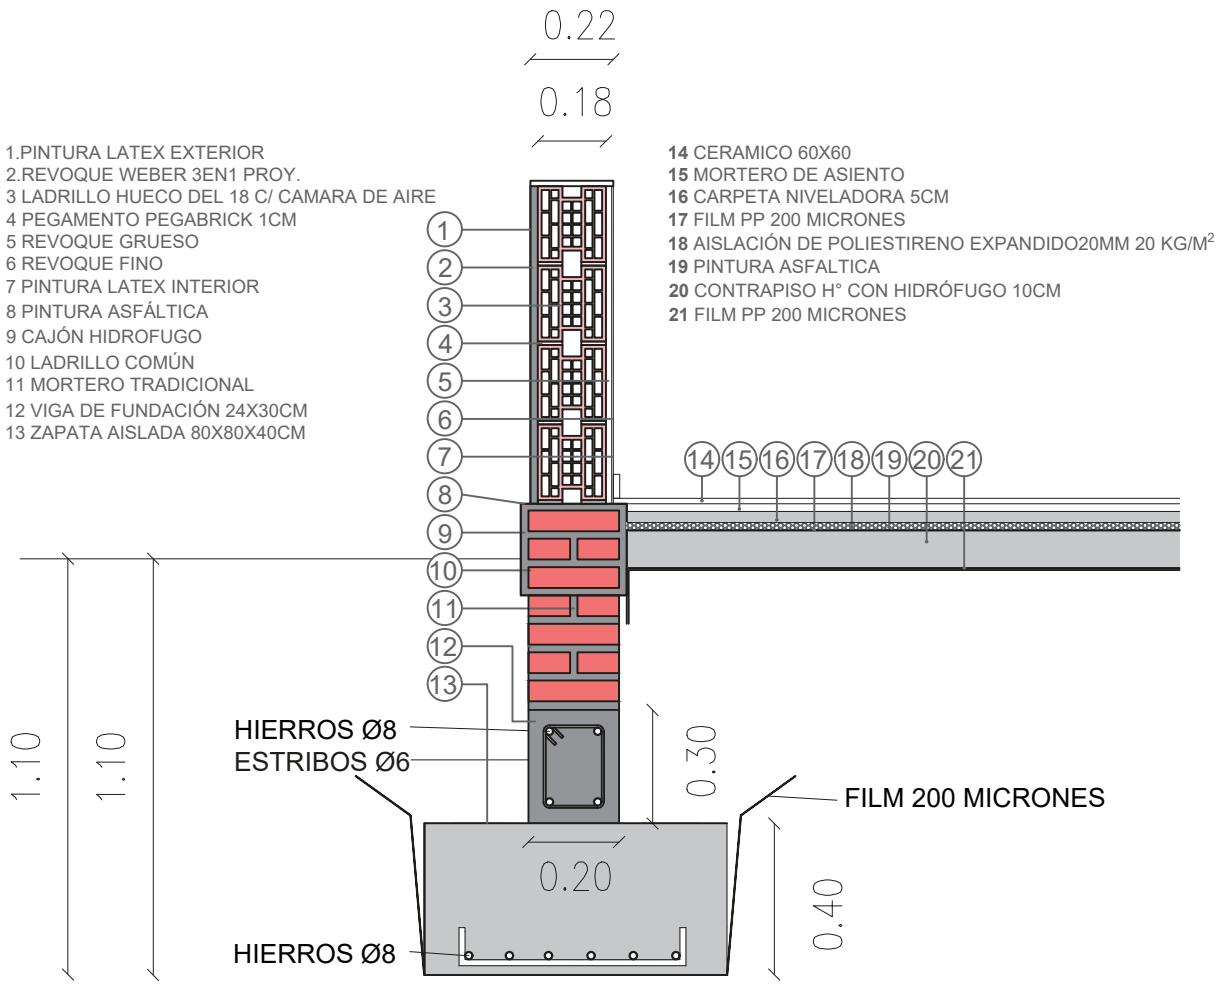

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : DETALLE FUNDACIONES

ESC : 1:20

N° : 12

PLANTA BAJA

INSTALACIÓN DE AGUA

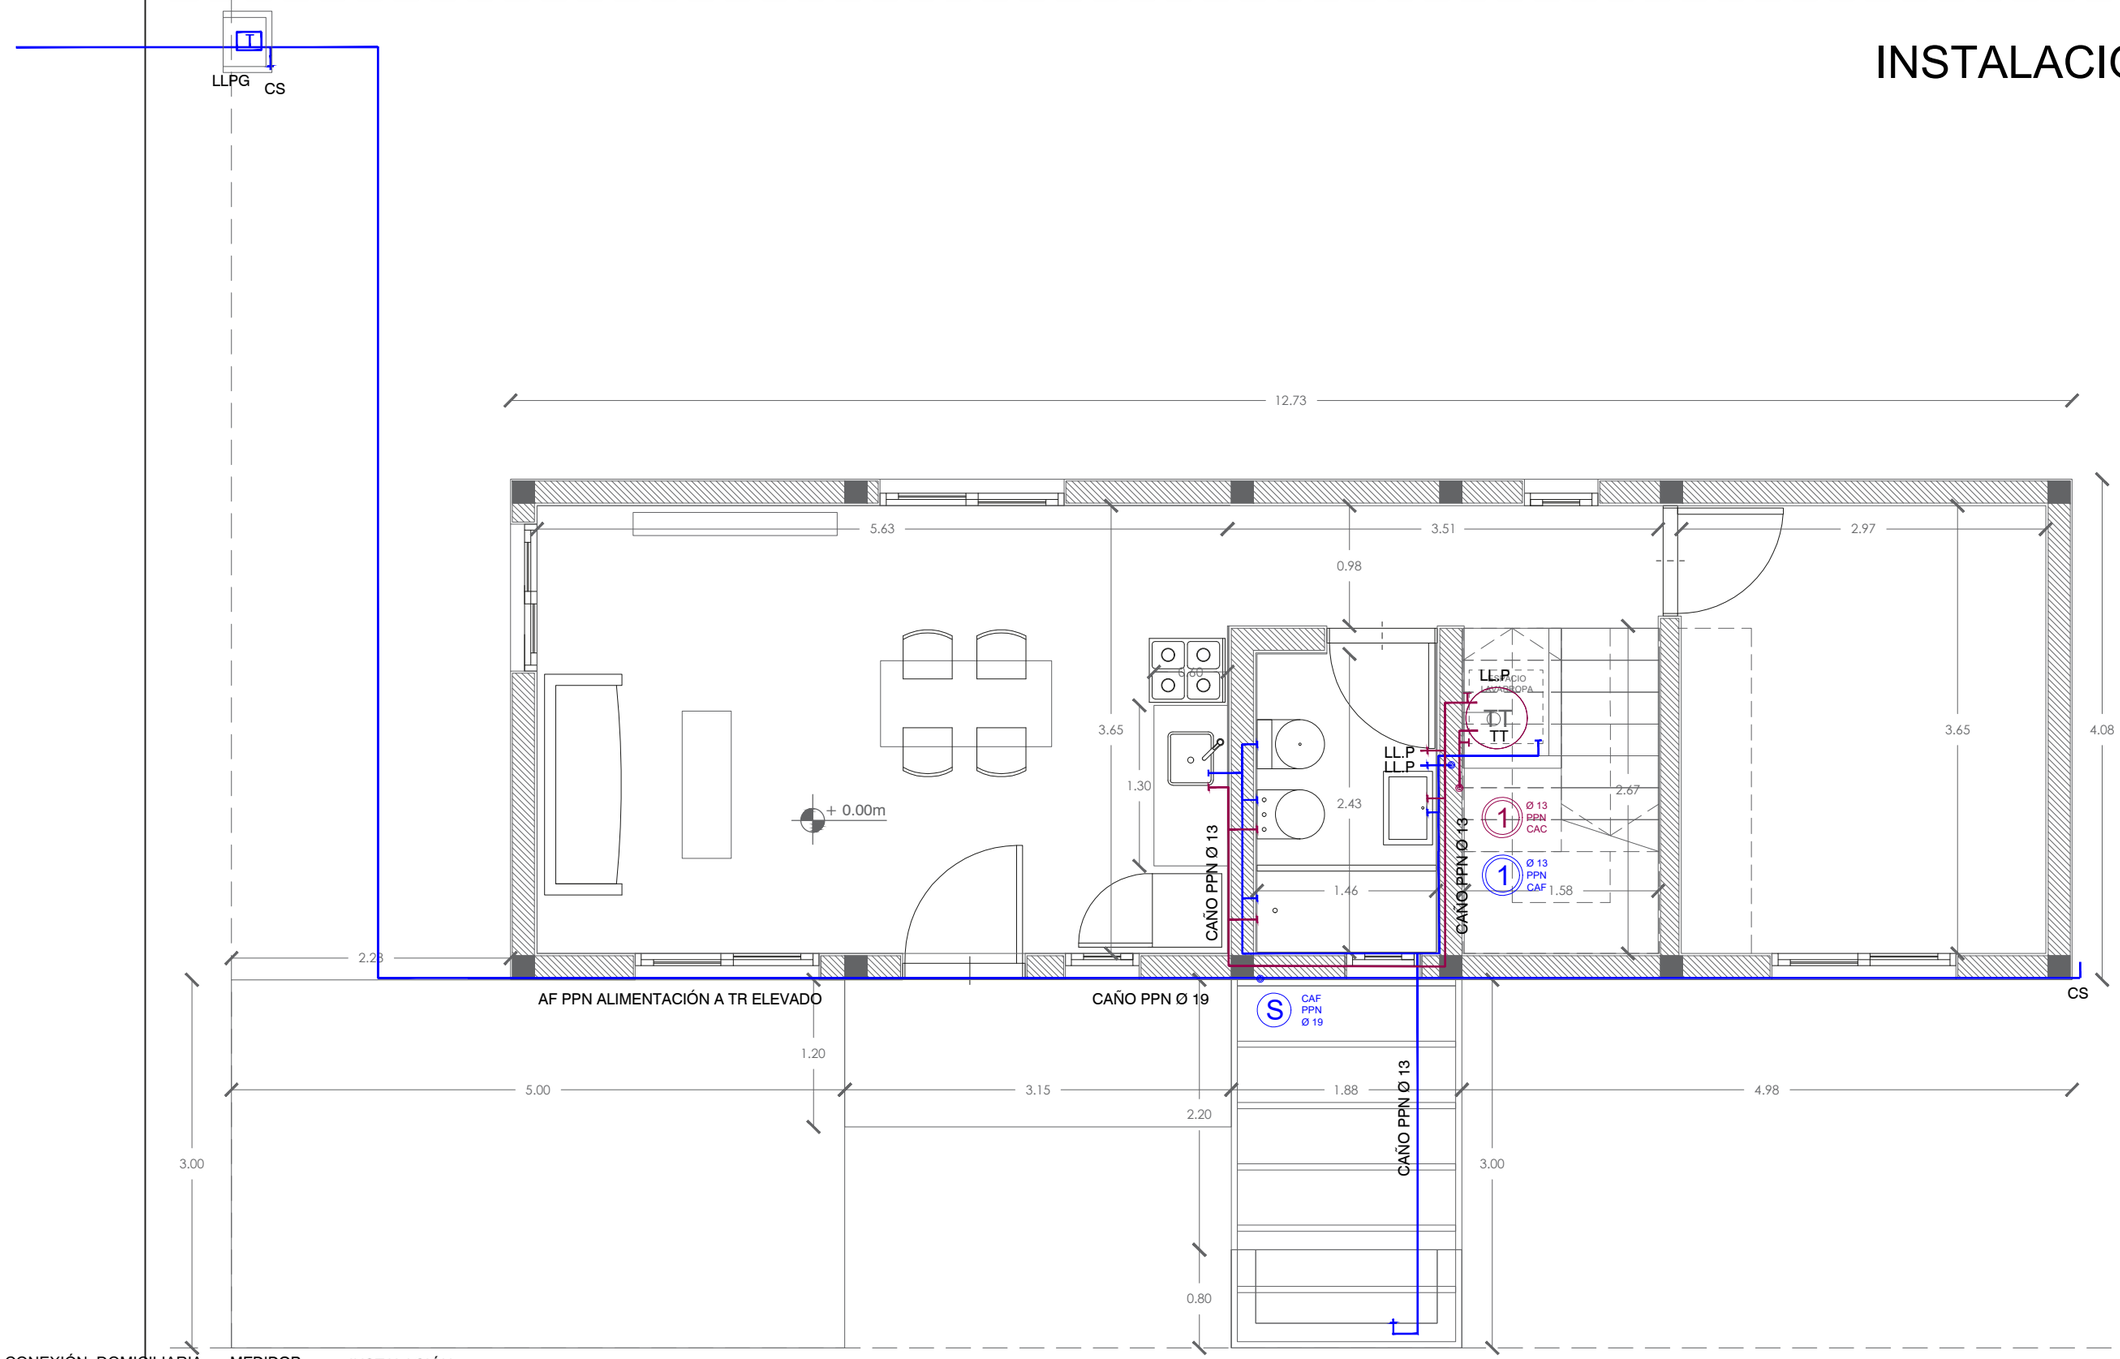

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : AGUA

ESC : 1:50

Nº : 13

PLANTA ALTA

INSTALACIÓN DE AGUA

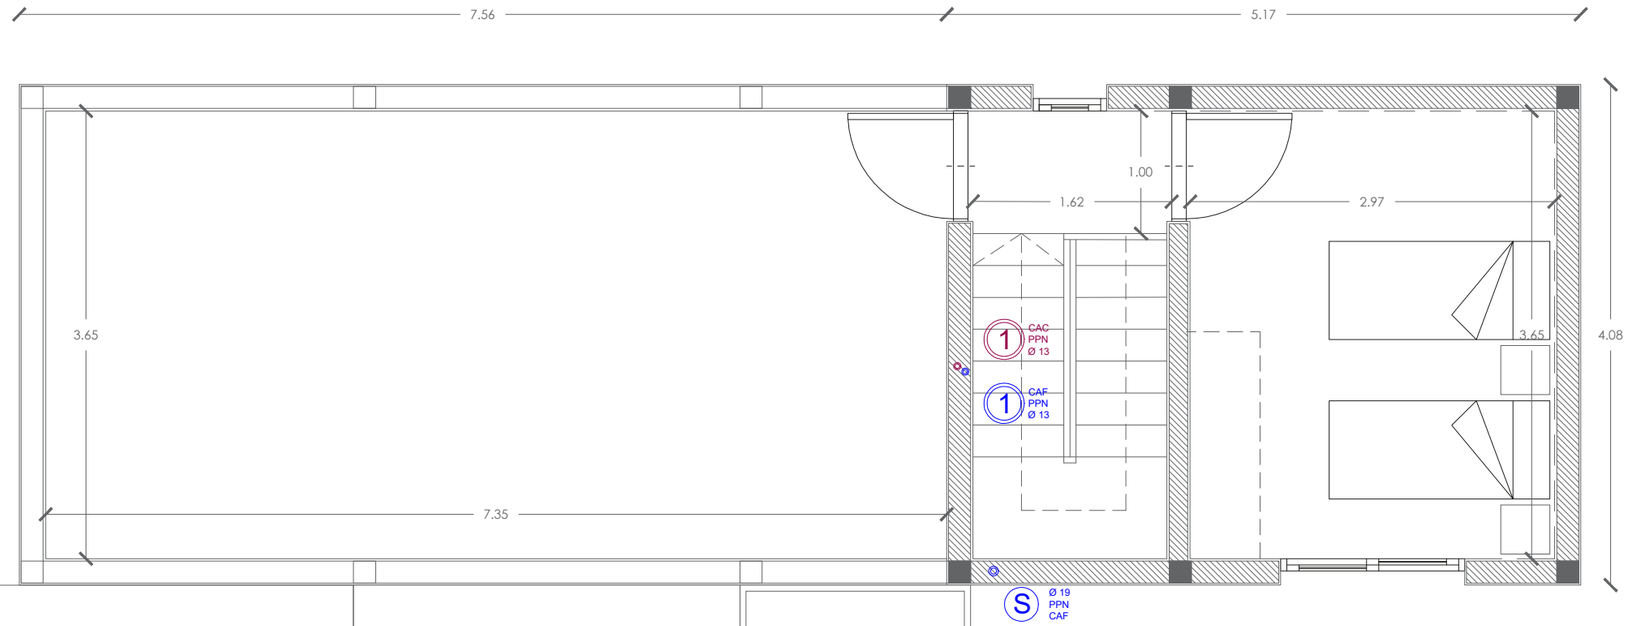

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : AGUA

ESC : 1:50

Nº : 14

PLANTA BAJA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

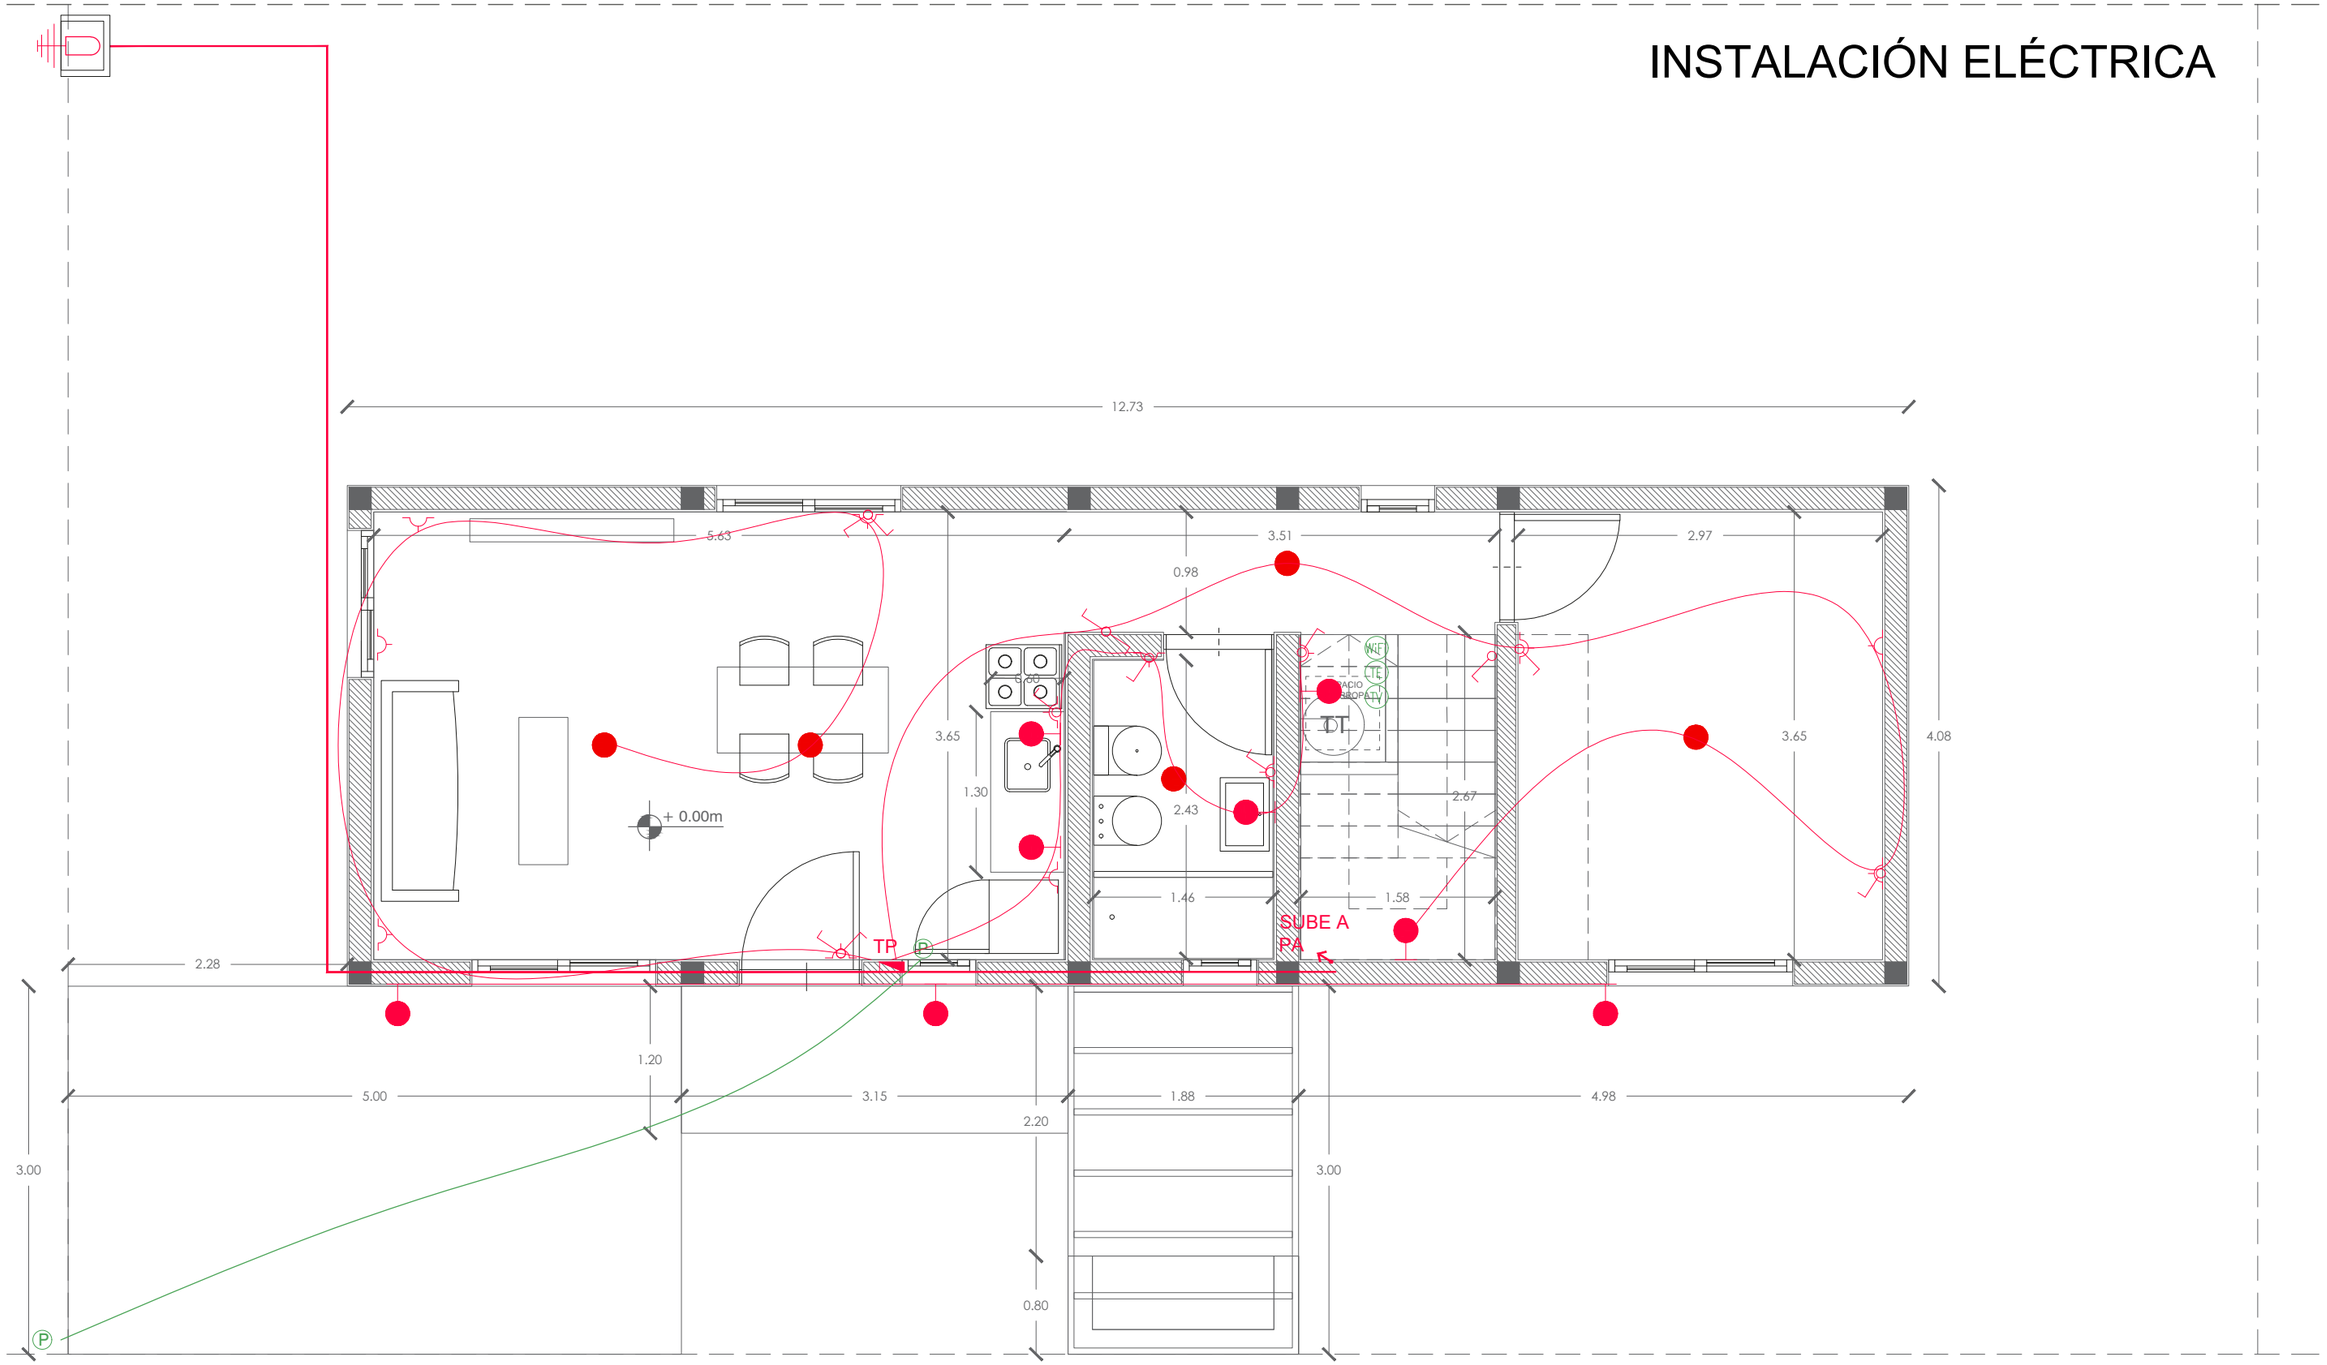

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : ELECTRICIDAD

ESC : 1:50

Nº : 15

PLANTA ALTA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

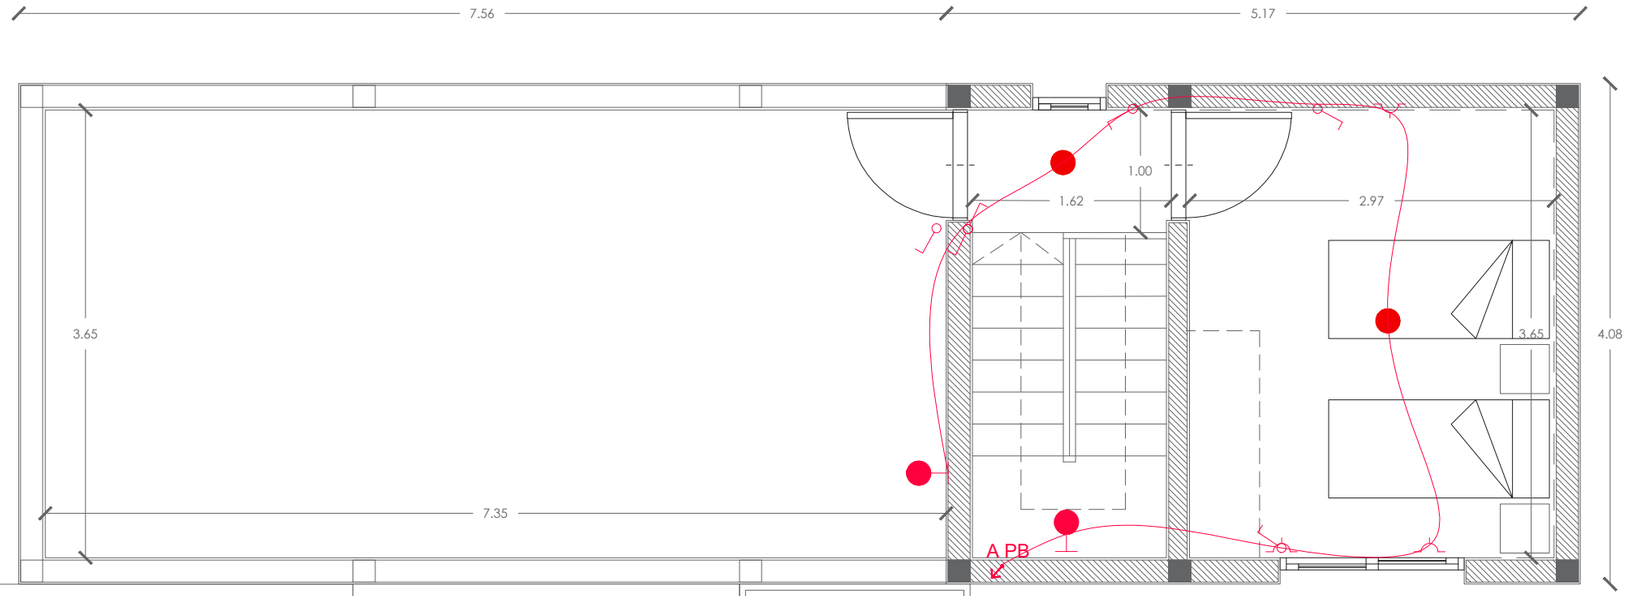

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : ELECTRICIDAD

ESC : 1:50

Nº : 16

PLANTA BAJA

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

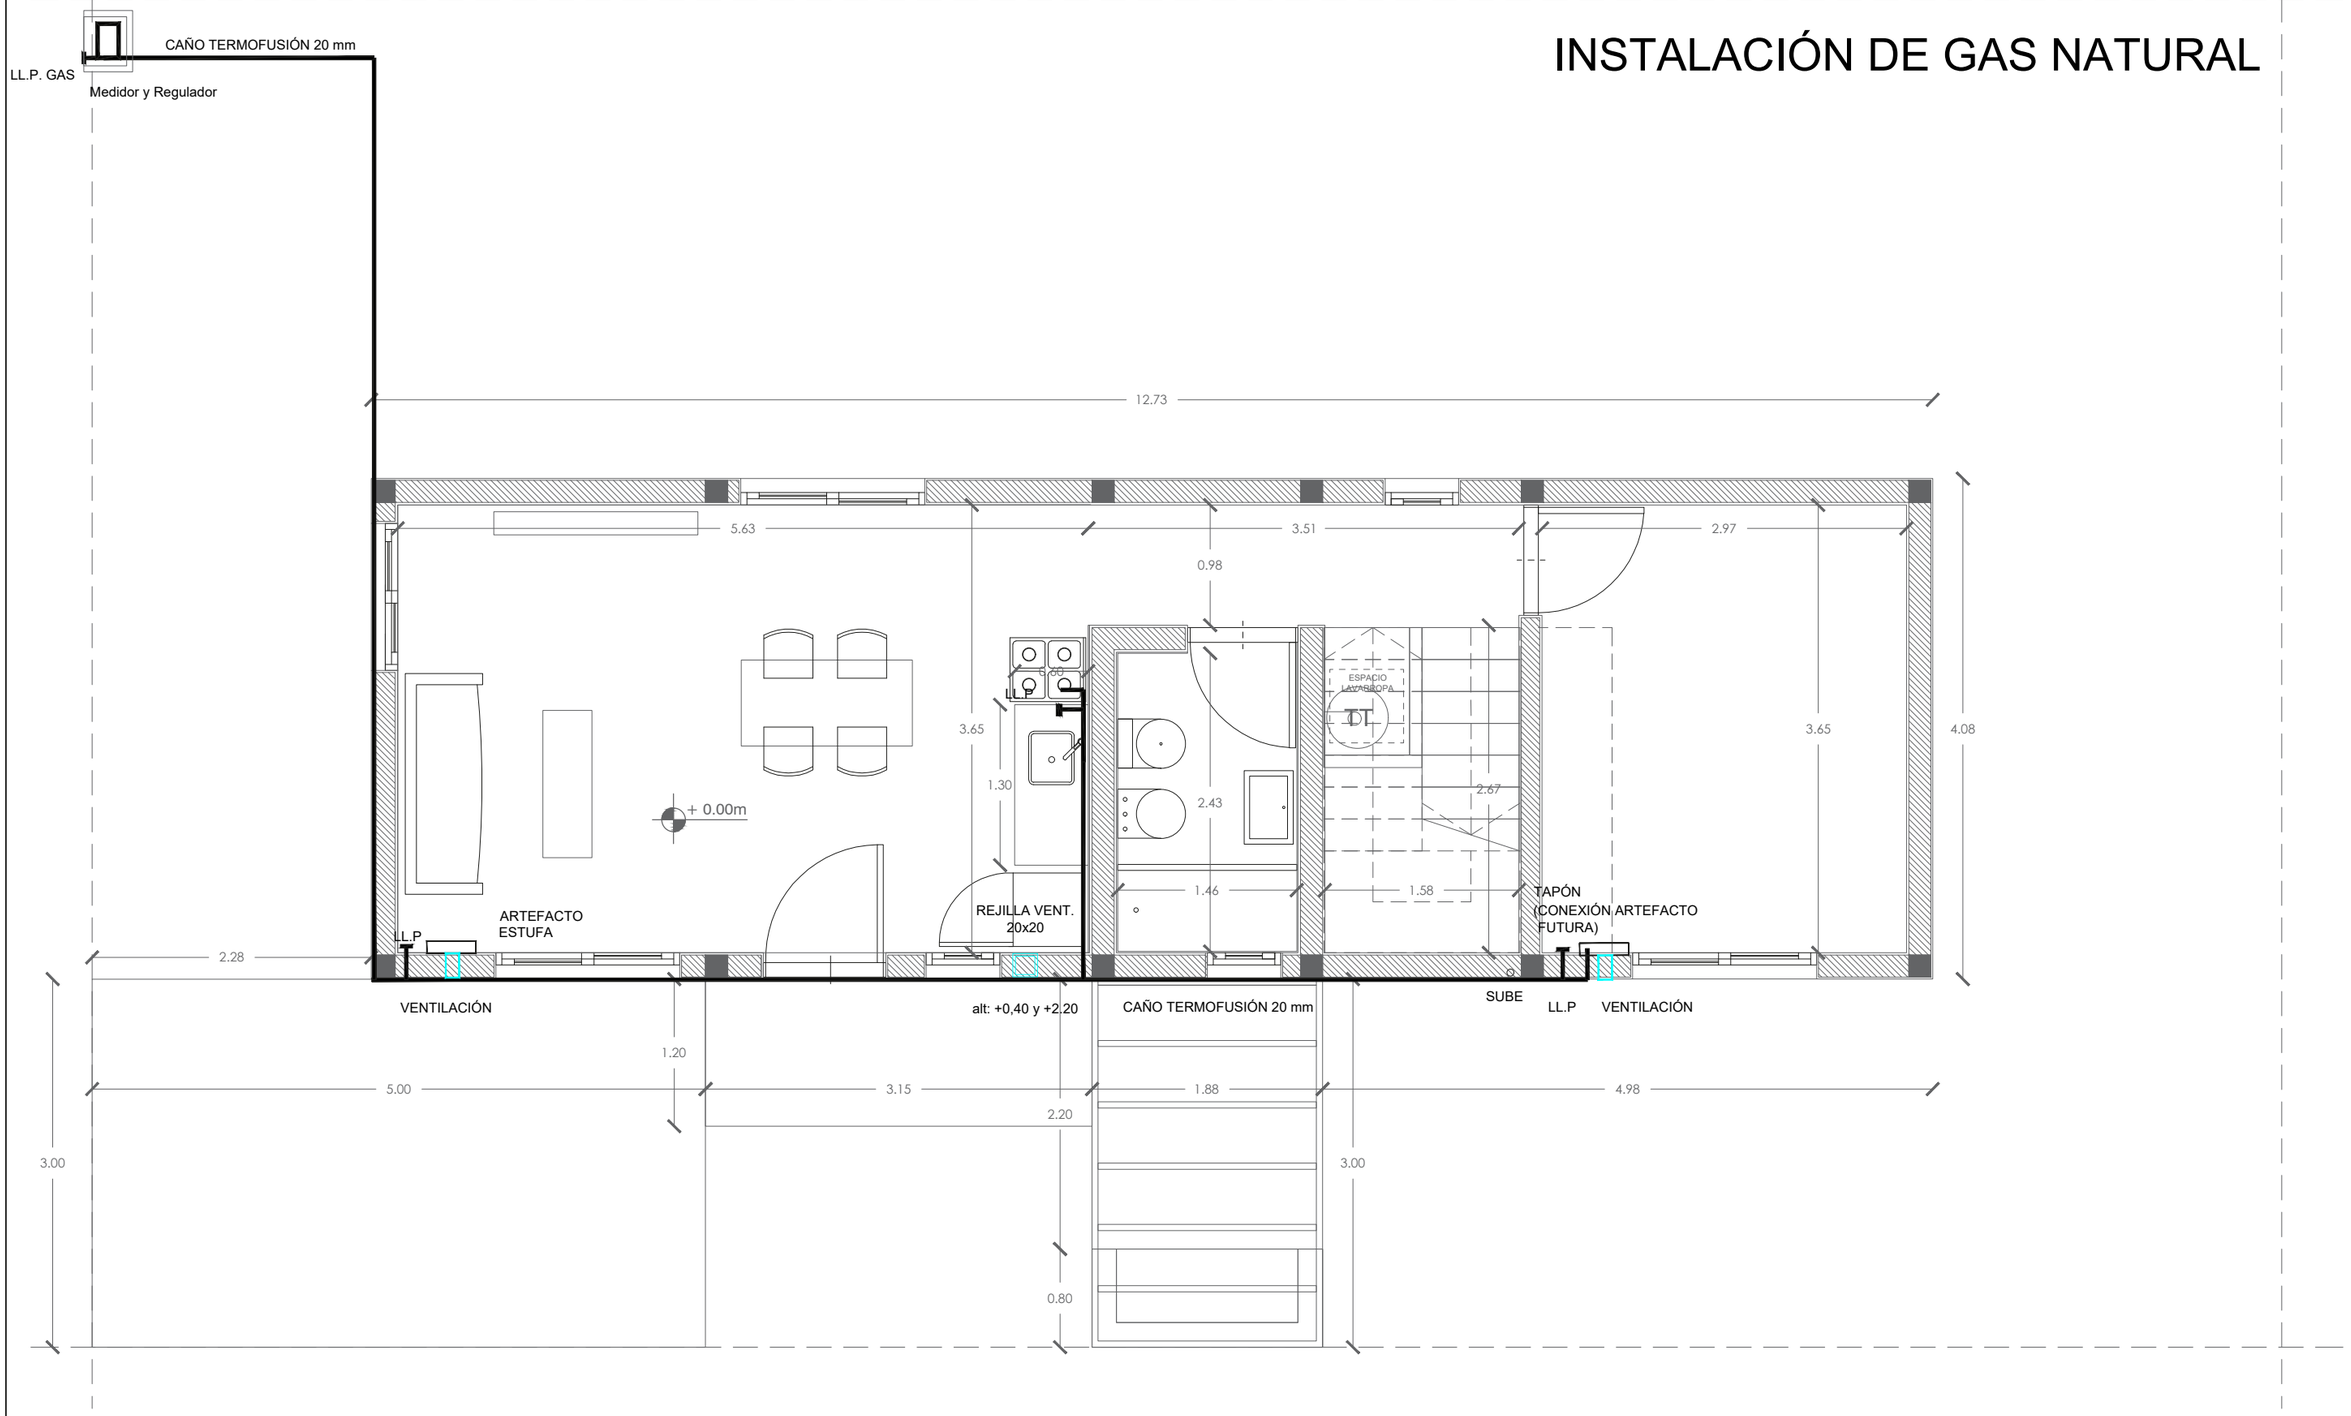

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : GAS

ESC : 1:50

Nº : 17

PLANTA ALTA

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

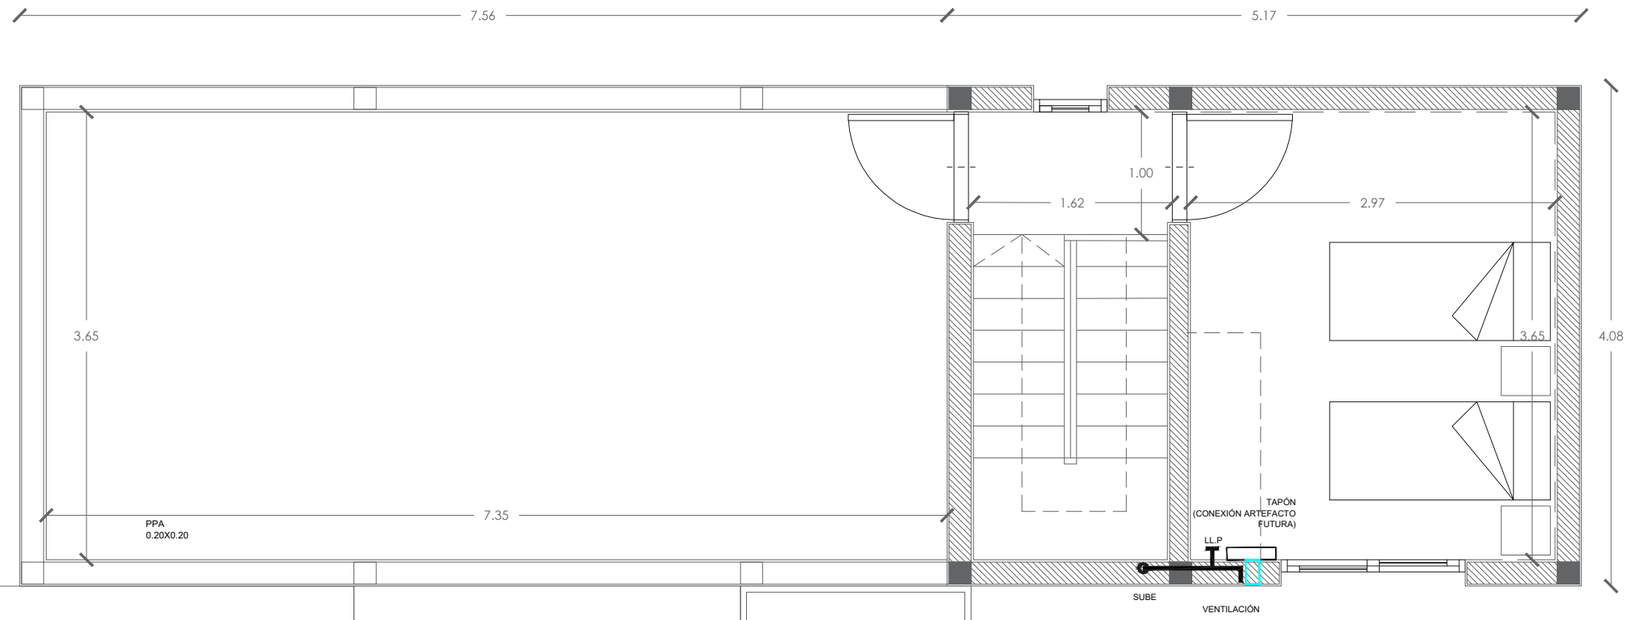

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : GAS

ESC : 1:50

Nº : 18

PLANTA BAJA

INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

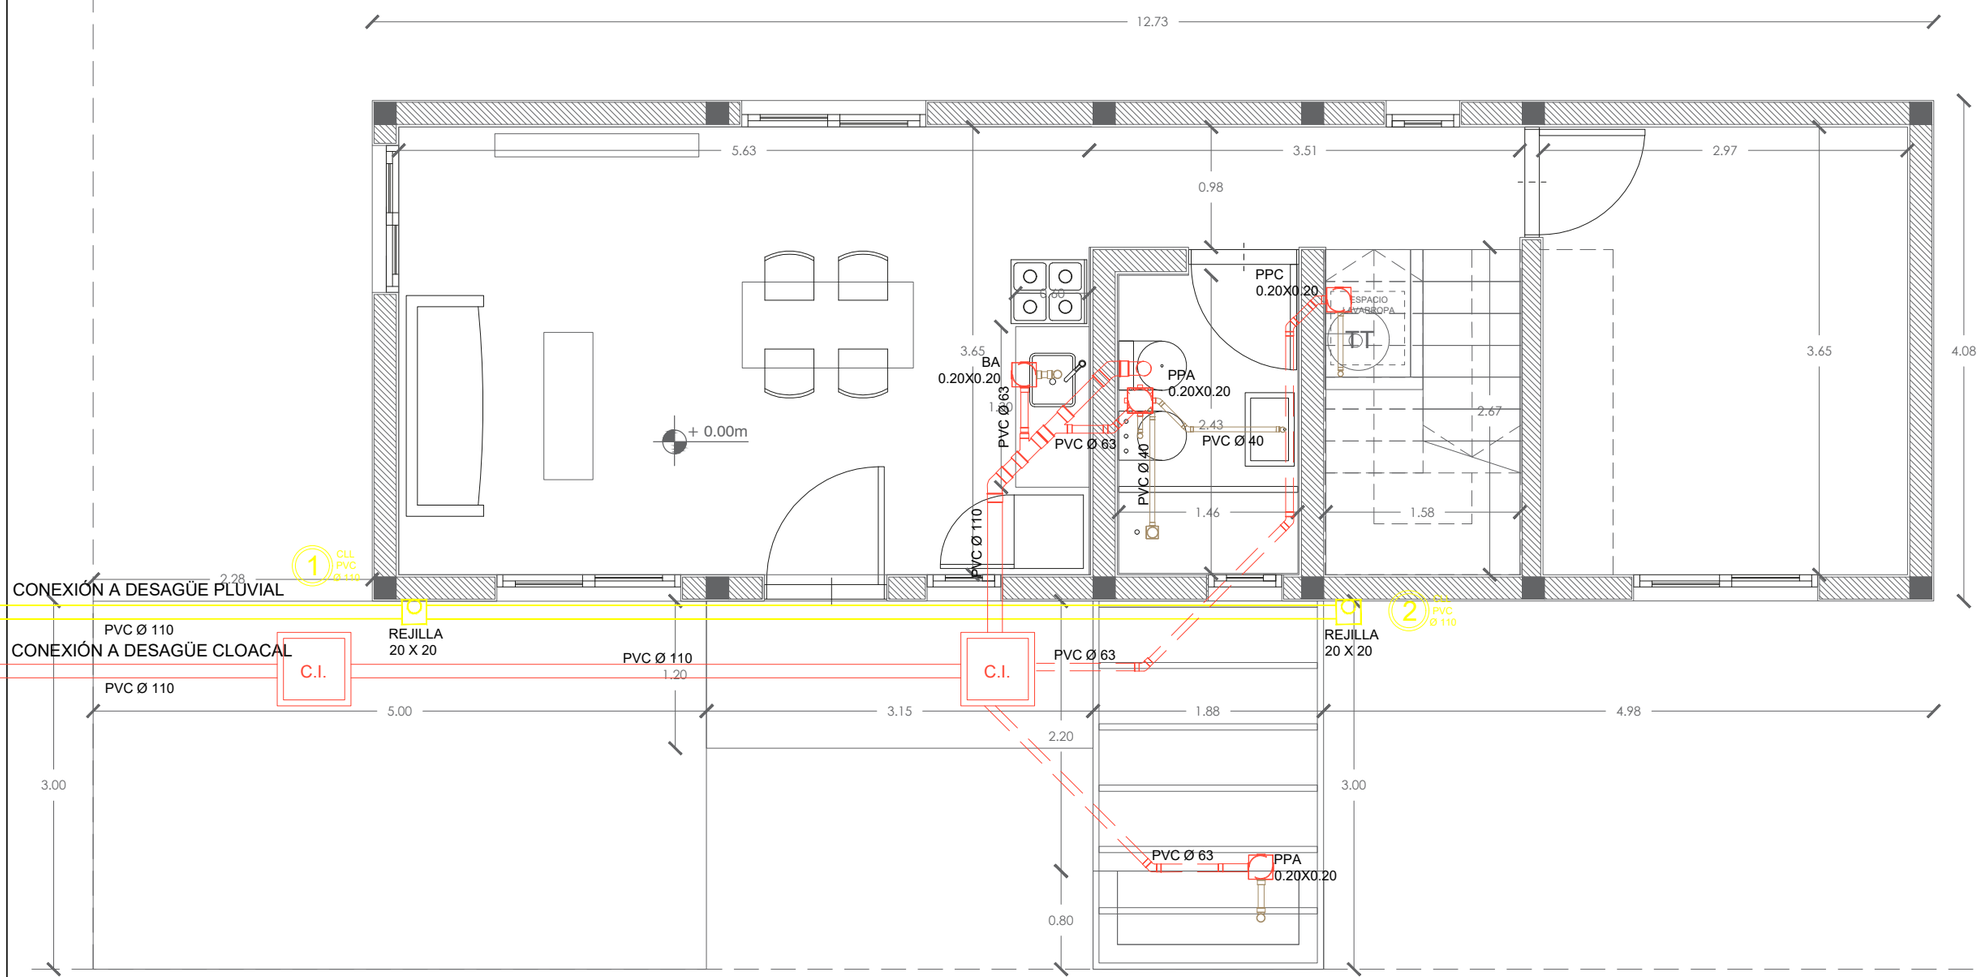

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : CLOACAL

ESC : 1:50

Nº : 19

PLANTA ALTA

INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

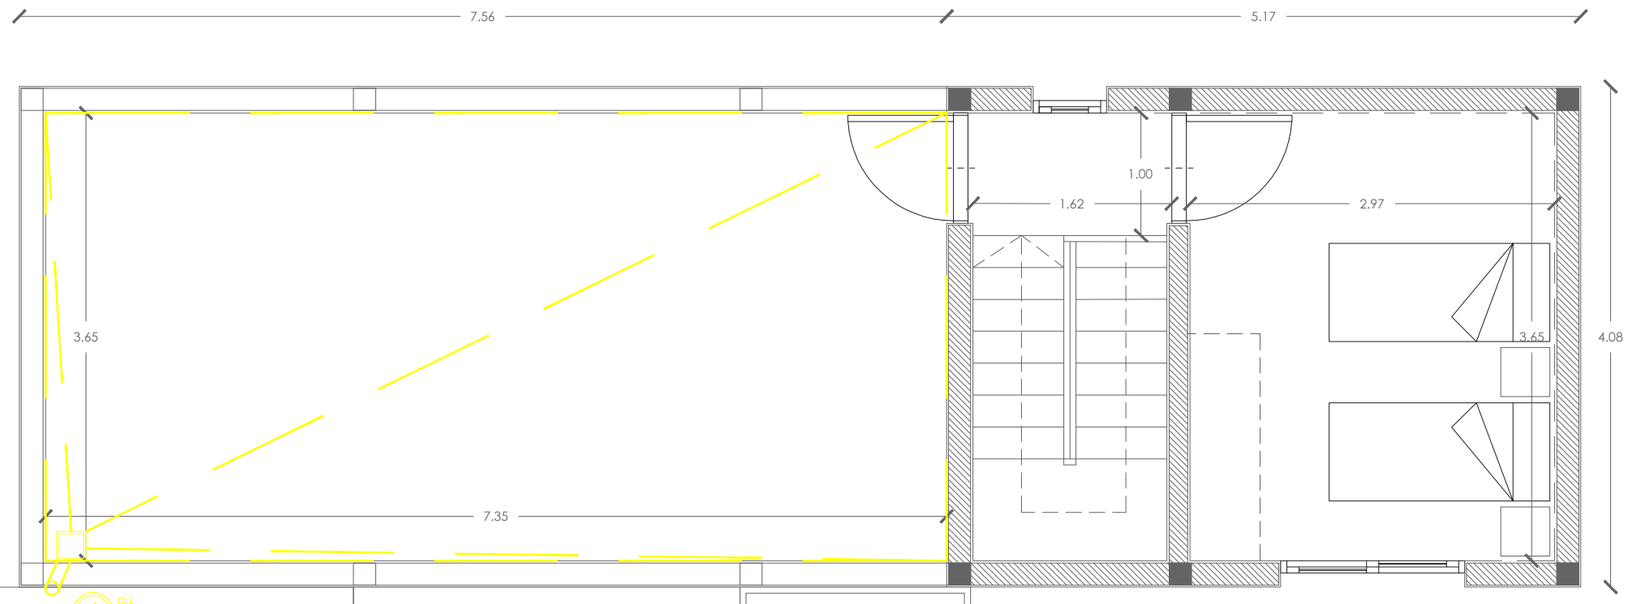

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : PLUVIAL

ESC : 1:50

Nº : 20

PLANTA DE TECHOS

INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

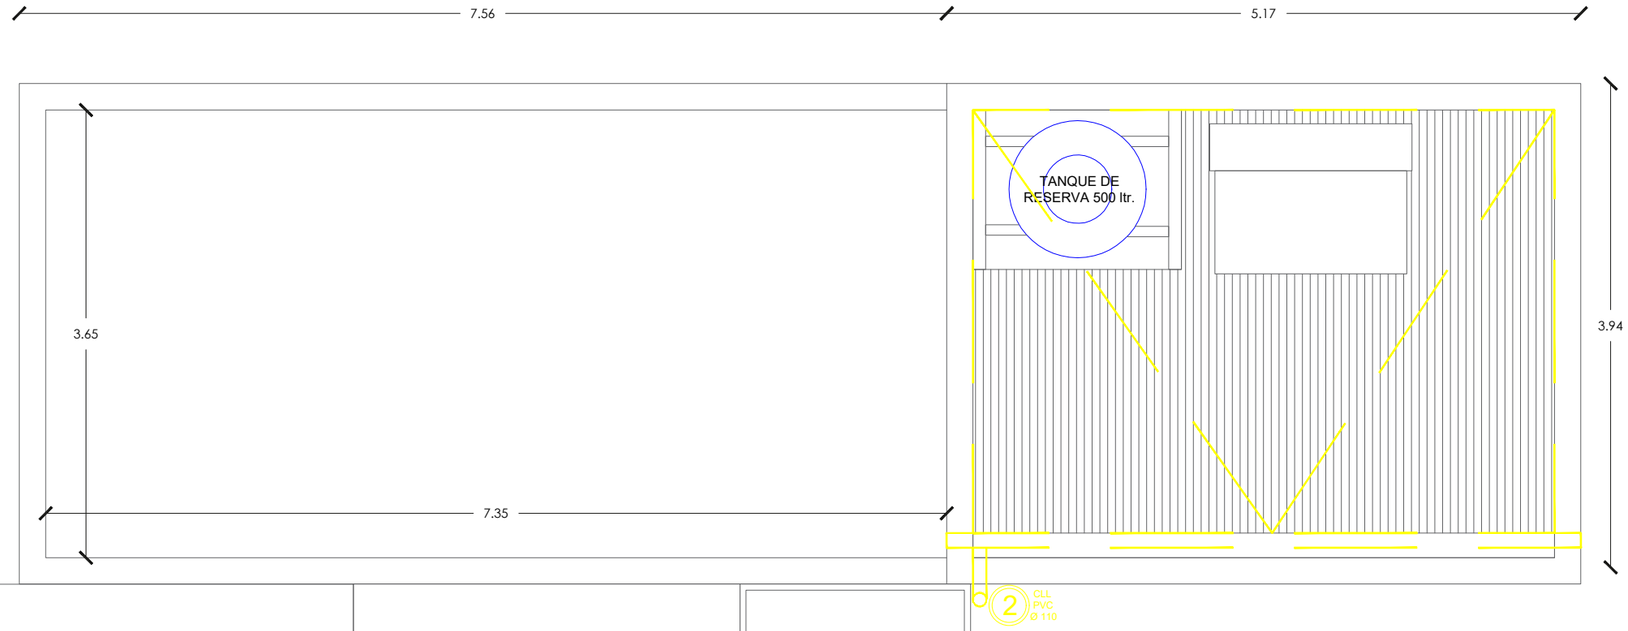

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : PLUVIAL

ESC : 1:50

Nº : 21



CATEDRA GALAVERNA 2025

MEMORIA TÉCNICA

PARA COMPUTO Y PRESUPUESTO


INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:


Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

1. TAREAS PRELIMINARES
2. MOVIMIENTO DE SUELO

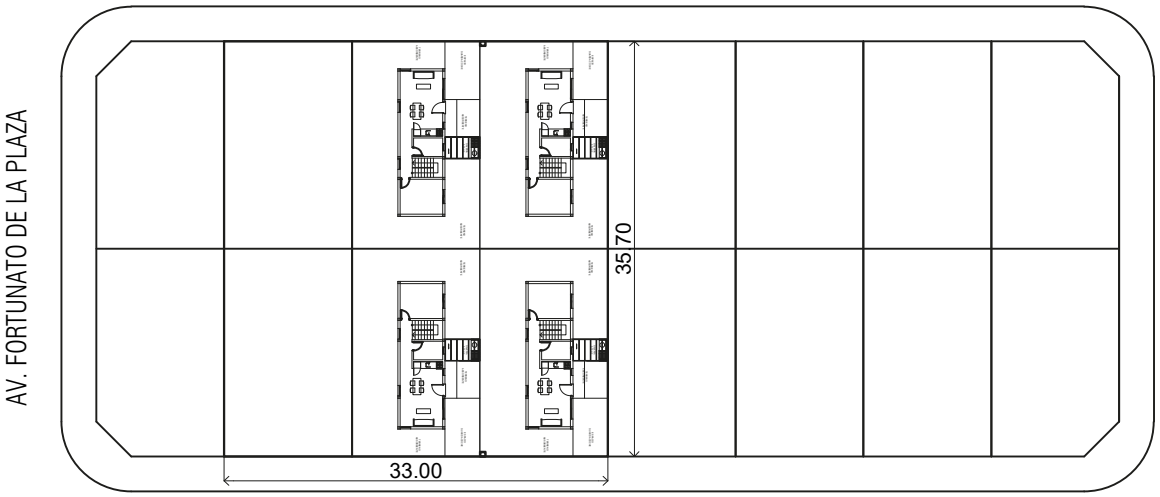

ALAMBRE OLIMPICO PERIMETRAL: 134ml


OBRADOR

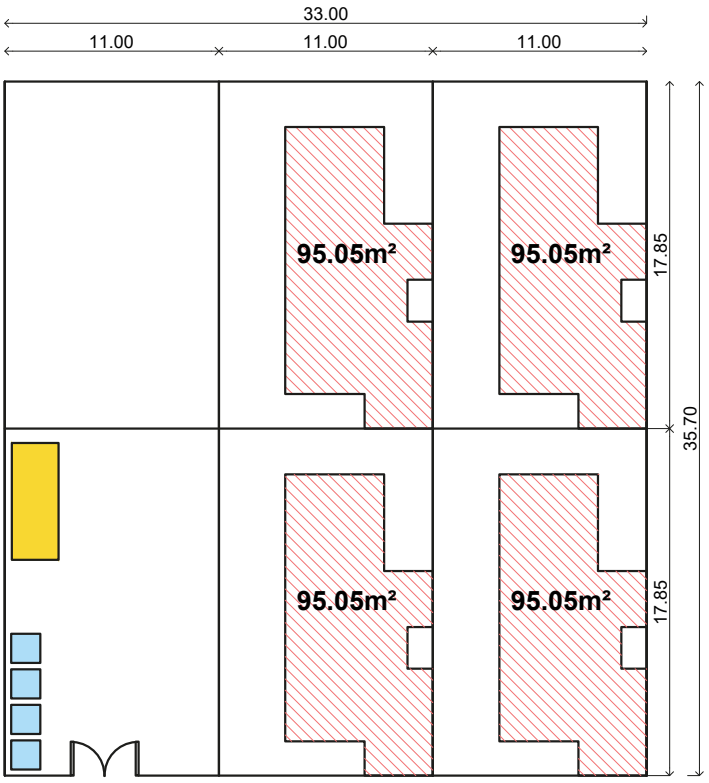

ALAMBRE OLÍMPICO PERIMETRAL

(33ml x 2) + (35.70ml x 2)= 134ml

ARMADO DE EJES Y CORRALITOS (+ MARCACIONES)



12.73m x 4.08m= 52m²
x 2 plantas= 104m²

LIMPIEZA DE TERRENO: RETIRO DE SUELO VEGETAL

95.05m² x 0.30m= 28.52m³
x 4 viviendas= 114.06m³

ALAMBRE OLIMPICO PERIMETRAL: 134ml

PORTON DE DOS HOJAS: 3,5m x 2,4m

RETIRO DE SUELO VEGETAL: 114.06m³

CASILLA DE OBRADOR

APORTE DE SUELO LUEGO DE RETIRO DE SUELO VEGETAL= 28.52m³

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 22

EXCAVACION DE BASES Y VIGAS DE FUNDACION

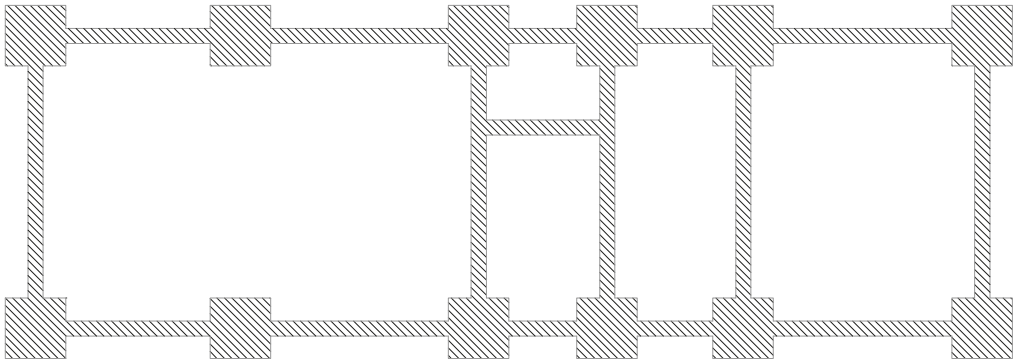




BASES H° A° 0.80m x 0.80m x 0.80m= 0.51m³ x 12 BASES= 6.14m³
PILOTINES H° A° PARRILLA Ø 0.31m² x 0.80m= 0.25m³ x 4= 1m³
TOTAL EXCAVACIÓN BASES= 7.14m

VIGAS DE FUNDACIÓN 3.69m x 0.20m x 0.40m= 0.029m³ x 5 VIGAS= 1.45m³
12.52m x 0.20m x 0.40m= 1m³ x 2 VIGAS= 2m³
1.70m x 0.20m x 0.40m= 0.13m³
(0.80m x 2) + 1.48m= 3.08m x 0.20m x 0.40m= 0.24m²

TOTAL EXCAVACIÓN VIGAS= 3.82m³

3.ESTRUCTURA RESISTENTE

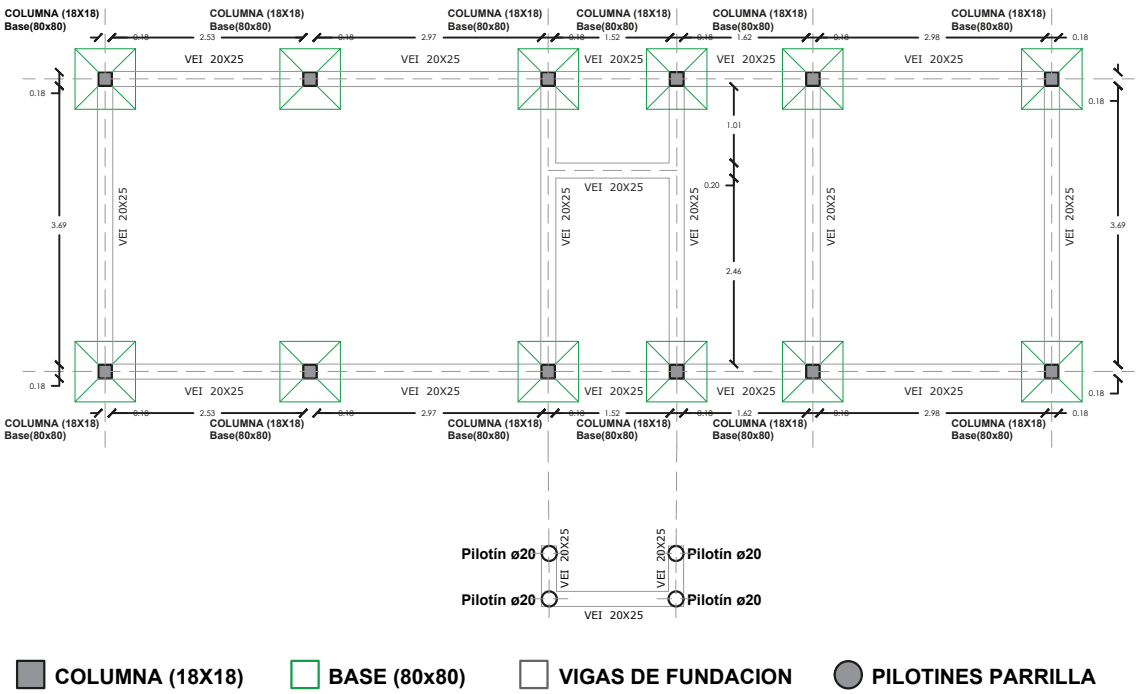

COLUMNA (18X18) **BASE (80x80)** **VIGAS DE FUNDACION** **PILOTINES PARRILLA**

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 23

BASES H° A° 0.80m x 0.80m x 0.40m= 0.26m³ x 12 BASES= 3.10m³

TOTAL BASES= 3.10m³

PILOTINES H° A° PARRILLA Ø20cm= 0.40ml x 4= 1.6ml

TOTAL PILOTINES= 1.6ml

VIGAS DE FUNDACIÓN 3.69m x 0.20m x 0.30m= 0.22m³ x 5 VIGAS= 1.10m³
12.52m x 0.20m x 0.30m= 0.75m³ x 2 VIGAS= 1.50m³
1.70m x 0.20m x 0.30m= 0.10m³
(0.80m x 2) + 1.48m= 3.08m x 0.20m x 0.30m= 0.18m²


TOTAL VIGAS FUNDACIÓN= 2.88m³

TRONCO DE COLUMNAS P.B. 0.18m x 0.18m x 0.82m= 0.02m³ X 12 COLUMNAS= 0.24m³
COLUMNAS P.B. 0.18m x 0.18m x 2.40m= 0.08m³ x 12 COLUMNAS= 0.96m³
COLUMNAS P.A. 0.18m x 0.18m x 2.40m= 0.08m³ x 6 COLUMNAS= 0.48m³

TOTAL COLUMNAS= 1.68m³

4.MAMPOSTERÍA

PLANTA BAJA

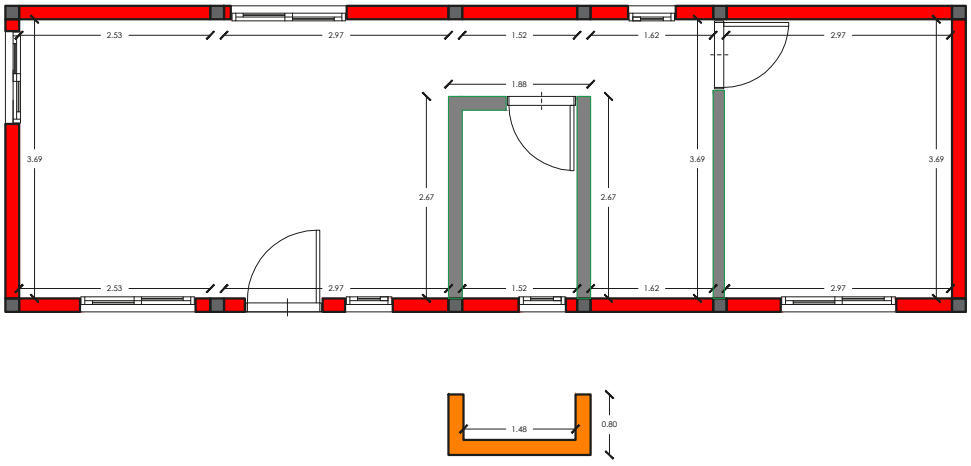


MURO EXTERIOR (LADRILLO 18cm)= 30,80ml - h: 2,40m= 73.92m²

MURO INTERIOR (LADRILLO DEL 12)= 10.91ml - h: 2,40m= 26.18m²

MURO PARRILLA (LADRILLO 18cm)= 3.08ml - h: 2,15m= 6.62m²

PLANTA ALTA

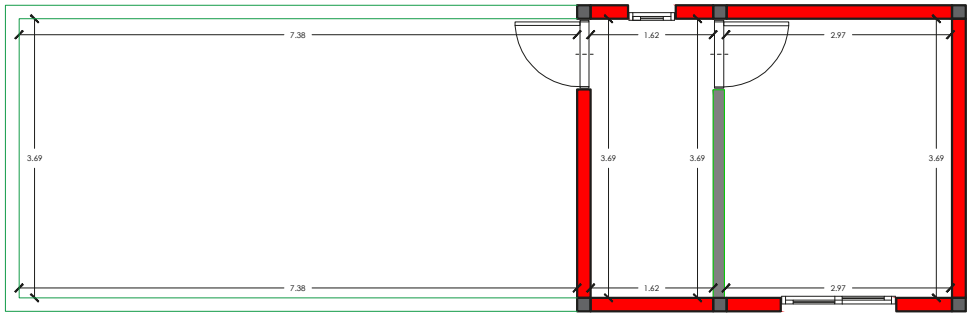

MURO EXTERIOR (LADRILLO 18cm)= 16,56ml - h: 3,55m= 58.78m²

MURO INTERIOR (LADRILLO 12cm)= 3,69ml - h: 2,7m= 9.96m²

MURO BARANDA (LADRILLO 18cm) 18,45ml - h: 1,05= 19.37m²

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100


N° : 24

PLANTA DE TECHOS

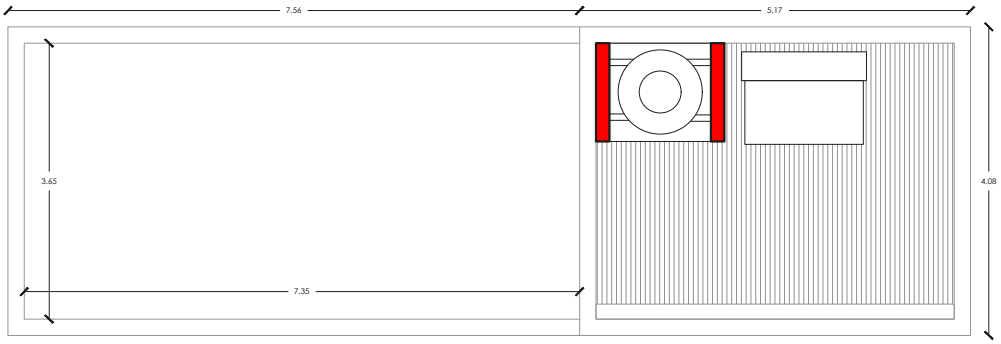


MURO APOYO TANQUE: 1.30ml x 2= 2.60ml - h: 1.64m= 4.26m²

MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN

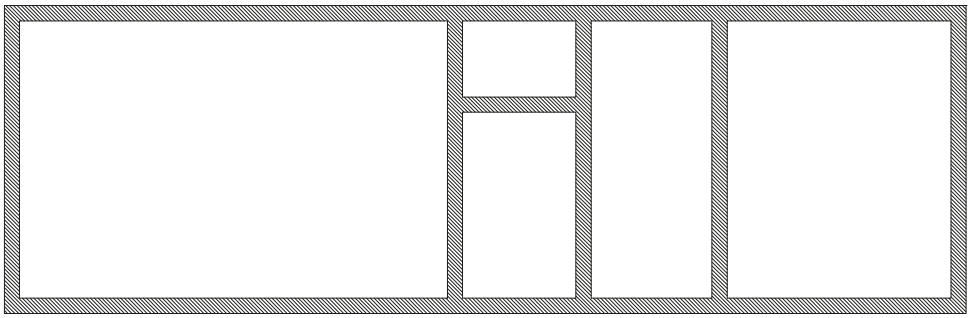

MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN



3.87m x 0.20m x 0.55m= 0.42m³ x 5 = 2.10m³
12.52m x 0.20m x 0.55m= 1.37m³ x 2 = 2.74m³
1.70m x 0.20m x 0.55m= 0.18m³


TOTAL= 5.02m³

TOTAL MUROS


LADRILLO COMÚN P/ MAMP DE ELEVACIÓN= 5.02m³
LADRILLO CERÁMICO CON CÁMARA DE AIRE= 73.92m² + 58.78m²= 132.7m²
LADRILLO HUECO CERÁMICO DEL 18 (MUROS INTERIORES, PARRILLA, PARAPETO TERRAZA Y APOYO DE TANQUE)= 26.18m² + 6.62m² + 9.96m² + 19.37m² + 4.26m²= 66.39m²

LADRILLOS REFLACTARIOS PARRILLA

PLANTA



CORTE

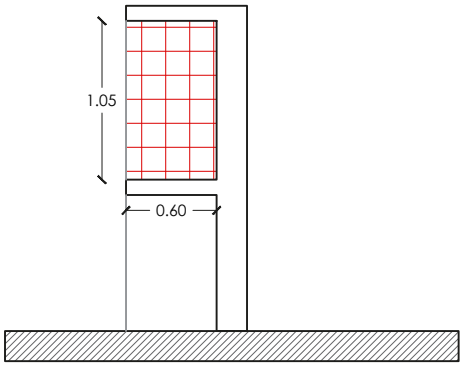

TOTAL LADRILLO REFLACTARIO

1.48m x 0.60m x 1.05m= 0.93m³

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA


ESC : 1:100

N° : 25

5.CAPAS AISLADORAS




CAJÓN HIDRÓFUGO

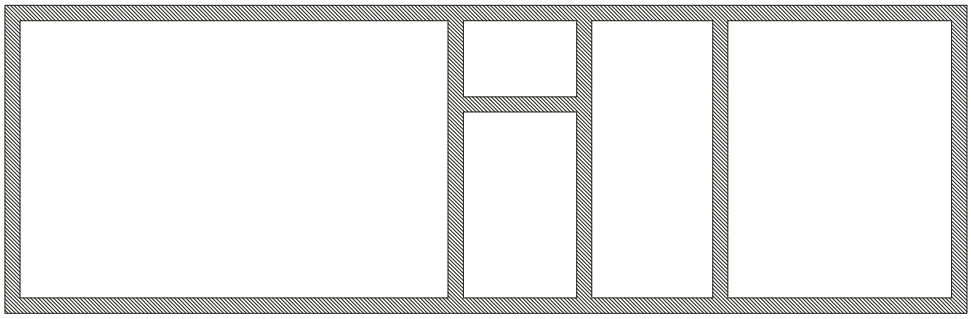

Sup horizontal= 9.05 x 2 = 18.10 m2
Sup vertical= 18.66+5+7.92+10.54+13.26+33.58= 88.96 x h(0.25)= 22.24 m2
TOTAL= 40.34 m2

HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO

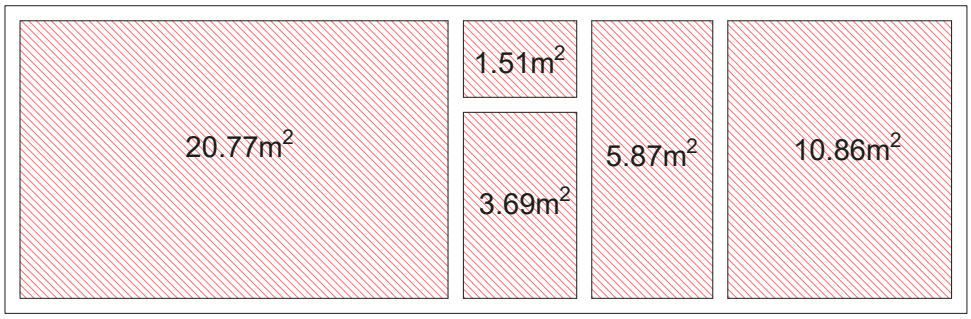

HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO= 42.7m²


Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14 DOMINGUEZ, Juan Ignacio GUAJARDO, Santiago COLAVITA, Juan Cruz	PLANO DE : MEMORIA ESC : 1:100	N° : 26

6 CUBIERTAS

CUBIERTA

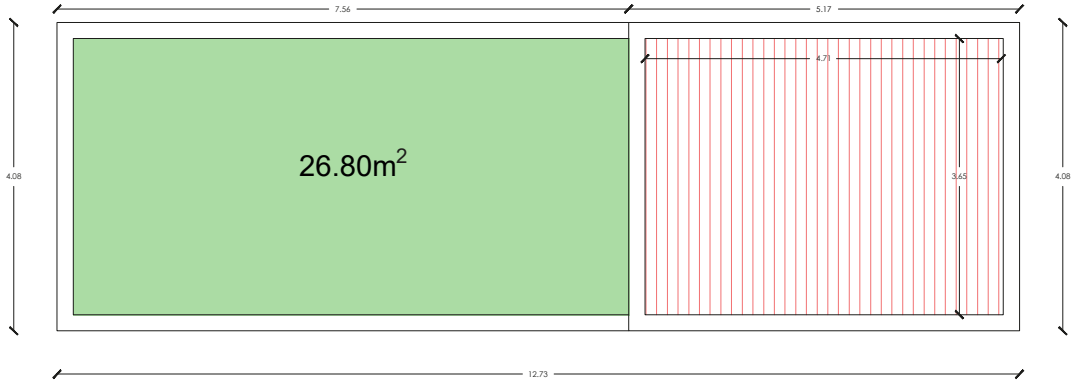


TECHO PLANO
26.80m^2 x 10cm= 2.68m3

TECHO INCLINADO (CHAPA)
4.71 x 3.65= 17.3m^2


LOSA INTERIOR (sin contar escalera)
12.73m^2 x 10cm= 1.28m3
TOTAL= 3.96m^3

CONTRAPISO Y CARPETA

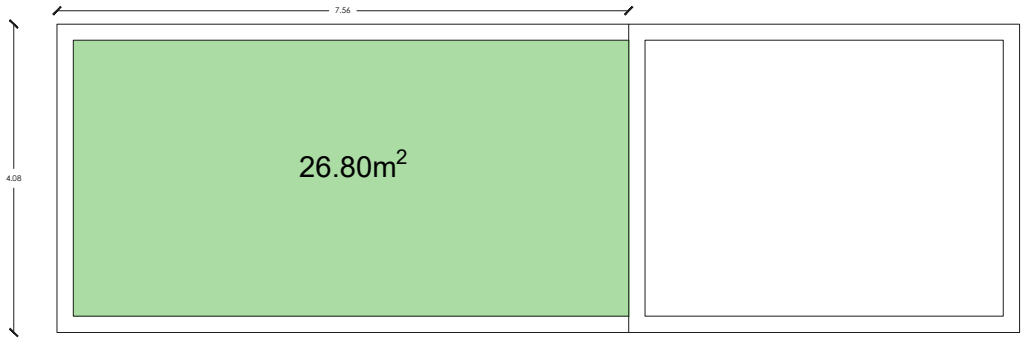

Contrapiso de H° A° alivianado con pendiente esp min. 5cm 26.80m^2
Carpeta 26.80m^2

PISO DE TERMINACION SOBRE LOSA

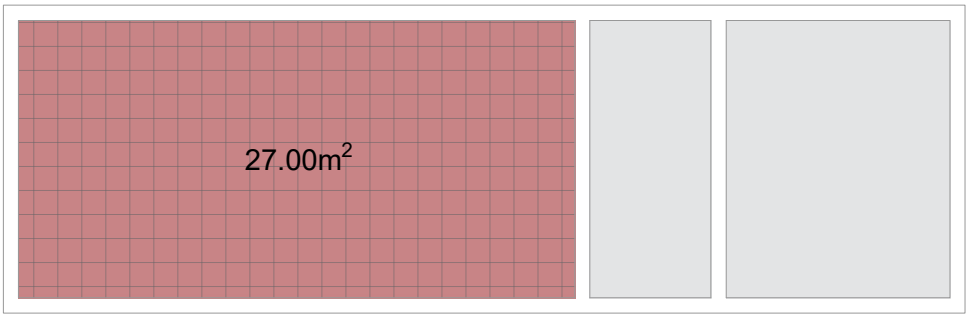

BALDOSA ROJA A LA CAL: 27.00m^2

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 27


AISLANTES

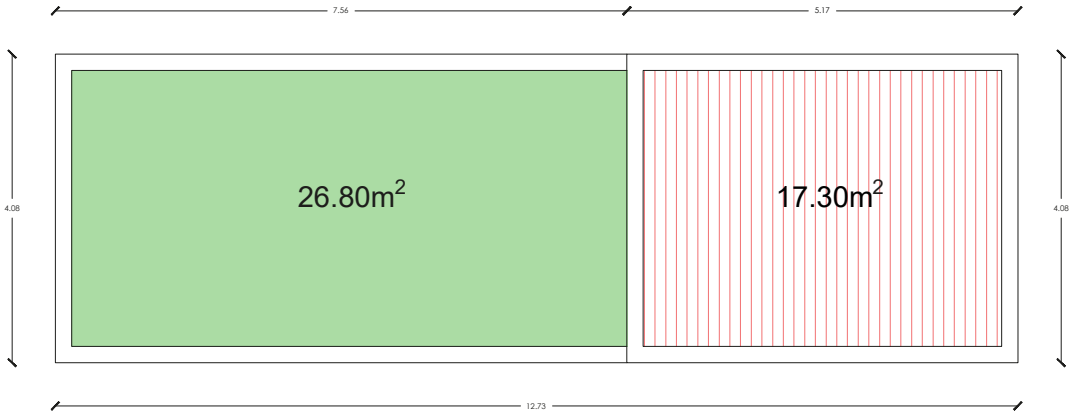

TECHO PLANO
Membrana geotextil= 26.80m²
Poliestileno expandido alta densidad e= 3cm= 26.80m²
Film de polietileno 200mc barrera de vapor= 26.80m²

TECHO INCLINADO (RUBEROID): 17.30m²

ZINGUERIA

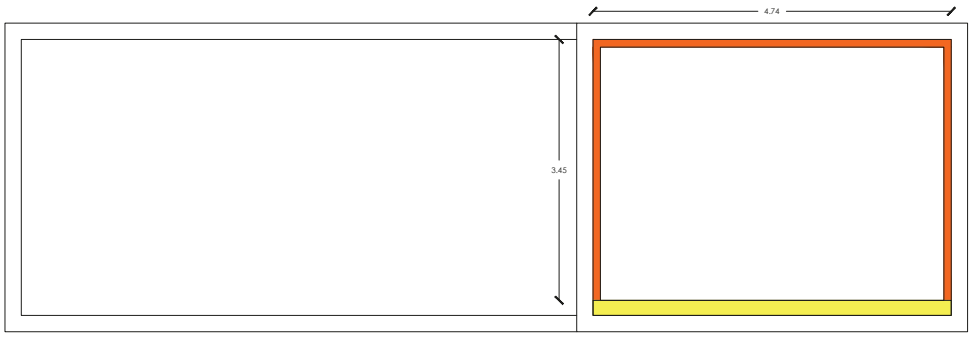

CANALETA: 4.8ml

BABETA CHAPA GALVANIZADA 24: 3.45 + 4.54 + 3.45
TOTAL= 11.44ml

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 28

7. REVOQUES

PLANTA BAJA

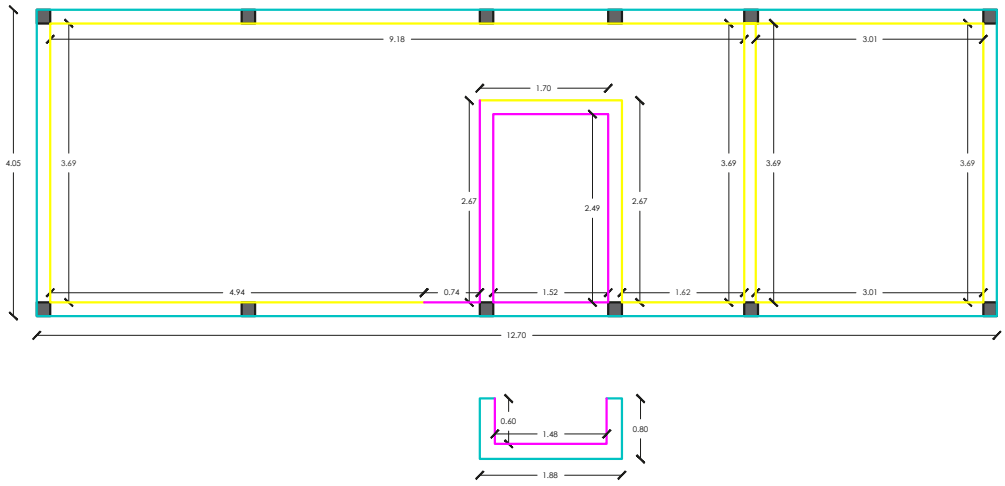

REVOQUE EXTERIOR: 33,5ml x h: 2,80m= 93.8m² **REVOQUE INTERIOR: 42.59ml x h: 2,40m= 102.21m²**

REVOQUE INTERIOR BAÑO: 2.49ml + 2.49ml + 1.52ml + 1.52ml= 8.02ml x 2.40m= 19.25m²
REVOQUE INTERIOR COCINA: 2.67ml + 0.74ml= 3.41ml x 2.40m= 8.18m²

REVOQUE EXTERIOR PARRILLA: 1.88ml + 0.80ml + 0.80ml + 0.20ml + 0.20ml= 3.88ml x 2.15m= 8.34m²


REVOQUE INTERIOR PARRILLA: 1.48ml + 0.60ml + 0.60ml= 2.68ml x 2.15m= 5.76m²

TOTAL REVOQUE EXTERIOR PB (3 en 1 proyectado): 102.14m²

REVOQUE INTERIOR PB (grueso y fino): 102.21m²

REVOQUE INTERIOR EN SANITARIOS (grueso): 33.19m²

PLANTA ALTA

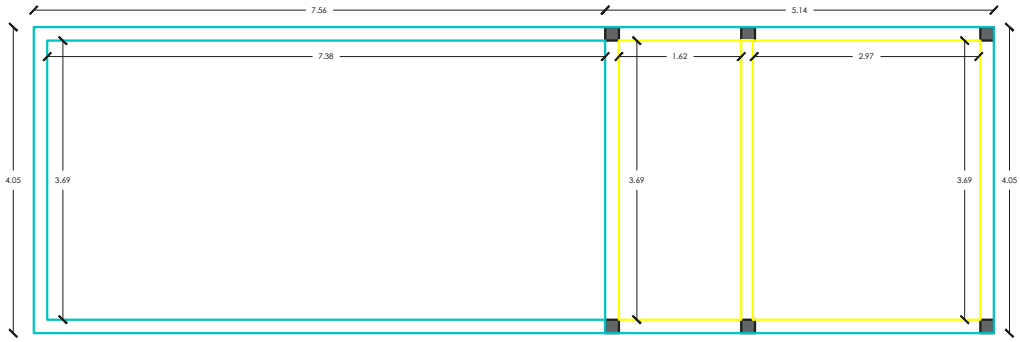


REVOQUE EXTERIOR: 18.38ml x h= 3,55m= 65.24m²
REVOQUE EXTERIOR PARAPETO: 19.17ml x h=1.05m= 20.12m²
REVOQUE INTERIOR PARAPETO: 18.45ml x h=1.05m= 19.37m²

REVOQUE INTERIOR: 24.08ml x h: 2,7m= 65m²

TOTAL REVOQUE EXTERIOR PA (3 en 1 proyectado): 104.73m²

REVOQUE INTERIOR PB (grueso y fino): 65m²

PLANTA DE TECHOS

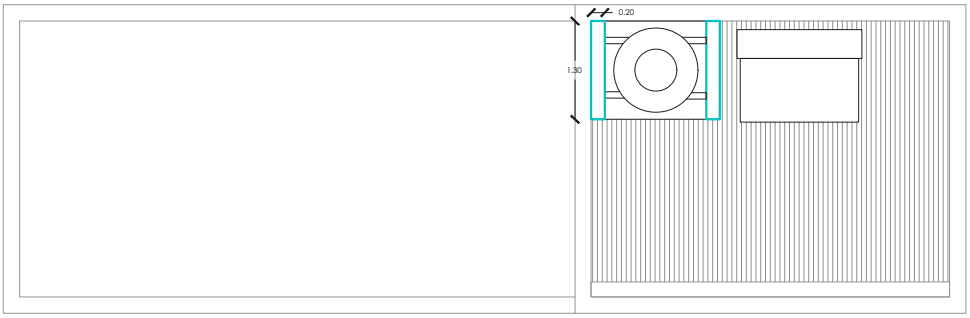

MURO APOYO TANQUE: 1.3ml + 1.3ml + 0.2ml + 0.2ml= 3ml x 2= 6ml - h: 1.64m= 9.84m²

TOTAL REVOQUES


TOTAL REVOQUE EXTERIOR (3 en 1 proyectado): 216.71m²

REVOQUE INTERIOR (grueso y fino): 167.21m²

REVOQUE INTERIOR EN SANITARIOS (grueso): 33.19m²

8. YESERIA


SUSPENDIDO SOBRE PLANTA BAJA

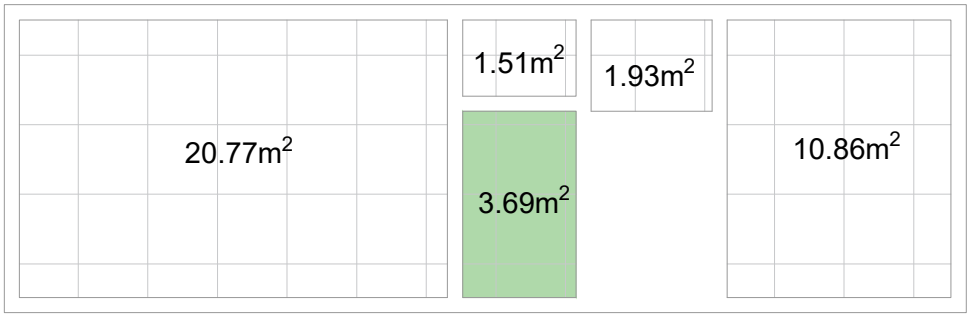

CIELORRASO SUSPENDIDO = 20.77m²+1.51m²+1.93m²+10.86m²= 35.07m²

PLACA VERDE= 3.69m²

SUSPENDIDO SOBRE PLANTA ALTA

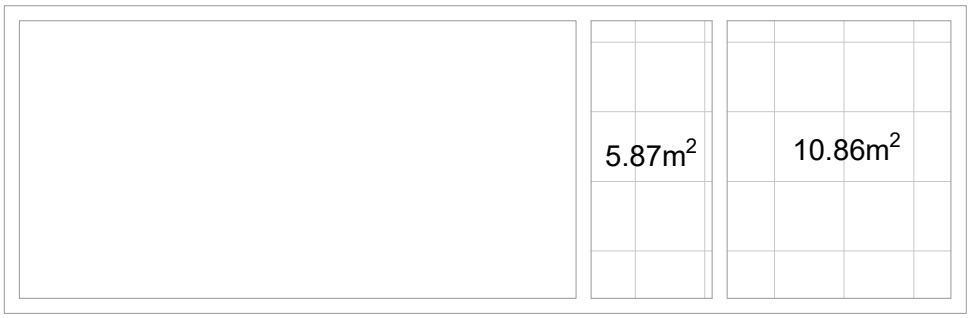


CIELORRASO SUSPENDIDO= 5.87m²+10.86m²=.16.73m²

TOTAL CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA= 35.07m²+16.73= 51.8m²

TOTAL CIELORRASO PLACA VERDE= 3.69m²


9. CONTRAPISOS Y CARPETAS

HORIZONTAL PLANTA BAJA

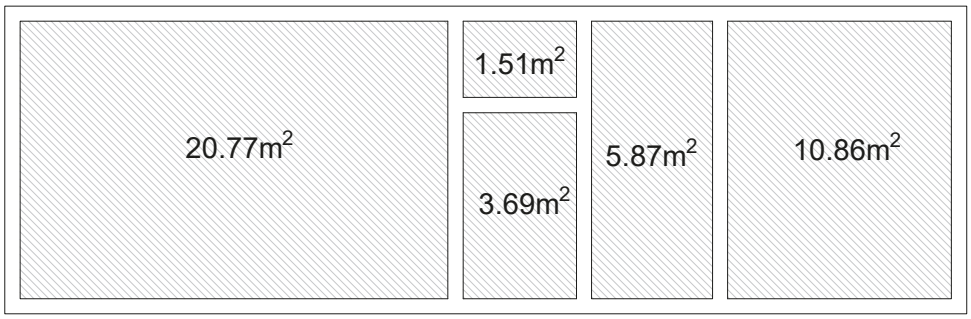

HORIZONTAL PB= 20.77m² + 1.51m² + 3.69m² + 5.87m² + 10.86m² + 24.42m²= 67.12m²

HORIZONTAL PLANTA ALTA

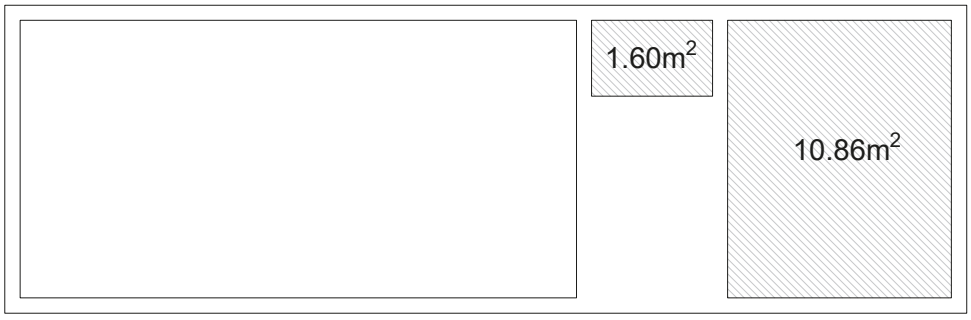


HORIZONTAL PA= 1.60m² + 10.86m²= 12.46m²

TOTAL CONTRAPISOS

HORIZONTAL PB Y PA= 67.12m² + 12.46m²= 79.58m²

10.PISOS

HORIZONTAL SOBRE PLANTA BAJA

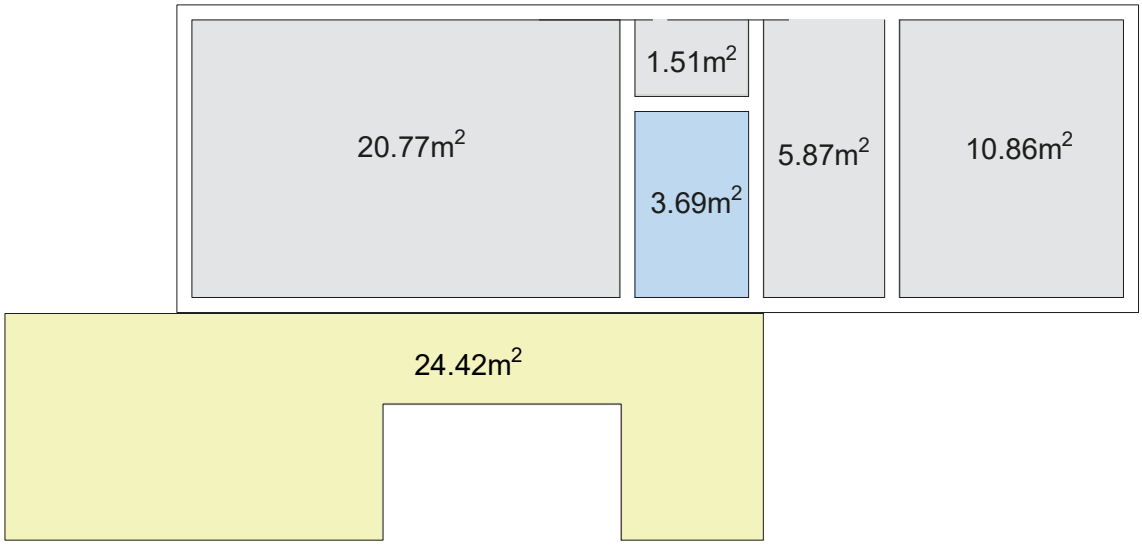


PISO CERAMICO LOCALES INTERIORES 60x60x0.1= 20.77m^2+1.51m^2+5.87m^2+10.86m^2= 39m^2

PISO CERAMICO BAÑOS 60x60= 3.69m^2

PISO DE HORMIGON LLANEADO

HORIZONTAL SOBRE PLANTA ALTA

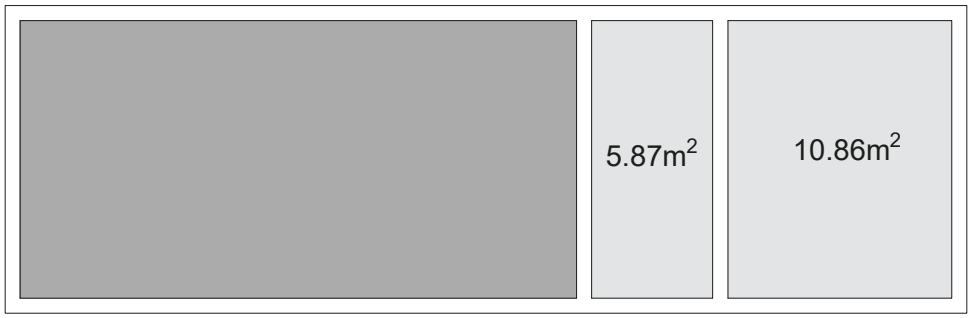

PISO CERAMICO 60x60x0.1: 5.87m^2+10.86= 16.73m^2

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100


N° : 32

ZOCALOS PLANTA BAJA

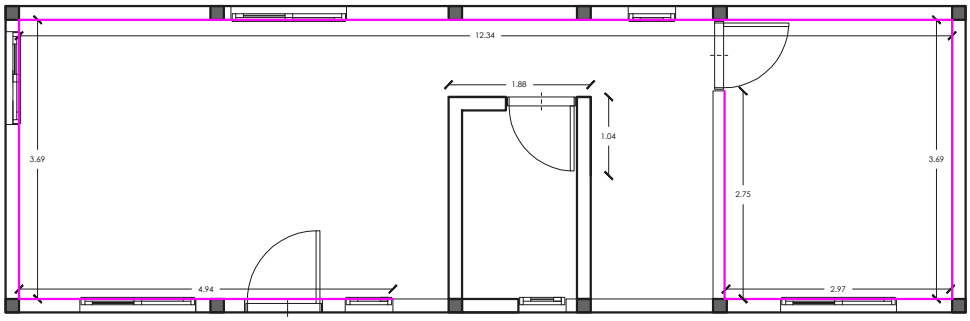

ZOCALOS PISO CERAMICO:
3.69ml + 12.343ml + 3.69ml + 2.97ml + 2.75ml + 1.04ml + 1.88ml + 4.94= 33.3ml x 0.07m= 2.33m²


ZOCALOS PLANTA ALTA

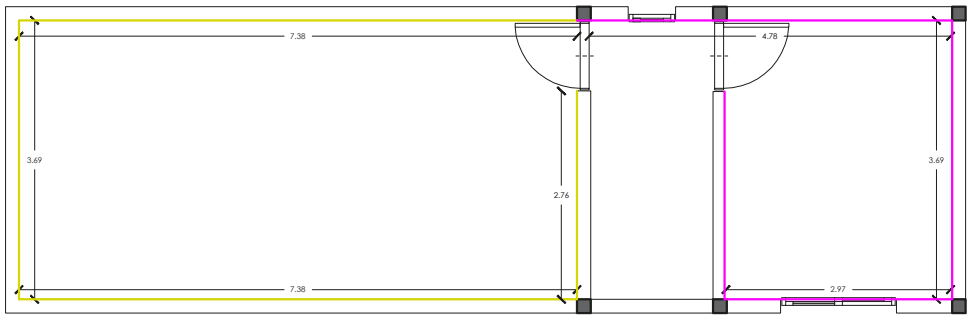

ZOCALO EXTERIOR: 7.38ml + 3.69ml + 7.38ml + 2.76ml= 21,20ml x 0.07m= 1.48m²

ZOCALO INTERIOR: 4.78ml + 3.69ml + 2.97ml= 14,40ml x 0.07m= 1m²

REVESTIMIENTO LOCALES INTERIORES

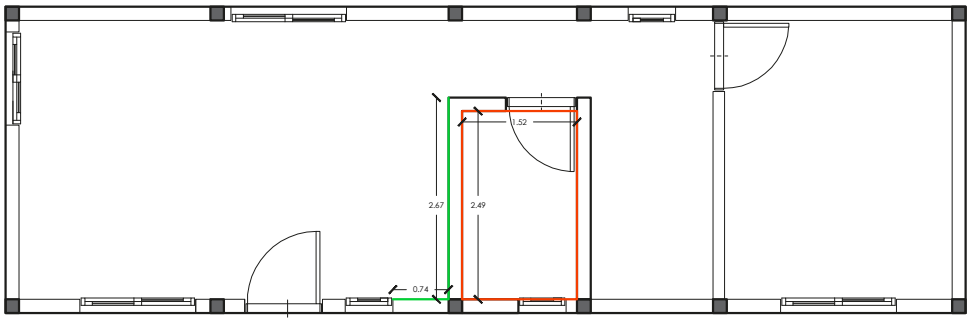

REVESTIMIENTO BAÑO CERAMICO:
2.49ml + 2.49ml + 1.52ml + 1.52ml= 8.02ml x 2.40m= 19.25m²

REVESTIMIENTO COCINA CERAMICO:
2.67ml + 0.74ml= 1.98ml x 2.40m= 4.75m²

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100


N° : 33

ZOCALOS PLANTA BAJA

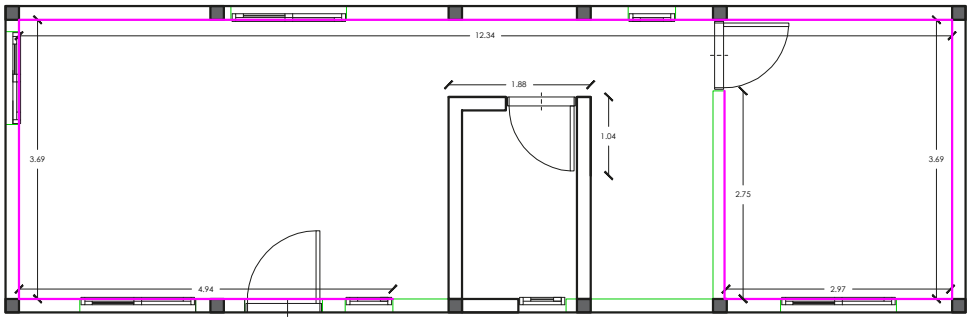

ZOCALOS PISO CERAMICO:
3.69ml + 12.343ml + 3.69ml + 2.97ml + 2.75ml + 1.04ml + 1.88ml + 4.94= 33.3ml x 0.07m= 2.33m²


ZOCALOS PLANTA ALTA

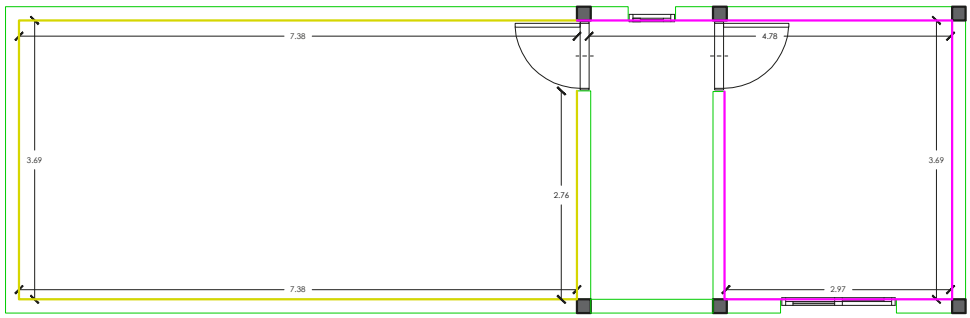

ZOCALO EXTERIOR: 7.38ml + 3.69ml + 7.38ml + 2.76ml= 21,20ml x 0.07m= 1.48m²

ZOCALO INTERIOR: 4.78ml + 3.69ml + 2.97ml= 14,40ml x 0.07m= 1m²

REVESTIMIENTO LOCALES INTERIORES

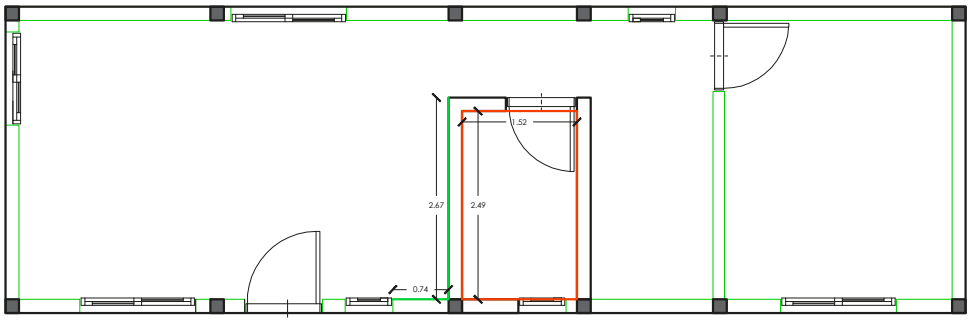

REVESTIMIENTO BAÑO CERAMICO:
2.49ml + 2.49ml + 1.52ml + 1.52ml= 8.02ml x 2.40m= 19.25m²

REVESTIMIENTO COCINA CERAMICO:
2.67ml + 0.74ml= 1.98ml x 2.40m= 4.75m²

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 33


11. CARPINTERIAS

PUERTAS

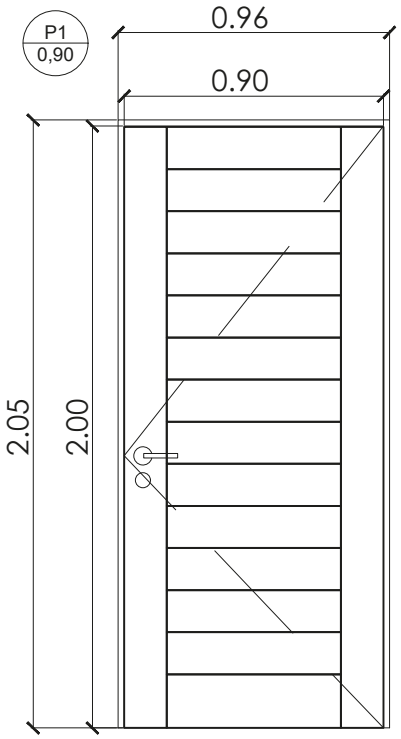

(P1) Puerta Acceso
Alto: 2,05 m
Ancho: 0,90 m
Tipo: Doble contacto
Material: Puerta Tablero 2"
Terminación: Dos manos esmalte sintético.


CANTIDAD: 2 unidades

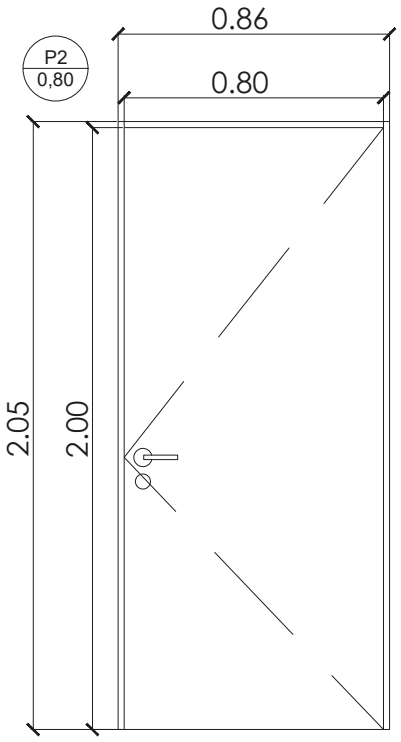

(P2) Puertas Interiores
Alto: 2,05m
Ancho: 0,80 m
Tipo: Placa
Material: Puerta placa
Terminación: Dos manos esmalte sintético.

CANTIDAD: 3 unidades


VENTANAS

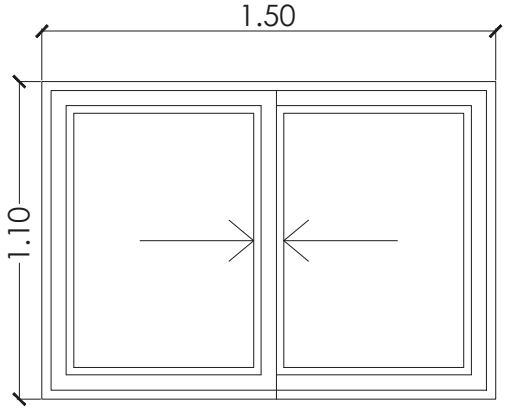

V1
1,50

(V1) Ventanas estar-comedor
Alto: 1.10 m
Ancho: 1.50 m
Tipo: Corrediza
Material: Aluminio Modena Anodizado blanco con DVH y premarco


CANTIDAD: 4 unidades

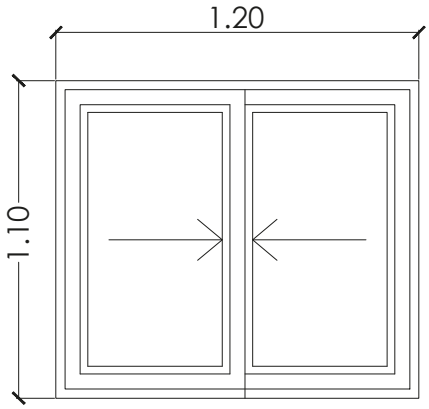

V2
1,20

(V2) Ventanas dormitorios
Alto: 1.10 m
Ancho: 1.20 m
Tipo: Corrediza
Material: Aluminio Modena Anodizado blanco con DVH y premarco


CANTIDAD: 1 unidad



V3
0.60

(V3) Ventanas baño
Alto: 0.40 m
Ancho: 0.60 m
Tipo: Corrediza
Material: Aluminio Modena Anodizado blanco con DVH y premarco

CANTIDAD: 1 unidad



V4
1,20

(V4) Ventanas escalera
Alto: 1.10 m
Ancho: 1.20 m
Tipo: Corrediza
Material: Aluminio Modena Anodizado blanco con DVH y premarco

CANTIDAD: 3 unidades

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 35


12. HERRERIAS


BARANDA METÁLICA A MEDIDA

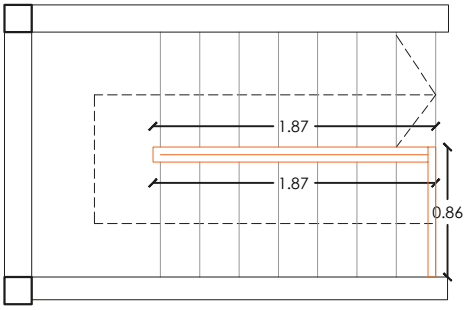


BARANDA METALICA A MEDIDA=
1.87ml + 1.87ml + 0.86ml= 4.6ml

13. AMOBLAMIENTOS Y MESADAS

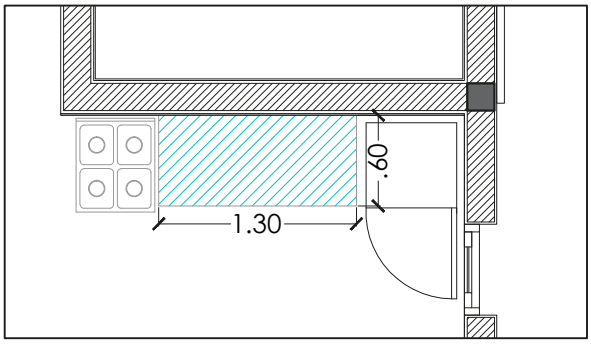

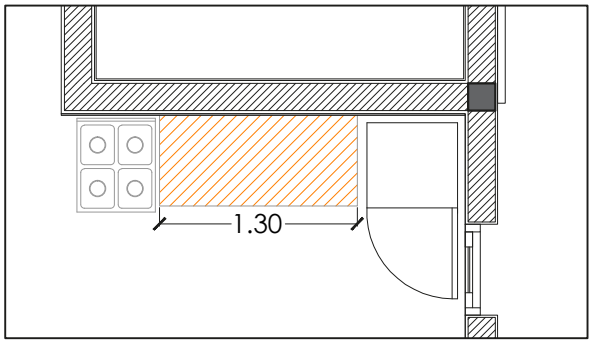

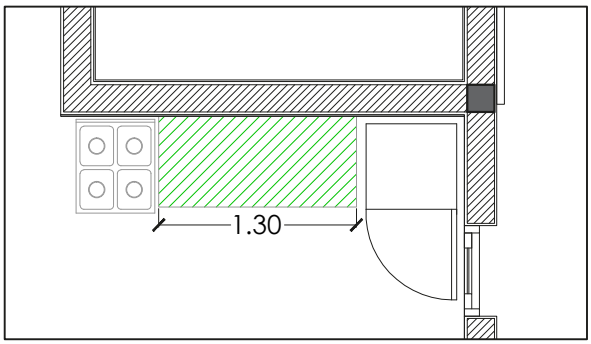

MESADA DE GRANITO 2cm= 1.30m x 0.60m= 0.78m²

BAJOMESADA= 1.30ml

MESADA GRANITO 2cm= 1.30ml

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO Nº: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

Nº : 36

14. INSTALACIÓN ELECTRICA

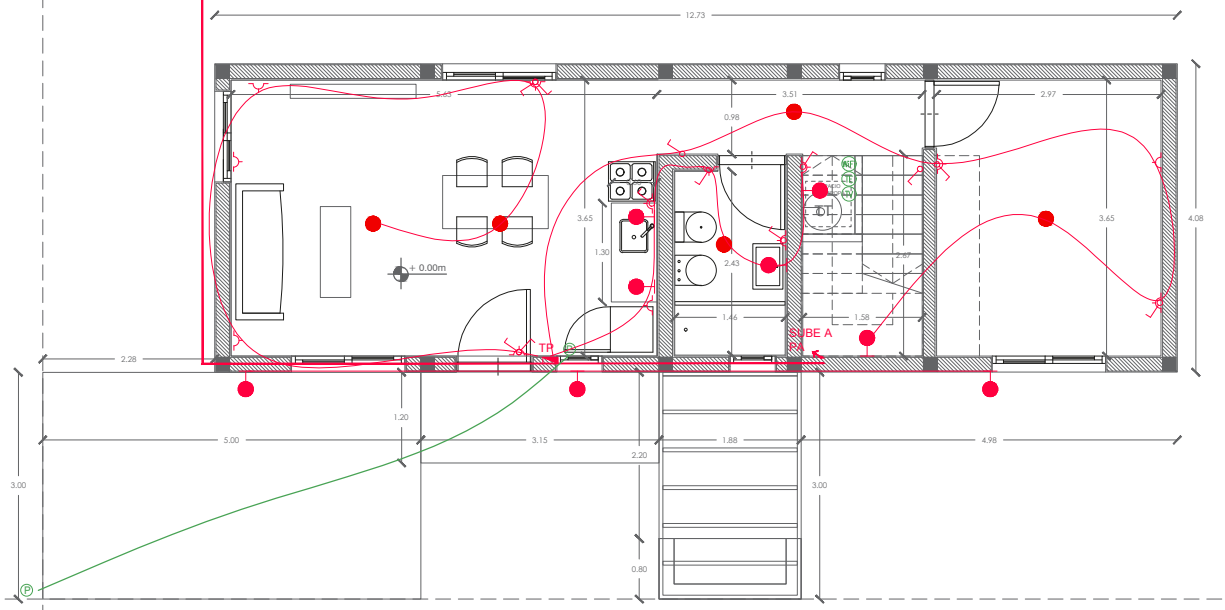


BOCA DE LUZ: 12

LLAVES: 13

TOMA CORRIENTE: 13

BOCA DE ELECTRICIDAD PB: 23

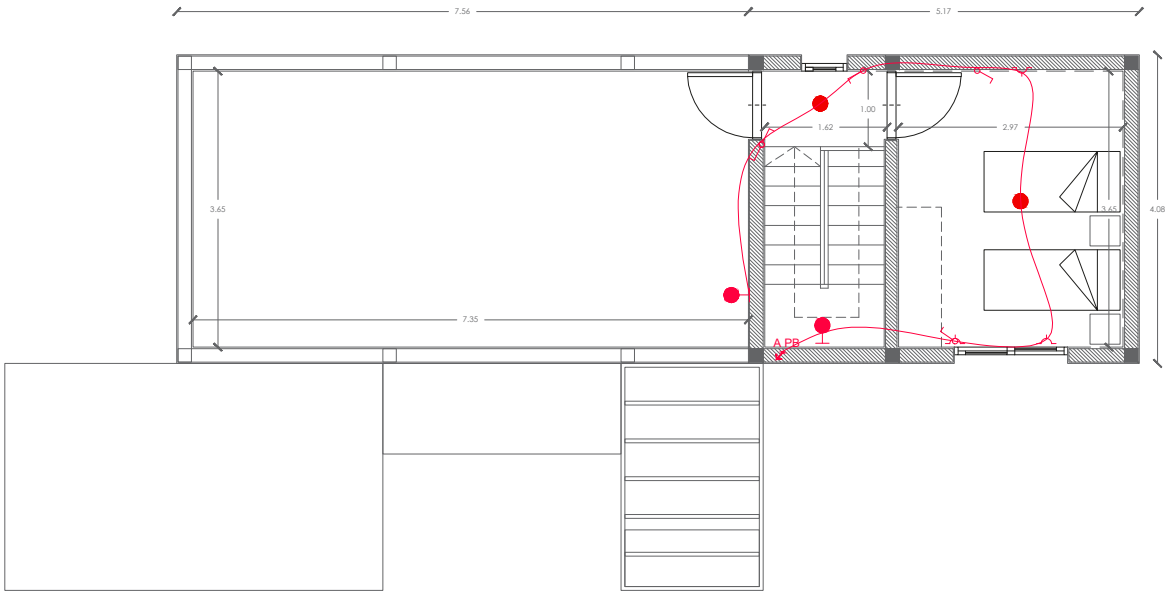

BOCA DE LUZ: 4

LLAVES: 6

TOMA CORRIENTE: 3

BOCA DE ELECTRICIDAD PA: 6

TOTAL BOCAS DE ELECTRICIDAD : 29

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14


DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA


ESC : 1:100

N° : 37

15. INSTALACIÓN SANITARIA

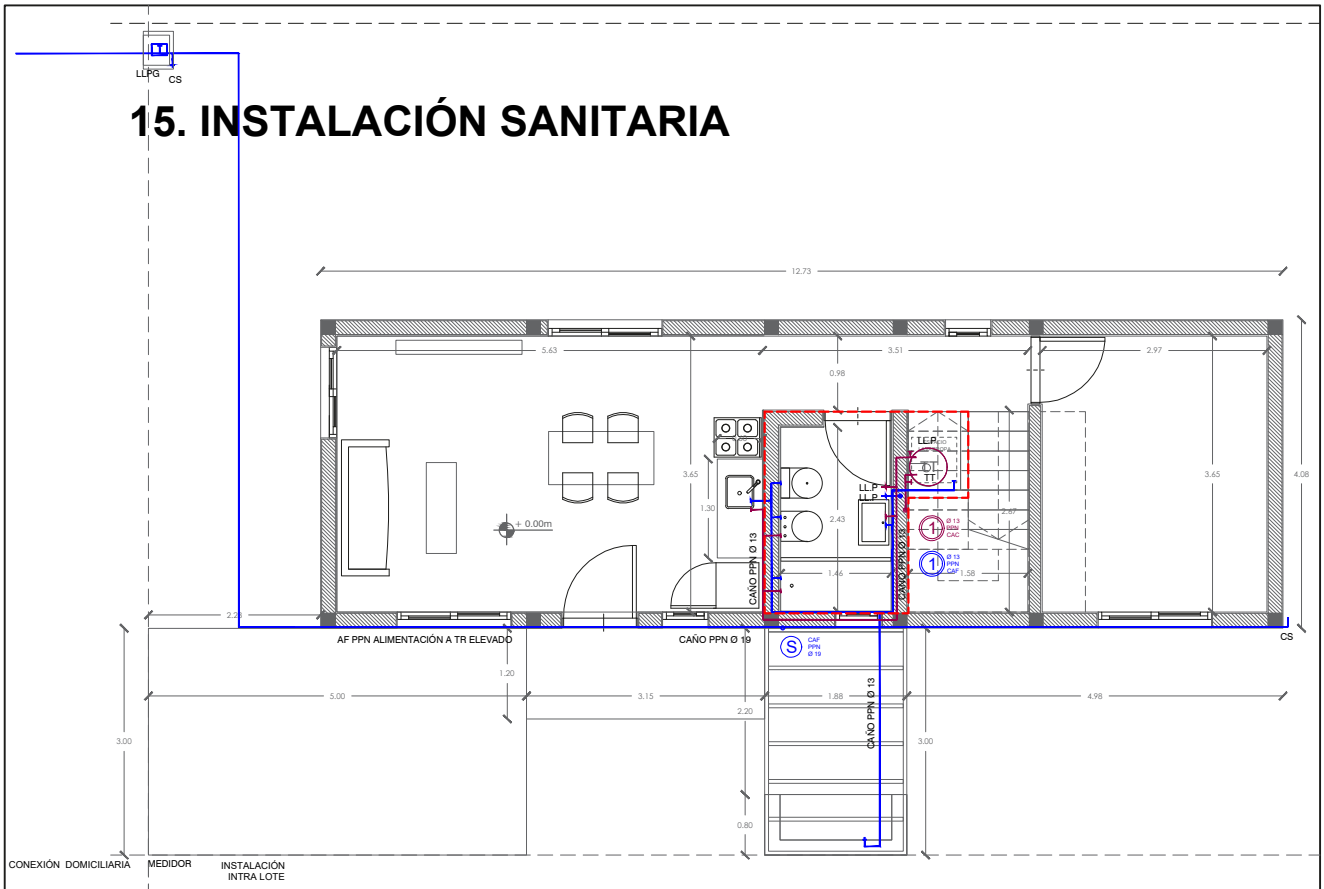

- ~~ALIMENTACIÓN DE TANQUES (15.4.5) :1+17.6+7.2+1.5+3.3+1= 31.6ml~~
- MONTANTES (15.4.6) : 4+4= 8ml
- NUCLEO C (COCINA + BAÑO + LAVADERO)

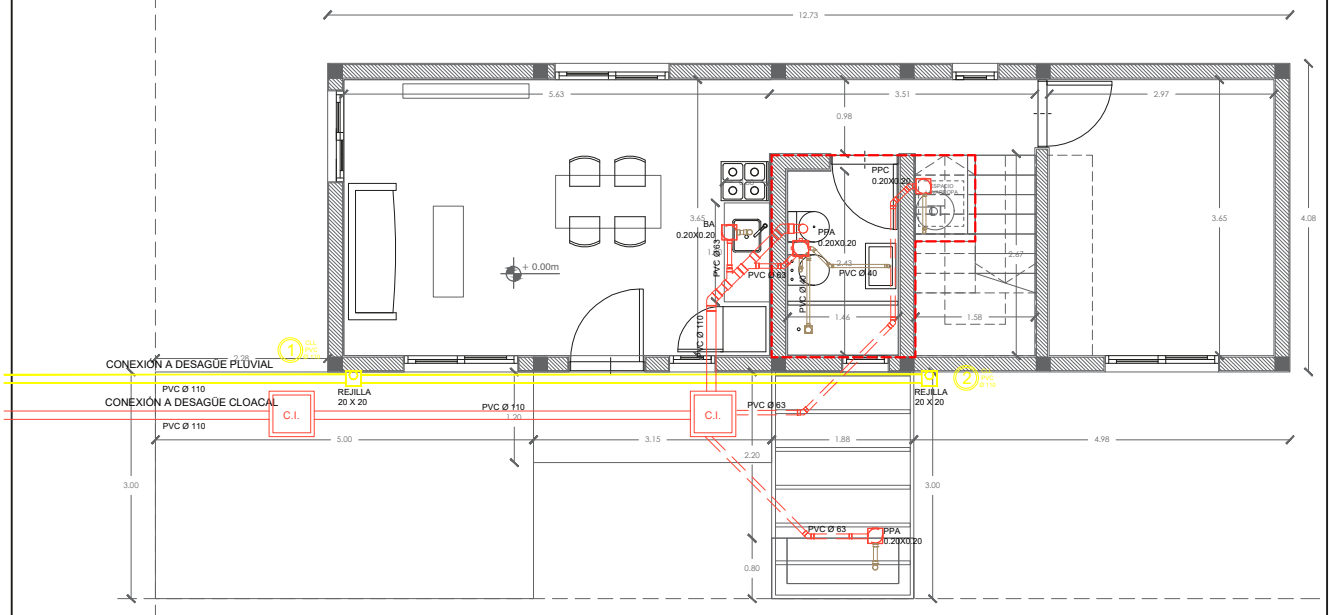

- COLUMNAS VERTICALES (15.6.3) : 3+6= 9ml
- ALBAÑALES (15.6.4) 13ml
- COLUMNA DE DESCARGA Y VENTILACIÓN (15.7.2)
- NUCLEO C (BAÑO + COCINA + LAVADERO)

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14 DOMINGUEZ, Juan Ignacio GUAJARDO, Santiago COLAVITA, Juan Cruz	PLANO DE : MEMORIA ESC : 1:100	N° : 38

16. INSTALACIÓN DE GAS

Instalación para gas natural media presión 2 bocas

1 Unidad por vivienda x 4 Viviendas
TOTAL= 4 unidades.

Boca de gas adicional en vivienda unifamiliar

2 unidad por vivienda x 4 viviendas
TOTAL= 8 unidades.

Colocacion artefactos:

4 unidades x 4 viviendas
TOTAL= 16 unidades

ARTEFACTOS

Calefactor TB 2200 kcal/h 2u x 4= 8u




Calefactor TB 5000 kcal/h 2u x 4= 8u



Cocina 1u x 4= 4u



17. PERGOLA

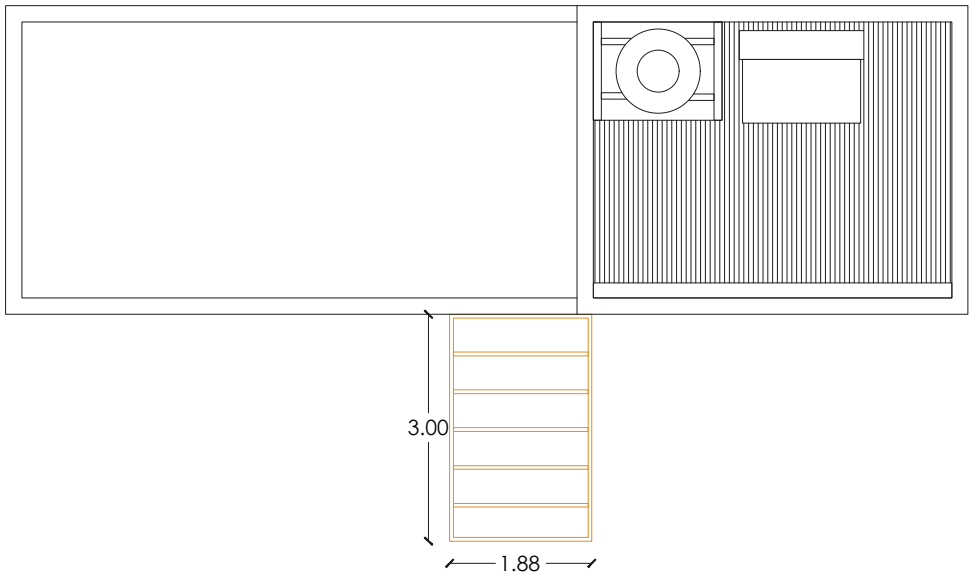

PERGOLA DE MADERA 3.00m x 1.88m x h 2.90m= 1 unidad

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz


PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 39

18. ESPEJOS

ESPEJO DE BAÑO

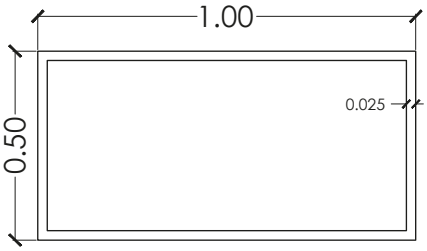


Espejo de baño
Alto: 0.50 m
Ancho: 1.500 m
Material: Marcos de madera 2.5cm de espesor

CANTIDAD: 1 unidad

19. PINTURAS


PLANTA BAJA

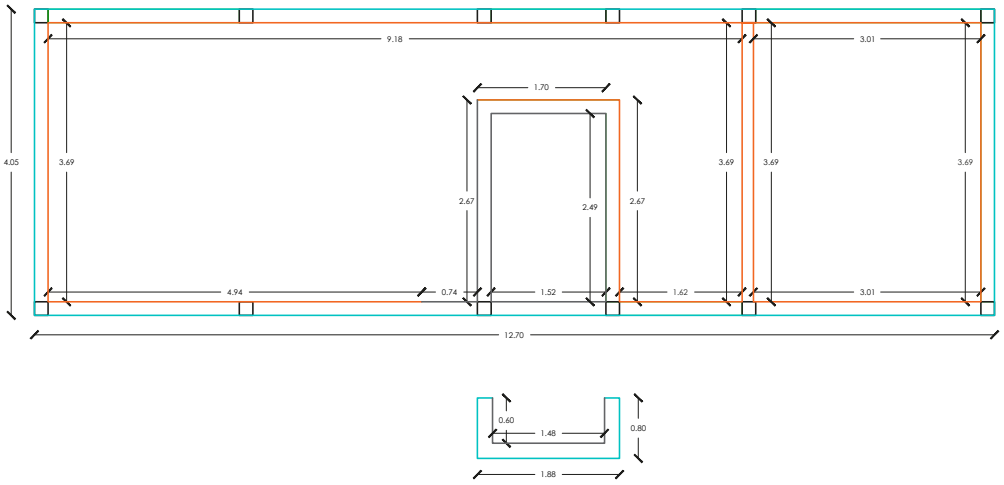

- **PINTURA LATEX EXTERIOR: 33,5ml x h: 2,80m= 93.8m²**
- **PINTURA LATEX INTERIOR: 42.59ml x h: 2,40m= 102.21m²**
- **PINTURA LATEX EXTERIOR PARRILLA: 1.88ml + 0.80ml + 0.80ml + 0.20ml + 0.20ml= 3.88ml x 2.15m= 8.34m²**

- **TOTAL PINTURA LATEX EXTERIOR PB (3 en 1 proyectado): 102.14m²**
- **TOTAL PINTURA LATEX PB (grueso y fino): 102.21m²**

PLANTA ALTA

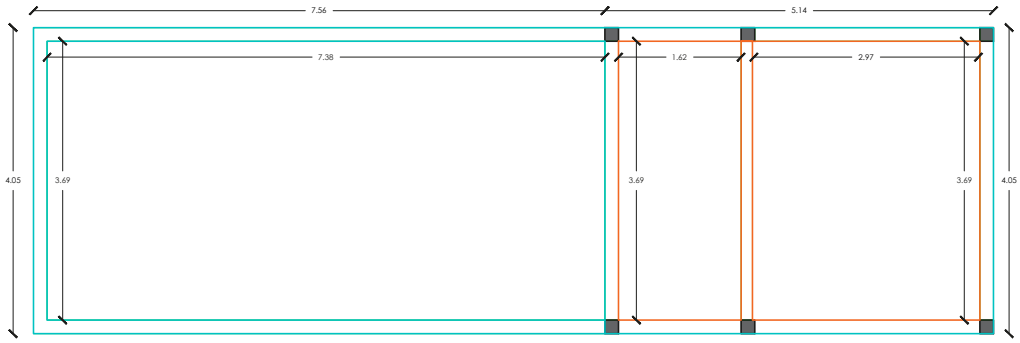


PINTURA LATEX EXTERIOR: 18.38ml x h= 3,55m= 65.24m²
PINTURA LATEX PARAPETO: 19.17ml x h=1.05m= 20.12m²
PINTURA LATEX PARAPETO: 18.45ml x h=1.05m= 19.37m²

PINTURA LATEX INTERIOR: 24.08ml x h: 2,7m= 65m²

TOTAL PINTURA EXTERIOR PA (3 en 1 proyectado): 104.73m²


TOTAL PINTURA LATEX INTERIOR PB (grueso y fino): 65m²

PLANTA DE TECHOS

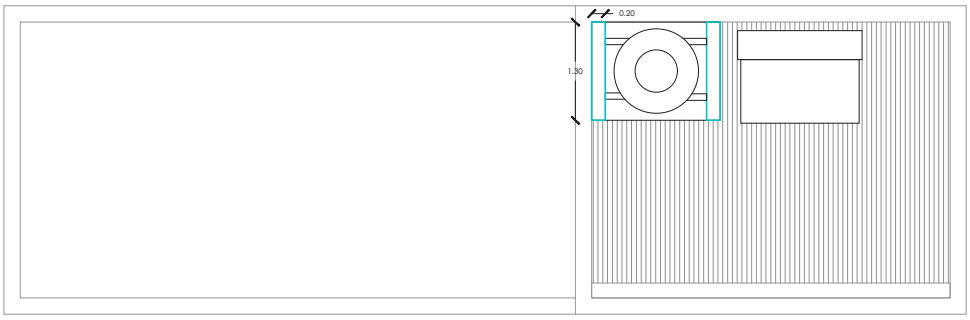

PINTURA LATEX MURO APOYO TANQUE: 1.3ml + 1.3ml + 0.2ml + 0.2ml= 3ml x 2= 6ml x h: 1.64m= 9.84m²

CIELORRASO SUSPENDIDO SOBRE PLANTA BAJA

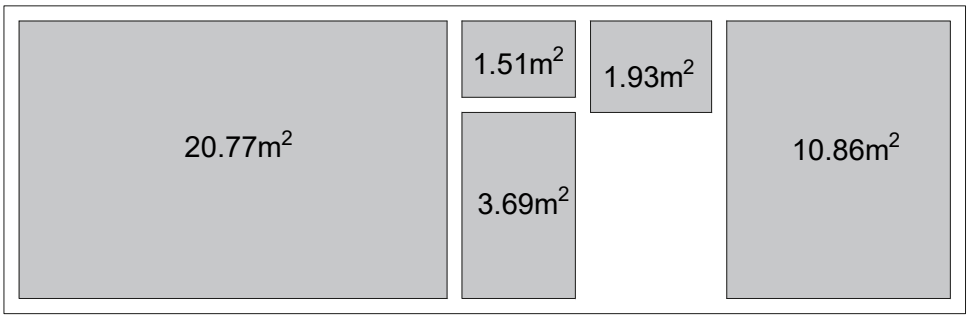

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA


ESC : 1:100

N° : 41

CIELORRASO SUSPENDIDO SOBRE PLANTA ALTA



TOTAL PINTURA EN CIELORRASO SUSPENDIDO= 55.49m²



PINTURA CARPINTERIAS: 2.05m x 0.86m= 1.76m² x 3= 5.28m² x 3 unidades= 15.84m²

TOTAL PINTURAS

- **TOTAL PINTURA LATEX EXTERIOR: 216.71m²**
- **TOTAL PINTURA LATEX INTERIOR: 167.21m²**
- **TOTAL PINTURA LATEX INTERIOR EN CIELORRASO: 55.49m²**
- **TOTAL PINTURA ESMALTE SINTETICO PUERTA INT: 15.84m²**

Economia y org. de obras

Ayudantes: Arq. Gabriel Babbicola

GRUPO N°: 14

DOMINGUEZ, Juan Ignacio
GUAJARDO, Santiago
COLAVITA, Juan Cruz

PLANO DE : MEMORIA

ESC : 1:100

N° : 42



PLANILLA DE LOCALES

CATEDRA GALAVERNA 2025

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

PLANILLA DE LOCALES

Nº	NIVEL	CANTIDAD	DESIGNACION	DIMENSIONES							
				A	B	C	D	H	PERIMETRO	SUPERFICIE	SUPERFICIE LATERAL
1	PB	1	COCINA-COMEDOR-ESTAR	3,65 m	5,63 m			2,4 m	18,56	20,55	49,32
2	PB	1	PASILLO PLANTA BAJA	0,98 m	3,51 m			2,4 m	8,98	3,44	8,26
3	PB	1	BAÑO	2,43 m	1,46 m			2,4 m	7,78	3,55	8,51
4	PB	1	DORMITORIO PLANTA BAJA	2,97 m	3,65 m			2,4 m	13,24	10,84	26,02
5	PA	1	DORMTIORIO PLANTA ALTA	2,97 m	3,65 m			2,6 m	13,24	10,84	28,19
6	PA	1	TERRAZA EXTERIOR	3,65 m	7,35 m			1,1 m	22,00	26,83	28,17
7	PA	1	PASILLO PLANTA ALTA	1,00 m	1,62 m			2,6 m	5,24	1,62	4,21
8	PA	1	ESCALERA(80ancho x 26pedada x 18,44h)	2,67 m	1,58 m			2,6 m	8,50	4,22	10,97
9	PB	1	SOLADO EXTERIOR	3,00 m	10,00 m			2,2 m	26,00	24,33	52,31

CONTRAPISOS			BANQUINAS			CARPETAS		PISOS				
TIPO	ESPESOR	COMPUTO M2	TIPO	ESPESOR	COMPUTO M2	TIPO	COMPUTO M2	TIPO	DIMENSIONES	ESPESOR	COLOCACION	COMPUTO M2
HORMIGON H17	10cm	21	HORMIGON POBRE	10cm	1	CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	21
HORMIGON H17	10cm	3				CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	3
HORMIGON H17	10cm	4				CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	4
HORMIGON H17	10cm	11				CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	11
HORMIGON H17	10cm	11				CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	11
HORMIGON H17	8cm	27				CEMENTICIA 1:3	5cm	BALDOSA ROJA A LA CAL	40x40cm	10mm	JUNTA RECTA	27
HORMIGON H17	10cm	2				CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	2
						CEMENTICIA 1:3	5cm	CERÁMICO	60x60cm	10mm	JUNTA RECTA	4
								HORMIGON PEINADO				24

ZOCALOS				REVOQUE GRUESO			TERMINACIÓN REVOQUES			REVESTIMIENTOS		
TIPO	DIMENSIONES	COLOCACION	COMPUTO MI	TIPO	ESPESOR	COMPUTO M2	TIPO	ESPESOR	COMPUTO M2	TIPO	DIMENSIONES	ESPESOR
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	19	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	18,56	REVOQUE FINO	1,00	18,56	CERAMICO	60X60	10mm
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	9	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	8,98	REVOQUE FINO	1,00	8,98			
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	8	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	7,78				CERAMICO	60X60	10mm
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	13	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	13,24	REVOQUE FINO	1,00	13,24			
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	13	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	13,24	REVOQUE FINO	1,00	13,24			
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	22	PREMEZCLADO 3 EN 1	2	22,00	REVOQUE FINO	1,00	22,00			
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	5	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	5,24						
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	9	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	8,50	REVOQUE FINO	1,00	8,50			
CERÁMICO	3"X3/4"	JUNTA RECTA	26	A LA CAL 1/4 ; 1;3	2	26,00	REVOQUE FINO	1,00	26,00			

		CIELORRASOS			MOLDURAS/BUÑAS		CAJONES		PINTURAS			
COLOCACION	COMPUTO M2	TIPO	ESPESOR	COMPUTO M2	TIPO	COMPUTO MI	TIPO	COMPUTO M2 /ml	MUROS	CIELORRASOS	CARPINTERIA DE MADERA	CARPINTERIA METALICA
JUNTA RECTA	7	PLACA DE YESO S	0,95	21					LATEX INTERIOR	LATEX CIELORRASO	ESMALTE SINTETICO	
		PLACA DE YESO S	0,95	3					LATEX INTERIOR	LATEX CIELORRASO	ESMALTE SINTETICO	
JUNTA RECTA	9	PLACA DE YESO S	0,95	4	BUÑA Z PERIMETRAL	7,78				LATEX CIELORRASO	ESMALTE SINTETICO	
		PLACA DE YESO S	0,95	11					LATEX INTERIOR	LATEX CIELORRASO	ESMALTE SINTETICO	
		PLACA DE YESO S	0,95	11					LATEX INTERIOR	LATEX CIELORRASO	ESMALTE SINTETICO	
									LATEX EXTERIOR			
		PLACA DE YESO S	0,95	2					LATEX INTERIOR	LATEX CIELORRASO	ESMALTE SINTETICO	
		PLACA DE YESO S	0,95	4					LATEX INTERIOR	LATEX CIELORRASO		

SANITARIOS								GAS			ELÉCTRICA		
CANILLA SERVICIO	INODORO	BIDET	LAVATORIO	PILETA COCINA	BAÑERA	PEDILUVIO	PILETA LAVADERO	COCINA 10000 CAL	TEMOTANQUE	CALEFACTOR	CENTROS	BOCAS DE PARED	TOMAS
				1				1	1	1	2	2	7
							1				1	1	1
	1	1	1		1	1					1	1	2
										1	1		3
										1	1		3
												1	
											1		
1												1	
												3	

EyOO2025

TELEFONIA	TV	TIMBRE	OBSERVACIONES
1	1	1	



CATEDRA GALAVERNA 2025

PLANILLA DE PRESUPUESTO

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

GRUPO 14

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS 2025 — GRUPO NRO 14 - FECHA DE EMISIÓN: 24-6

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO: OBRA — INTEGRANTES: COLAVITA, JUAN CRUZ - DOMINGUEZ, JUAN INGACIO - GUAJARDO, SANTIAGO

CORREC 1 | CORRE C2 | CORRE C3

FUENTE	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD X 4 VIVIENDAS	COSTO UNIT. MATERIALES	COSTO UNIT. MANO OBRA	COSTO-COSTO UNIT. TOTAL	COSTO COSTO	% INCIDENCIA	% G.G.D	% G.G.I	COSTO	BENEF 10% s/Costo	PRECIO	PRECIO UNIT.	PRECIO POR RUBRO UNIDAD	% INCIDENCIA POR RUBRO
		1,00	**TRABAJOS PRELIMINARES**		**1 vivienda**	**4 viviendas**													
		1.1	**VALLA PROVISORIA**																
VIVIENDA C1	517-0010	1.1.2	Alambre olimpico perimetral	ML	134,00	134,00	$ 27.728,19		$27.728,19	$3.715.577,46	1,24%	$ 980.996,66	$597.636,82	$ 5.294.210,94	$ 529.421,09	$ 5.823.632,04	$ 43.459,94		
VIVIENDA C3	075-0054	1.1.3	Porton de dos hojas 3,50 X 2,50	U	1,00	1,00	$ 539.350,00		$539.350,00	$539.350,00	0,18%	$ 0,00	$0,00	$ 539.350,00	$ 53.935,00	$ 593.285,00	$ 593.285,00		
		1.2	**CASILLA DE OBRADOR 6 x 2,4**																
VIVIENDA C3	182-0260	1.2.1	Oficina liviana de madera 3,66x7,33	GL	1,00	12,00	$ 379.300,00		$379.300,00	$4.551.600,00	1,51%	$ 1.201.725,56	$732.107,94	$ 6.485.433,50	$ 648.543,35	$ 7.133.976,85	$ 7.133.976,85		
		1.3	**CARTEL DE OBRA**															$ 19.453.474,81	4,18%
VIVIENDA C1	515-0010	1.3.1	De chapa con estructura 2,40 x 1,20	M2	1,00	1,00	$ 52.097,07		$52.097,07	$52.097,07	0,02%	$ 13.754,81	$8.379,62	$ 74.231,50	$ 7.423,15	$ 81.654,65	$ 81.654,65		
		1.4	**REPLANTEO**																
Clarin	580-0960	1.4.1	Armado de ejes y corralito+marcaciones	M2	104,00	416,00	$ 1.860,00		$1.860,00	$773.760,00	0,26%	$ 204.290,18	$124.456,42	$ 1.102.506,60	$ 110.250,66	$ 1.212.757,26	$ 11.661,13		
		1.6	**LUZ DE OBRA**																
VIVIENDA C1	574-0040	1.6.1	Armado de pilar y tablero de obra + tablero reglamentario de obra	U	1,00	1,00	$ 1.192.156,94		$1.192.156,94	$1.192.156,94	0,40%	$ 314.756,45	$191.754,01	$ 1.698.667,40	$ 169.866,74	$ 1.868.534,14	$ 1.868.534,14		
VIVIENDA C1	580-0960	1.7	Conexion de agua en acera	U	1,00	4,00	$ 436.983,55		$436.983,55	$1.747.934,20	0,58%	$ 461.494,24	$281.148,72	$ 2.490.577,16	$ 249.057,72	$ 2.739.634,88	$ 2.739.634,88		
		2,00	**MOVIMIENTO DE SUELOS**																
VIVIENDA C1	558-0010	2.1	RETIRO DE SUELO VEGETAL 30cm	M3	28,52	114,06	$ 16.545,74		$16.545,74	$1.887.207,10	0,63%	$ 498.265,45	$303.550,25	$ 2.689.022,80	$ 268.902,28	$ 2.957.925,08	$ 103.732,25		
		2.2	**EXCAVACION**																
VIVIENDA C1	558-0170	2.2.1	EXCAVACION DE BASES	M3	7,14	28,56	$ 48.015,26		$48.015,26	$1.371.315,83	0,46%	$ 362.058,46	$220.571,05	$ 1.953.945,34	$ 195.394,53	$ 2.149.339,87	$ 301.027,99	$ 8.151.624,70	1,73%
VIVIENDA C1	558-0170	2.2.2	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION	M3	3,82	15,28	$ 48.015,26		$48.015,26	$733.673,17	0,24%	$ 193.706,35	$118.008,60	$ 1.045.388,12	$ 104.538,81	$ 1.149.926,93	$ 301.027,99		
		2.3	**RELLENO DE BASES**																
VIVIENDA C1	558-0340	2.3.1	Carga de tierra y pala, vereda/camión	M3	7,13	28,52	$ 12.382,81		$12.382,81	$353.157,74	0,12%	$ 93.241,65	$56.804,11	$ 503.203,50	$ 50.320,35	$ 553.523,85	$ 77.633,08		
VIVIENDA C1	558-0030	2.4	Aporte de suelo: relleno y terraplenamiento	M3	28,52	114,06		$ 7.500,64	$7.500,64	$855.523,00	0,28%	$ 225.877,46	$137.607,69	$ 1.219.008,15	$ 121.900,82	$ 1.340.908,97	$ 47.024,69		
		3,00	**ESTRUCTURA RESISTENTE**																
		3.1	**DE HORMIGON ARMADO**																
VIVIENDA C1	554-0250	3.1.1	H° de Bases	M3	3,10	12,40	$ 88.208,18	$ 127.440,61	$215.648,79	$2.674.045,00	0,89%	$ 706.008,48	$430.110,20	$ 3.810.163,68	$ 381.016,37	$ 4.191.180,04	$ 1.351.993,56		
VIVIENDA C1	544-0290	3.1.2	H° de vigas de fundacion	M3	2,88	11,52	$ 405.589,91	$ 321.660,81	$727.250,72	$8.377.928,29	2,79%	$ 2.211.962,94	$1.347.558,63	$ 11.937.449,86	$ 1.193.744,99	$ 13.131.194,85	$ 4.559.442,66		
VIVIENDA C1	554-0410	3.1.3	H° de columnas	M3	1,68	6,72	$ 326.581,86	$ 217.194,70	$543.776,56	$3.654.178,48	1,22%	$ 964.785,94	$587.761,03	$ 5.206.725,45	$ 520.672,54	$ 5.727.397,99	$ 3.409.165,47		
VIVIENDA C1	554-0350	3.1.4	H° de vigas de encadenado sobre P.A	M3	0,95	3,80	$ 380.921,44	$ 360.508,92	$741.430,36	$2.817.435,37	0,94%	$ 743.866,79	$453.174,01	$ 4.014.476,17	$ 401.447,62	$ 4.415.923,78	$ 4.648.340,82	$ 53.944.200,35	11,45%
VIVIENDA C1	554-0350	3.1.5	H° de vigas de encadenado sobre P.B.	M3	2,17	8,68	$ 380.921,44	$ 360.508,92	$741.430,36	$6.435.615,52	2,14%	$ 1.699.148,35	$1.035.144,84	$ 9.169.908,71	$ 916.990,87	$ 10.086.899,59	$ 4.648.340,82		
VIVIENDA C1	554-0370	3.1.6	Losa de H° Armado	M3	4,70	18,80	$ 240.260,19	$ 259.788,45	$500.048,64	$9.400.914,43	3,13%	$ 2.482.054,47	$1.512.102,14	$ 13.395.071,04	$ 1.339.507,10	$ 14.734.578,15	$ 3.135.016,63		
VIVIENDA C1	554-0370	3.1.7	H° de escalera	M3	0,43	1,73	$ 240.260,19	$ 259.788,45	$500.048,64	$864.084,05	0,29%	$ 228.137,77	$138.984,71	$ 1.231.206,53	$ 123.120,65	$ 1.354.327,18	$ 3.135.016,63		
VIVIENDA C1	518-0050	3.1.8	H° de pilotes : Seccion 20 x 20 o equivalente cirular	ML	0,40	1,60	$ 120.704,39		$120.704,39	$193.127,02	0,06%	$ 50.989,91	$31.063,76	$ 275.180,70	$ 27.518,07	$ 302.698,77	$ 756.746,92		
		4,00	**MAMPOSTERIA**																
VIVIENDA C1	554-0010	4.1	Ladrillo comun para mamposteria de elevación	M3	5,02	20,08	$ 87.675,14	$ 114.738,34	$202.413,48	$4.064.462,68	1,35%	$ 1.073.110,26	$653.753,71	$ 5.791.326,66	$ 579.132,67	$ 6.370.459,32	$ 1.269.015,80	$ 50.024.289,08	12,35%
VIVIENDA C1	554-0170	4.2	Ladrillo ceramico con camara de aire 18x18x33	M2	132,70	530,80	$ 18.186,11	$ 16.787,89	$34.974,00	$18.564.199,20	6,17%	$ 4.901.369,32	$2.985.982,44	$ 26.451.550,96	$ 2.645.155,10	$ 29.096.706,06	$ 219.266,81		
VIVIENDA C1	554-0170	4.3	Ladrillo ceramico 18x18x33	M2	66,39	265,56	$ 18.186,11	$ 16.787,89	$34.974,00	$9.287.695,44	3,09%	$ 2.452.162,09	$1.493.891,29	$ 13.233.748,82	$ 1.323.374,88	$ 14.557.123,70	$ 219.266,81		
VIVIENDA C1	554-0320	4.4	Ladrillos refractarios para 1600°	M3	0,93	3,72	$ 1.188.366,92	$ 208.919,04	$1.397.285,96	$5.197.903,77	1,73%	$ 1.372.364,40	$836.063,50	$ 7.406.331,67	$ 740.633,17	$ 8.146.964,84	$ 8.760.177,25		
		5,00	**CAPAS AISLADORAS**																
		5.1	**HIDROFUGAS**																
VIVIENDA C1	508-0020	5.1.1	Horizontal para dado hidrófugo	m2	40,34	161,36	$ 2.970,40	$ 4.849,76	$7.820,16	$1.261.861,02	0,42%	$ 333.159,91	$202.965,65	$ 1.797.986,58	$ 179.798,66	$ 1.977.785,24	$ 49.027,89	$ 3.381.640,35	0,72%
VIVIENDA C3	120-0358	5.1.2	Polietileno de 200 micrones	m2	42,70	170,80	$ 233,82		$233,82	$39.936,46	0,01%	$ 10.544,13	$6.423,63	$ 56.904,22	$ 5.690,42	$ 62.594,64	$ 1.465,92		
		5.2	**TERMICO**							$0,00									
VIVIENDA C1	582-0051	5.2.2	Poliestileno expandido de alta densidad 20kg/m3 y 3cm de espesor(techo inclinado)	m2	17,30	69,20	$ 9.366,09	$ 3.000,20	$12.366,29	$855.747,27	0,28%	$ 225.936,67	$137.643,77	$ 1.219.327,71	$ 121.932,77	$ 1.341.260,48	$ 77.529,51		
		6,00	**CUBIERTAS**																
		6.1	**LOSA PLANA HORMIGON ARMADO**																
VIVIENDA C1	522-070	6.1.1	Contrapiso de hormigon armado alivianado con pendiente esp min. 5cm	M2	26,83	107,31	$ 7.326,99	$ 7.865,74	$15.192,73	$1.630.331,86	0,54%	$ 430.444,56	$262.232,82	$ 2.323.009,23	$ 232.300,92	$ 2.555.310,16	$ 95.249,66		
VIVIENDA C1	568-440	6.1.2	Carpeta bajo techado	M2	26,83	107,31	$ 2.523,38	$ 5.222,98	$7.746,36	$831.261,89	0,28%	$ 219.471,98	$133.705,39	$ 1.184.439,26	$ 118.443,93	$ 1.302.883,18	$ 48.565,21		
VIVIENDA C1	582-0190	6.1.3	Membrana geotextil transitable (losa plana)	M2	26,83	107,31	$ 25.527,93		$25.527,93	$2.739.402,17	0,91%	$ 723.264,26	$440.622,66	$ 3.903.289,08	$ 390.328,91	$ 4.293.617,99	$ 160.045,40		
VIVIENDA C1	582-0050	6.1.4	Poliestileno expandido de alta densidad 20kg/m3 y 3cm de espesor(losa plana)	M2	26,83	107,31	$ 9.366,09	$ 3.000,20	$12.366,29	$1.327.026,58	0,44%	$ 350.365,09	$213.447,29	$ 1.890.838,97	$ 189.083,90	$ 2.079.922,86	$ 77.529,51		
VIVIENDA C3	120-0358	6.1.5	Film de polietileno 200 micrones barrera de vapor	M2	26,83	107,31	$ 233,82		$233,82	$25.091,22	0,01%	$ 6.624,65	$4.035,83	$ 35.751,71	$ 3.575,17	$ 39.326,88	$ 1.465,92	$ 24.097.893,25	5,11%
VIVIENDA C1	582-0200	6.1.6	Baldosa ceramica coloradas 20 x 20cm junta tomada	M2	26,83	107,31	$ 12.920,98	$ 9.582,42	$22.503,40	$2.414.839,85	0,80%	$ 637.572,45	$388.418,01	$ 3.440.830,32	$ 344.083,03	$ 3.784.913,35	$ 141.083,34		
		6.2	**TECHO INCLINADO**																
VIVIENDA C1	582-0440	6.2.1	Cincalum Acanalada C27, incluyendo cabios, machimbres, listones, Ruberoid	m2	17,30	69,20	$ 47.436,15	$ 26.832,62	$74.268,77	$5.139.398,88	1,71%	$ 1.356.917,78	$826.653,21	$ 7.322.969,87	$ 732.296,99	$ 8.055.266,86	$ 465.622,36		
VIVIENDA C3	242-0070	6.2.2	Babeta chapa galvanizada n°24	ml	11,44	45,76	$ 7.488,00		$7.488,00	$342.650,88	0,11%	$ 90.467,60	$55.114,12	$ 488.232,60	$ 48.823,26	$ 537.055,86	$ 46.945,44		
VIVIENDA C3	242-0210	6.2.3	Canaleta de chapa galvanizada	ml	4,80	19,20	$ 3.600,00		$3.600,00	$69.120,00	0,02%	$ 18.249,25	$11.117,70	$ 98.486,94	$ 9.848,69	$ 108.335,64	$ 22.569,92		
VIVIENDA C1	582-0051	6.2.4	Poliestileno expandido de alta densidad 20kg/m3 y 3cm de espesor(techo inclinado)	m2	17,30	69,20	$ 9.366,09	$ 3.000,20	$12.366,29	$855.747,27	0,28%	$ 225.936,67	$137.643,77	$ 1.219.327,71	$ 121.932,77	$ 1.341.260,48	$ 77.529,51		
		7,00	**REVOQUES**																
		7.1	**GRUESO**																
VIVIENDA C1	578-0240	7.1.1	Para bajo revestimiento (cocina-baño-parrilla)	M2	33,19	132,76	$ 341,11	$ 10.432,88	$10.773,99	$1.430.354,91	0,48%	$ 377.646,11	$230.067,27	$ 2.038.068,30	$ 203.806,83	$ 2.241.875,13	$ 67.546,70		
		7.2	**COMPLETOS**															$ 48.815.392,44	10,36%
VIVIENDA C1	578-0560	7.2.1	Exterior proyectado 3 en 1 bolsa 30 kg	M2	216,71	866,84	$ 10.081,81	$ 7.959,83	$18.041,64	$15.639.215,22	5,20%	$ 4.129.107,26	$2.515.509,64	$ 22.283.832,11	$ 2.228.383,21	$ 24.512.215,33	$ 113.110,68		
VIVIENDA C1	578-0550	7.2.2	Interior grueso y fino a la cal	M2	167,21	668,84	$ 13.084,80	$ 7.959,83	$21.044,63	$14.075.490,33	4,68%	$ 3.716.248,45	$2.263.990,30	$ 20.055.729,08	$ 2.005.572,91	$ 22.061.301,99	$ 131.937,70		
		8,00	**YESERIA**																
		8.1	**PLACAS DE YESO (Durlock o similar)**																
VIVIENDA C1	521-0350	8.1.1	Suspendido junta tomada, placa 9.5mm (bastidor 3,5mm)	M2	51,80	207,20	$ 9.851,52	$ 3.250,00	$13.101,52	$2.714.634,94	0,90%	$ 716.725,15	$436.638,94	$ 3.867.999,03	$ 386.799,90	$ 4.254.798,94	$ 82.138,98	$ 4.983.671,39	1,06%
VIVIENDA C1	521-0350	8.1.2	Suspendido junta tomada, placa 12mm verde en baños (bastidor 3,5mm)	M2	3,69	14,76	$ 9.851,52	$ 3.250,00	$13.101,52	$193.378,44	0,06%	$ 51.056,29	$31.104,20	$ 275.538,93	$ 27.553,89	$ 303.092,82	$ 82.138,98		
VIVIENDA C1	590-0330	8.1.3	Buña Z perimetral en baños	ML	7,92	31,68	$ 8.574,96		$8.574,96	$271.654,73	0,09%	$ 71.723,01	$43.694,65	$ 387.072,39	$ 38.707,24	$ 425.779,63	$ 53.760,05		
		9,00	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**																
		9.1	**DE HORMIGON DE CASCOTES**																
VIVIENDA C1	522-0020	9.1.1	Sobre terreno natural	M2	83,85	335,40	$ 7.938,02	$ 8.655,34	$16.593,36	$5.565.412,94	1,85%	$ 1.469.395,15	$895.175,99	$ 7.929.984,08	$ 792.998,41	$ 8.722.982,49	$ 104.030,80		
		9.2	**CARPETAS**															$ 12.795.175,38	2,72%
VIVIENDA C1	568-0440	9.2.1	De cemento de albañileria bajo piso ceramico	M2	83,85	335,40	$ 2.523,38	$ 5.222,98	$7.746,36	$2.598.129,14	0,86%	$ 685.964,98	$417.899,42	$ 3.701.993,54	$ 370.199,35	$ 4.072.192,89	$ 48.565,21		
		10,00	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**																
		10.1	**PISO CERAMICO**																
VIVIENDA C1 Y C3	568-180 196-0770	10.1.1	En Baño 60 x 60 x 0,1	M2	3,69	14,76	$ 8.203,74		$8.203,74	$121.087,20	0,04%	$ 31.969,77	$19.476,43	$ 172.533,39	$ 17.253,34	$ 189.786,73	$ 51.432,72		
VIVIENDA C1 Y C3	568-180 196-0790	10.1.2	Locales interiores ceramico 60 x 60 x 0,1	M2	55,73	222,92	$ 8.203,74		$8.203,74	$1.828.777,72	0,61%	$ 482.838,77	$294.152,10	$ 2.605.768,58	$ 260.576,86	$ 2.866.345,44	$ 51.432,72		
		10.2	**ZOCALOS CERAMICOS**															$ 4.461.788,39	0,95%
VIVIENDA C1 Y C3	568-180 196-0790	10.2.1	Locales interiores (CERAMICO)	M2	3,33	13,32	$ 8.203,74		$8.203,74	$109.273,82	0,04%	$ 28.850,76	$17.576,29	$ 155.700,87	$ 15.570,09	$ 171.270,96	$ 51.432,72		
		10.3	**REVESTIMIENTOS**																
VIVIENDA C1 Y C3	568-180 196-0770	10.3.1	Ceramicos en baño 60 x 60 x 0,1	M2	19,25	77,00	$ 8.203,74		$8.203,74	$631.687,98	0,21%	$ 166.779,94	$101.604,66	$ 900.072,59	$ 90.007,26	$ 990.079,85	$ 51.432,72		
VIVIENDA C1 Y C3	568-180 196-0790	10.3.2	Ceramicos en cocina 60 x 60 x 0,1	M2	4,75	19,00	$ 8.203,74		$8.203,74	$155.871,06	0,05%	$ 41.153,49	$25.071,28	$ 222.095,83	$ 22.209,58	$ 244.305,42	$ 51.432,72		
		11,00	**CARPINTERIAS**																
		11.1	**DE MADERA**																
VIVIENDA C1 Y C3	512-0010 066-1240	11.1.1	Provisión y colocación P1 de abrir	U	2,00	8,00	$ 22.107,91		$22.107,91	$176.863,28	0,06%	$ 46.695,91	$28.447,80	$ 252.007,00	$ 25.200,70	$ 277.207,70	$ 138.603,85		
VIVIENDA C1 Y C3	512-0010 066-1242	11.1.2	Provisión y colocación P2 de abrir	U	3,00	12,00	$ 22.107,91		$22.107,91	$265.294,92	0,09%	$ 70.043,87	$42.671,70	$ 378.010,49	$ 37.801,05	$ 415.811,54	$ 138.603,85		
		11.2	**DE ALUMINIO**															$ 3.659.057,66	0,78%
VIVIENDA C1 Y C3		11.2.1	Provisión y colocación V1 correditza 1,10 x 1,50	U	4,00	16,00	$ 52.566,21		$52.566,21	$841.059,36	0,28%	$ 222.058,73	$135.281,27	$ 1.198.399,36	$ 119.839,94	$ 1.318.239,30	$ 329.559,83		
VIVIENDA C1 Y C3		11.2.2	Provisión y colocación V2 correditza 1,10 x 1,20	U	1,00	4,00	$ 52.566,21		$52.566,21	$210.264,84	0,07%	$ 55.514,68	$33.820,32	$ 299.599,84	$ 29.959,98	$ 329.559,83	$ 329.559,83		
VIVIENDA C1 Y C3		11.2.3	Provisión y colocación V3 correditza 0,40 x 0,60	U	1,00	4,00	$ 52.566,21		$52.566,21	$210.264,84	0,07%	$ 55.514,68	$33.820,32	$ 299.599,84	$ 29.959,98	$ 329.559,83	$ 329.559,83		
VIVIENDA C1 Y C3		11.2.4	Provisión y colocación V4 abatible 1,10 x 0,60	U	3,00	12,00	$ 52.566,21		$52.566,21	$630.794,52	0,21%	$ 166.544,05	$101.460,95	$ 898.799,52	$ 89.879,95	$ 988.679,48	$ 329.559,83		
									$0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		
		12,00	**HERRERIAS**																
VIVIENDA C1	534-0100	12.1	Baranda escalera adjustable para 12 alzadas	U	1,00	4,00	$ 1.550.677,49		$1.550.677,49	$6.202.709,96	2,06%	$ 1.637.656,01	$997.682,84	$ 8.838.048,81	$ 883.804,88	$ 9.721.853,69	$ 9.721.853,69	$ 13.160.564,69	2,79%
VIVIENDA C1	534-0120	12.2	Diferencia de baranda por cada alzada adicional	U	4,00	16,00	$ 137.122,30		$137.122,30	$2.193.956,80	0,73%	$ 579.254,32	$352.889,80	$ 3.126.100,91	$ 312.610,09	$ 3.438.711,01	$ 859.677,75		
		13,00	**AMOBLAMIENTOS Y MESADAS**																
		13.1	**DE COCINA**																
Clarin	21-01	13.1.1	Mesada granito 2cm	M2	0,78	3,12	$ 223.460,00	$ 30.964,00	$254.424,00	$793.802,88	0,26%	$ 209.581,95	$127.680,24	$ 1.131.065,07	$ 113.106,51	$ 1.244.171,58	$ 1.595.091,77	$ 3.627.836,92	0,77%
VIVIENDA C3	020-0085	13.1.2	Bajo mesada a medida sin mesada	ML	1,30	5,20	$ 165.322,31		$165.322,31	$859.676,01	0,29%	$ 226.973,95	$138.275,69	$ 1.224.925,65	$ 122.492,57	$ 1.347.418,22	$ 1.036.475,55		
VIVIENDA C3	020-0095	13.1.3	Alacenas a medida	ML	1,30	5,20	$ 127.142,98		$127.142,98	$661.143,50	0,22%	$ 174.556,87	$106.342,47	$ 942.042,84	$ 94.204,28	$ 1.036.247,12	$ 797.113,17		
		14,00	**INSTALACION ELECTRICA**																
		14.1	**PILAR, TABLERO PPAL, TOMA JABALINA, TERMCIAS, DISYUNTORES, MÓDULOS**																
VIVIENDA C1	532-050	14.1.1	Boca de electricidad	u	29,00	116,00	$ 286.612,84		$286.612,84	$33.247.089,44	11,06%	$ 8.777.985,11	$5.347.670,76	$ 47.372.745,31	$ 4.737.274,53	$ 52.110.019,84	$ 1.796.897,24		
		14.2	**BAJO TENSION**																
VIVIENDA C1	532-0260	14.2.1	Boca de TV	u	1,00	4,00	$ 270.219,32		$270.219,32	$1.080.877,28	0,36%	$ 285.376,10	$173.855,09	$ 1.540.108,47	$ 154.010,85	$ 1.694.119,32	$ 1.694.119,32		
VIVIENDA C1	532-0200	14.2.2	Boca de telefonia	u	1,00	4,00	$ 260.569,78		$260.569,78	$1.042.279,12	0,35%	$ 275.185,31	$167.646,72	$ 1.485.111,15	$ 148.511,12	$ 1.633.622,27	$ 1.633.622,27		

VIVIENDA C1	532-0200	14.2.3	WiFi	u	1,00	4,00	$ 260.569,78		$260.569,78	$1.042.279,12	0,35%	$ 275.185,31	$167.646,72	$ 1.485.111,15	$ 148.511,12	$ 1.633.622,27	$ 1.633.622,27	$ 82.678.036,79	17,55%
VIVIENDA C1	532-0220	14.2.4	Timbre	u	1,00	4,00	$ 271.304,38		$271.304,38	$1.085.217,52	0,36%	$ 286.522,02	$174.553,20	$ 1.546.292,74	$ 154.629,27	$ 1.700.922,02	$ 1.700.922,02		
		14.3	**ARTEFACTOS (a detallar)**							$0,00									
VIVIENDA C3	108-4000	14.3.1	Spots de embutir diametro 15cm, c/lampara led 12w	u	13,00	52,00	$ 7.028,10		$7.028,10	$365.461,20	0,12%	$ 96.490,04	$58.783,08	$ 520.734,32	$ 52.073,43	$ 572.807,75	$ 44.062,13		
VIVIENDA C3	117-0020	14.3.2	Extractor p/ cocina 150mm	u	1,00	4,00	$ 1.632.339,27		$1.632.339,27	$6.529.357,08	2,17%	$ 1.723.898,25	$1.050.222,82	$ 9.303.478,15	$ 930.347,81	$ 10.233.825,96	$ 10.233.825,96		
VIVIENDA C3	117-0010	14.3.3	Extractores 150 mm p/baños	u	1,00	4,00	$ 11.830,50		$11.830,50	$47.322,00	0,02%	$ 12.494,08	$7.611,57	$ 67.427,65	$ 6.742,76	$ 74.170,41	$ 74.170,41		
Clarin	33-09	14.3.4	Colocacion de artefactos	u	49,00	196,00	$ 24.750,00		$24.750,00	$4.851.000,00	1,61%	$ 1.280.773,94	$780.265,32	$ 6.912.039,26	$ 691.203,93	$ 7.603.243,19	$ 155.168,23		
Mercadolibre	d_model=search-back	14.3.5	Termotanque Exahome Electrico 95 Litros Carga Inferior 1500w	u	1,00	4,00	$ 349.000,00		$349.000,00	$1.396.000,00	0,46%	$ 368.575,64	$224.541,41	$ 1.989.117,05	$ 198.911,70	$ 2.188.028,75	$ 2.188.028,75		
		14.4	**AYUDA A GREMIOS 11,83%**		1,00				$0,00	$2.063.127,55	0,69%	$ 544.712,43	$331.846,40	$ 2.939.686,38	$ 293.968,64	$ 3.233.655,02	$ 3.233.655,02		
		15,00	**INSTALACION SANITARIA**																
		15.1	**SECTOR 1: PROVISION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS**																
VIVIENDA C1	580-0050	15.1.1	Nucleo C	u	1,00	4,00	$ 1.782.771,60		$1.782.771,60	$7.131.086,40	2,37%	$ 1.882.768,43	$1.147.008,74	$ 10.160.863,57	$ 1.016.086,36	$ 11.176.949,92	$ 11.176.949,92		
		15.2	**SECTOR 2: ARTEFACTOS Y MATERIALES DE INSTALACION**																
VIVIENDA C1	580-0170	15.2.2	Nucleo D	u	1,00	4,00	$ 526.247,27		$526.247,27	$2.104.989,08	0,70%	$ 555.764,82	$338.579,67	$ 2.999.333,57	$ 299.933,36	$ 3.299.266,93	$ 3.299.266,93		
		15.3	**SECTOR 3: CONEXION DE AGUA Y ALIMENTACION DE TANQUES**																
VIVIENDA C1	580-0230	15.3.1	Servicios generales de agua fria : sifon invertido	u	1,00	4,00	$ 287.193,66		$287.193,66	$1.148.774,64	0,38%	$ 303.302,54	$184.776,13	$ 1.636.853,31	$ 163.685,33	$ 1.800.538,64	$ 1.800.538,64		
		15.4																	
VIVIENDA C1	580-0970	15.4.1	Agua	gl	1,00	4,00	$ 717.855,07		$717.855,07	$2.871.420,28	0,96%	$ 758.120,03	$461.857,28	$ 4.091.397,59	$ 409.139,76	$ 4.500.537,35	$ 4.500.537,35		
VIVIENDA C1	580-1040	15.4.2	Cloacas	gl	1,00	4,00	$ 658.252,59		$658.252,59	$2.633.010,36	0,88%	$ 695.174,41	$423.509,93	$ 3.751.694,70	$ 375.169,47	$ 4.126.864,17	$ 4.126.864,17		
VIVIENDA C1	580-0270	15.4.3	Flotantes	u	1,00	4,00	$ 147.549,87		$147.549,87	$590.199,48	0,20%	$ 155.826,04	$94.931,39	$ 840.956,91	$ 84.095,69	$ 925.052,60	$ 925.052,60		
VIVIENDA C1	580-0320	15.4.4	Bomba presurizadora	u	1,00	4,00	$ 733.395,10		$733.395,10	$2.933.580,40	0,98%	$ 774.531,71	$471.855,50	$ 4.179.967,61	$ 417.996,76	$ 4.597.964,38	$ 4.597.964,38		
VIVIENDA C1	580-0460	15.4.5	Alimentacion a Tanques 20mm	ML	35,50	142,00	$ 21.790,72		$21.790,72	$3.094.282,24	1,03%	$ 816.960,64	$497.703,80	$ 4.408.946,68	$ 440.894,67	$ 4.849.841,34	$ 136.615,25		
VIVIENDA C1	580-0580	15.4.6	Montantes	ML		0,00	$ 29.080,04		$29.080,04	$0,00	0,00%	$ 0,00	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		
VIVIENDA C1	580-0680	15.4.7	Distribucion de agua fria	ML	41,00	164,00	$ 17.611,35		$17.611,35	$2.888.261,40	0,96%	$ 762.566,47	$464.566,11	$ 4.115.393,98	$ 411.539,40	$ 4.526.933,38	$ 110.413,01	$ 59.108.027,39	12,54%
		15.5	**SECTOR 4: COLECTOR 25m**																
VIVIENDA C1	580-0720	15.5.1	Puente de empalme	u	1,00	4,00	$ 143.068,00		$143.068,00	$572.272,00	0,19%	$ 151.092,78	$92.047,82	$ 815.412,60	$ 81.541,26	$ 896.953,86	$ 896.953,86		
VIVIENDA C1	580-0790	15.5.2	Bajadas	u	2,00	8,00	$ 75.566,42		$75.566,42	$604.531,36	0,20%	$ 159.609,98	$97.236,62	$ 861.377,96	$ 86.137,80	$ 947.515,76	$ 473.757,88		
		15.6	**SECTOR 5: DESAGUES PLUVIALES**																
VIVIENDA C1	580-0850	15.6.2	Embudos	u	4,00	16,00	$ 108.258,48		$108.258,48	$1.732.135,68	0,58%	$ 457.323,08	$278.607,59	$ 2.468.066,34	$ 246.806,63	$ 2.714.872,98	$ 678.718,24		
VIVIENDA C1	580-0860	15.6.3	Columnas verticales	ml	9,00	36,00	$ 20.424,22		$20.424,22	$735.271,92	0,24%	$ 194.128,45	$118.265,76	$ 1.047.666,13	$ 104.766,61	$ 1.152.432,74	$ 128.048,08		
VIVIENDA C1	580-0870	15.6.4	Albañales	ml	14,00	56,00	$ 16.733,52		$16.733,52	$937.077,12	0,31%	$ 247.409,60	$150.725,37	$ 1.335.212,09	$ 133.521,21	$ 1.468.733,30	$ 104.909,52		
		15.7	**SECTOR 6: DESAGUES CLOACALES**																
VIVIENDA C1	580-0900	15.7.1	Ventilaciones en azotea	u	1,00	4,00	$ 22.545,62		$22.545,62	$90.182,48	0,03%	$ 23.810,22	$14.505,52	$ 128.498,22	$ 12.849,82	$ 141.348,04	$ 141.348,04		
VIVIENDA C1	580-0920	15.7.2	Columnas de descarga y ventilacion	ml	3,80	15,20	$ 46.494,54		$46.494,54	$706.717,01	0,24%	$ 186.589,31	$113.672,80	$ 1.006.979,12	$ 100.697,91	$ 1.107.677,03	$ 291.493,96		
VIVIENDA C1	580-0940	15.7.3	Cloacas en planta baja	ml	8,00	32,00	$ 57.849,09		$57.849,09	$1.851.170,88	0,62%	$ 488.751,07	$297.753,96	$ 2.637.675,90	$ 263.767,59	$ 2.901.443,49	$ 362.680,44		
		15.8	**SECTOR 7: AGUA CALIENTE**																
VIVIENDA C1	580-0680	15.8.1	Distribucion de agua caliente	ml	25,00	100,00	$ 17.611,32		$17.611,32	$1.761.132,00	0,59%	$ 464.978,76	$283.271,54	$ 2.509.382,30	$ 250.938,23	$ 2.760.320,53	$ 110.412,82		
		15.9	**SECTOR 8:TANQUES**																
VIVIENDA C3	218-0310	15.9.1	Tanque de polietileno tricapa 1000L	u	1,00	4,00	$ 184.502,48		$184.502,48	$738.009,92	0,25%	$ 194.851,34	$118.706,15	$ 1.051.567,42	$ 105.156,74	$ 1.156.724,16	$ 1.156.724,16		
		15.10	**OTROS**																
Mecado Libre		15.10.1	Camara de inspeccion 60x60	u	1,00	4,00	$ 113.299,00		$113.299,00	$453.196,00	0,15%	$ 119.654,02	$72.894,89	$ 645.744,91	$ 64.574,49	$ 710.319,40	$ 710.319,40		
		15.11	**AYUDA A GREMIOS 6%**		1,00				$0,00	$2.134.638,04	0,71%	$ 563.592,82	$343.348,59	$ 3.041.579,45	$ 304.157,95	$ 3.345.737,40	$ 3.345.737,40		
		16,00	**INSTALACION DE GAS**																
		16.1	**GABINETE DE GAS, REGULADOR, APERTURA DE CANALETAS, TENDIDOS, PLANOS**																
VIVIENDA C1	540-0010	16.1.1	Instalacion de GN en vivienda 2 bocas	u	1,00	4,00	$ 1.263.023,76		$1.263.023,76	$5.052.095,04	1,68%	$ 1.333.867,59	$812.610,71	$ 7.198.573,34	$ 719.857,33	$ 7.918.430,67	$ 7.918.430,67		
VIVIENDA C1	540-0070	16.1.2	Boca de gas adicional	u	2,00	8,00	$ 439.747,50		$439.747,50	$3.517.980,00	1,17%	$ 928.826,45	$565.854,01	$ 5.012.660,46	$ 501.266,05	$ 5.513.926,50	$ 2.756.963,25		
VIVIENDA C1	540-0060	16.1.3	Colocacion de artefactos	u	4,00	16,00	$ 35.003,85		$35.003,85	$560.061,60	0,19%	$ 147.868,96	$90.083,83	$ 798.014,38	$ 79.801,44	$ 877.815,82	$ 219.453,96		
		16.2	**ARTEFACTOS(indicar modelo)**															$ 22.858.216,14	4,85%
VIVIENDA C3	052-0940	16.2.1	Calefactor TB 5000kcal/h	u	1,00	4,00	$ 117.685,12		$117.685,12	$470.740,48	0,16%	$ 124.286,16	$75.716,86	$ 670.743,49	$ 67.074,35	$ 737.817,84	$ 737.817,84		
VIVIENDA C3	052-0925	16.2.2	Calefactor TB 2200 kcal/h	U	2,00	8,00	$ 143.800,83		$143.800,83	$1.150.406,64	0,38%	$ 303.733,43	$185.038,63	$ 1.639.178,70	$ 163.917,87	$ 1.803.096,57	$ 901.548,28		
VIVIENDA C3	086-0380	16.2.3	Cocina	u	1,00	4,00	$ 721.552,37		$721.552,37	$2.886.209,48	0,96%	$ 762.024,71	$464.236,07	$ 4.112.470,26	$ 411.247,03	$ 4.523.717,29	$ 4.523.717,29		
		16.3	**AYUDA A GREMIOS 6,94%**		1,00				$0,00	$946.442,03	0,31%	$ 249.882,15	$152.231,68	$ 1.348.555,86	$ 134.855,59	$ 1.483.411,45	$ 1.483.411,45		
		17,00	**PERGOLA**																
Docente		17.1	Pergola de madera 3,50 x 1,90	u	1,00	4,00	$ 4.000.000,00		$4.000.000,00	$16.000.000,00	5,32%	$ 4.224.362,62	$2.573.540,53	$ 22.797.903,15	$ 2.279.790,31	$ 25.077.693,46	$ 25.077.693,46	$ 25.077.693,46	5,32%
		18,00	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																
Mercadolibre		18.1	Espejo de baño	m2	0,50	2,00	$ 180.000,00		$180.000,00	$360.000,00	0,12%	$ 95.048,16	$57.904,66	$ 512.952,82	$ 51.295,28	$ 564.248,10	$ 1.128.496,21	$ 564.248,10	0,12%
		19,00	**PINTURAS**																
VIVIENDA C1	566-0300	19.1.1	Al latex sobre revoque fino exterior	m2	216,71	866,84	$ 6.652,02		$6.652,02	$5.766.237,02	1,92%	$ 1.522.417,26	$927.477,79	$ 8.216.132,06	$ 821.613,21	$ 9.037.745,27	$ 41.704,33		
VIVIENDA C1	566-0260	19.1.2	Al latex sobre revoque fino interior	m2	167,21	668,84	$ 6.113,13		$6.113,13	$4.088.705,87	1,36%	$ 1.079.511,01	$657.653,14	$ 5.825.870,03	$ 582.587,00	$ 6.408.457,03	$ 38.325,80	$ 20.372.173,39	4,32%
VIVIENDA C1	566-0010	19.1.3	Al latex sobre cielorraso suspendido	m2	55,49	221,96	$ 8.230,52		$8.230,52	$1.826.846,22	0,61%	$ 482.328,80	$293.841,42	$ 2.603.016,45	$ 260.301,64	$ 2.863.318,09	$ 51.600,61		
VIVIENDA C1	566-0500	19.1.4	Al esmalte sintetico sobre carpinteria de madera (SUPERFICIE X 3)	m2	15,84	63,36	$ 20.770,33		$20.770,33	$1.316.008,11	0,44%	$ 347.455,97	$211.675,01	$ 1.875.139,09	$ 187.513,91	$ 2.062.653,00	$ 130.217,99		
		21,00	**VARIOS**																
Clarin	24-02		Limpieza final de obra	m2	57,00	228,00		$ 4.462,00	$4.462,00	$1.017.336,00	0,34%	$ 268.599,76	$163.634,71	$ 1.449.570,47	$ 144.957,05	$ 1.594.527,52	$ 27.974,17	$ 1.594.527,52	0,34%
		22,00	**OTROS**																
										$0,00									
									$0,00	$0,00	0,00%	$ 0,00	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!	$ 0,00	0,00%
										TOTAL	$300.639.173,95	100,00%	$79.375.555,49	$ 48.356.693,67	$ 428.371.423,12	$ 42.837.142,31	**$ 471.208.565,43**		**$ 462.809.532,22**	100,00%

FUENTE	CODIGO	ITEM	GASTOS GENERALES DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
C4	Zona A	**1**	Capataz de obra (+ cargas sociales)	mes	12	$1.712.773,30	$ 20.553.279,65
Docente		**2**	Jefe de Obra (+ cargas sociales)	mes	12	$3.230.250,00	$ 38.763.000,00
C4	Zona A	**3**	Sereno (+ cargas sociales)	mes	12	$1.273.379,62	$ 15.280.555,49
Docente		**4**	Provisión energia electrica de obra	mes	12	$40.000,00	$ 480.000,00
Docente		**5**	Provision de agua de obra	mes	12	$30.000,00	$ 360.000,00
C3	182-0300	**6**	Baños quimicos alquiler x3	mes	12	$41.000,00	$ 492.000,00
Docente		**7**	Seguridad e higiene	mes	12	$1.500.000,00	$ 18.000.000,00
Docente		**8**	Limpieza periodica de obra	mes	12	$400.000,00	$ 4.800.000,00
Docente		**9**	Seguros	mes	12	$100.000,00	$ 1.200.000,00
						TOTAL 1 VIVIENDA	$ 79.375.555,49

FUENTE	CODIGO	ITEM	GASTOS GENERALES INDIRECTOS (de una empresa)	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Docente		**1**	Alquiler de oficina empresa	mes	12	$1.000.000,00	$ 12.000.000,00
Docente		**2**	Energia electrica	mes	12	$40.000,00	$ 480.000,00
Docente		**3**	Internet	mes	12	$40.000,00	$ 480.000,00
Docente		**4**	Gas	mes	12	$40.000,00	$ 480.000,00
Docente		**5**	Telefonia	mes	12	$100.000,00	$ 1.200.000,00
Docente		**6**	Limpieza	mes	12	$400.000,00	$ 4.800.000,00
Docente		**7**	Personal administrativo	mes	12	$3.000.000,00	$ 36.000.000,00
Docente		**8**	Utiles y enseres	mes	12	$250.000,00	$ 3.000.000,00
Docente		**9**	Gastos de representación		12	$1.200.000,00	$ 14.400.000,00
							$ 0,00
						TOTAL	$ 72.840.000,00

OBRA A	$300.639.173,95	66,39%	$ 48.356.693,67
OBRA B	$79.375.555,49	17,53%	$ 12.767.263,07
OBRA C	$72.840.000,00	16,08%	$ 11.716.043,26
TOTAL	$452.854.729,44	100,00%	$ 72.840.000,00

PRECIO	$	471.208.565,43
IVA 21%	$	98.953.798,74
IIBB 3,5%	$	16.492.299,79
PRECIO FINAL DE LA OBRA con impuestos	$	**586.654.663,96**



CATEDRA GALAVERNA 2025

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Diagrama de Gantt

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

		IMPORTE	INCID.	MESES								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES	19.453.474,81	4,18%	100,00%								
				$ 19.453.474,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2,00	MOVIMIENTO DE SUELOS	8.151.624,70	1,73%	25,00%	50,00%	25,00%						
				$ 2.037.906,17	$ 4.075.812,35	$ 2.037.906,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,00	ESTRUCTURA RESISTENTE	53.944.200,35	11,45%		25,00%	50,00%	25,00%					
				$ -	$ 13.486.050,09	$ 26.972.100,18	$ 13.486.050,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4,00	MAMPOSTERIA	50.024.289,08	12,35%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%				
				$ -	$ 5.002.428,91	$ 15.007.286,72	$ 15.007.286,72	$ 15.007.286,72	$ -	$ -	$ -	$ -
5,00	CAPAS AISLADORAS	3.381.640,35	0,72%		25,00%	50,00%	25,00%					
				$ -	$ 845.410,09	$ 1.690.820,18	$ 845.410,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6,00	CUBIERTAS	24.097.893,25	5,11%				50,00%	50,00%				
				$ -	$ -	$ -	$ 12.048.946,63	$ 12.048.946,63	$ -	$ -	$ -	$ -
7,00	REVOQUES	48.815.392,44	10,36%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				$ -	$ -	$ -	$ 12.203.848,11	$ 12.203.848,11	$ 12.203.848,11	$ 12.203.848,11	$ -	$ -
8,00	YESERIA	4.983.671,39	1,06%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.245.917,85	$ 1.245.917,85	$ 1.245.917,85	$ 1.245.917,85
9,00	CONTRAPISOS Y CARPETAS	12.795.175,38	2,72%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.198.793,84	$ 3.198.793,84	$ 3.198.793,84	$ 3.198.793,84	$ -
10,00	PISOS Y REVESTIMIENTOS	4.461.788,39	0,95%							25,00%	25,00%	25,00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.115.447,10	$ 1.115.447,10	$ 1.115.447,10
11,00	CARPINTERIAS	3.659.057,66	0,78%				5,00%	5,00%		20,00%	20,00%	20,00%
				$ -	$ -	$ -	$ 182.952,88	$ 182.952,88	$ -	$ 731.811,53	$ 731.811,53	$ 731.811,53
12,00	HERRERIAS	13.160.564,69	2,79%									
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13,00	AMOBLAMIENTOS Y MESADAS	3.627.836,92	0,77%								25,00%	25,00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 906.959,23	$ 906.959,23
14,00	INSTALACION ELECTRICA	82.678.036,79	17,55%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.267.803,68	$ 8.267.803,68	$ 8.267.803,68	8267803,679	$ 12.401.705,52
15,00	INSTALACION SANITARIA	59.108.027,39	12,54%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
				$ -	$ -	$ -	$ 5.910.802,74	$ 5.910.802,74	$ 5.910.802,74	$ 5.910.802,74	$ 8.866.204,11	$ 8.866.204,11
16,00	INSTALACION DE GAS	22.858.216,14	4,85%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.428.732,42	$ 3.428.732,42	$ 3.428.732,42	$ 3.428.732,42	$ -
17,00	PERGOLA	25.077.693,46	5,32%									50,00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.538.846,73
18,00	VIDRIOS Y ESPEJOS	564.248,10	0,12%									
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19,00	PINTURAS	20.372.173,39	4,32%									40,00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.148.869,36
21,00	VARIOS	1.594.527,52	0,34%									
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22,00	OTROS	0,00	0,00									
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INVERSION MENSUAL ($)			$ 21.491.382,23	$ 23.409.702,53	$ 45.708.114,80	$ 59.685.298,96	$ 60.249.168,73	$ 34.255.899,74	$ 36.103.158,82	$ 27.761.671,36	$ 45.955.763,57
	INVERSION ACUMULADA ($)	$ 462.809.532,22	100,00%	$ 21.491.382,23	$ 44.901.084,77	$ 90.609.199,57	$ 150.294.498,53	$ 210.543.667,26	$ 244.799.567,00	$ 280.902.725,82	$ 308.664.397,18	$ 354.620.160,75
	INVERSION MENSUAL (%)			4,64%	5,06%	9,88%	12,90%	13,02%	7,40%	7,80%	6,00%	9,93%
	INVERSION ACUMULADA (%)			4,64%	9,70%	19,58%	32,47%	45,49%	52,89%	60,70%	66,69%	76,62%

10	11	12	
ABRIL	MAYO	JUNIO	
			100,00%
$ -	$ -	$ -	19453474,81
			100,00%
$ -	$ -	$ -	8151624,70
			100,00%
$ -	$ -	$ -	53944200,35
			100,00%
$ -	$ -	$ -	50024289,08
			100,00%
$ -	$ -	$ -	3381640,35
			100,00%
$ -	$ -	$ -	24097893,25
			100,00%
$ -		$ -	48815392,44
			100,00%
$ -	$ -	$ -	4983671,39
			100,00%
$ -	$ -	$ -	12795175,38
25,00%			100,00%
$ 1.115.447,10	$ -	$ -	4461788,39
20,00%	10,00%		100,00%
$ 731.811,53	$ 365.905,77	$ -	3659057,66
50,00%	50,00%		100,00%
$ 6.580.282,35	$ 6.580.282,35	$ -	13160564,69
25,00%	25,00%		100,00%
$ 6.580.282,35	$ 6.580.282,35	$ -	13160564,69
25,00%	25,00%		100,00%
$ 906.959,23	$ 906.959,23	$ -	3627836,92
15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
$ 12.401.705,52	$ 12.401.705,52	$ 12.401.705,52	82678036,79
15,00%	15,00%		100,00%
$ 8.866.204,11	$ 8.866.204,11	$ -	59108027,39
20,00%	20,00%		100,00%
$ 4.571.643,23	$ 4.571.643,23	$ -	22858216,14
50,00%			100,00%
$ 12.538.846,73	$ -	$ -	25077693,46
	100,00%		100,00%
$ -	$ 564.248,10	$ -	564248,10
40,00%	20,00%		100,00%
$ 8.148.869,36	$ 4.074.434,68	$ -	20372173,39
	100,00%		100,00%
$ -	$ 1.594.527,52	$ -	1594527,52
			0,00%
$ -	$ -	$ -	#¡VALOR!

$ 55.861.771,75	**$ 39.925.914,05**	**$ 12.401.705,67**	**$ 462.809.552,22**
$ 410.481.932,50	**$ 450.407.846,55**	**$ 462.809.552,22**	
12,07%	**8,63%**	**2,68%**	**100,00%**
88,69%	**97,32%**	**100,00%**	



CATEDRA GALAVERNA 2025

GRÁFICOS DE INVERSION


MENSUAL Y ANUAL

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

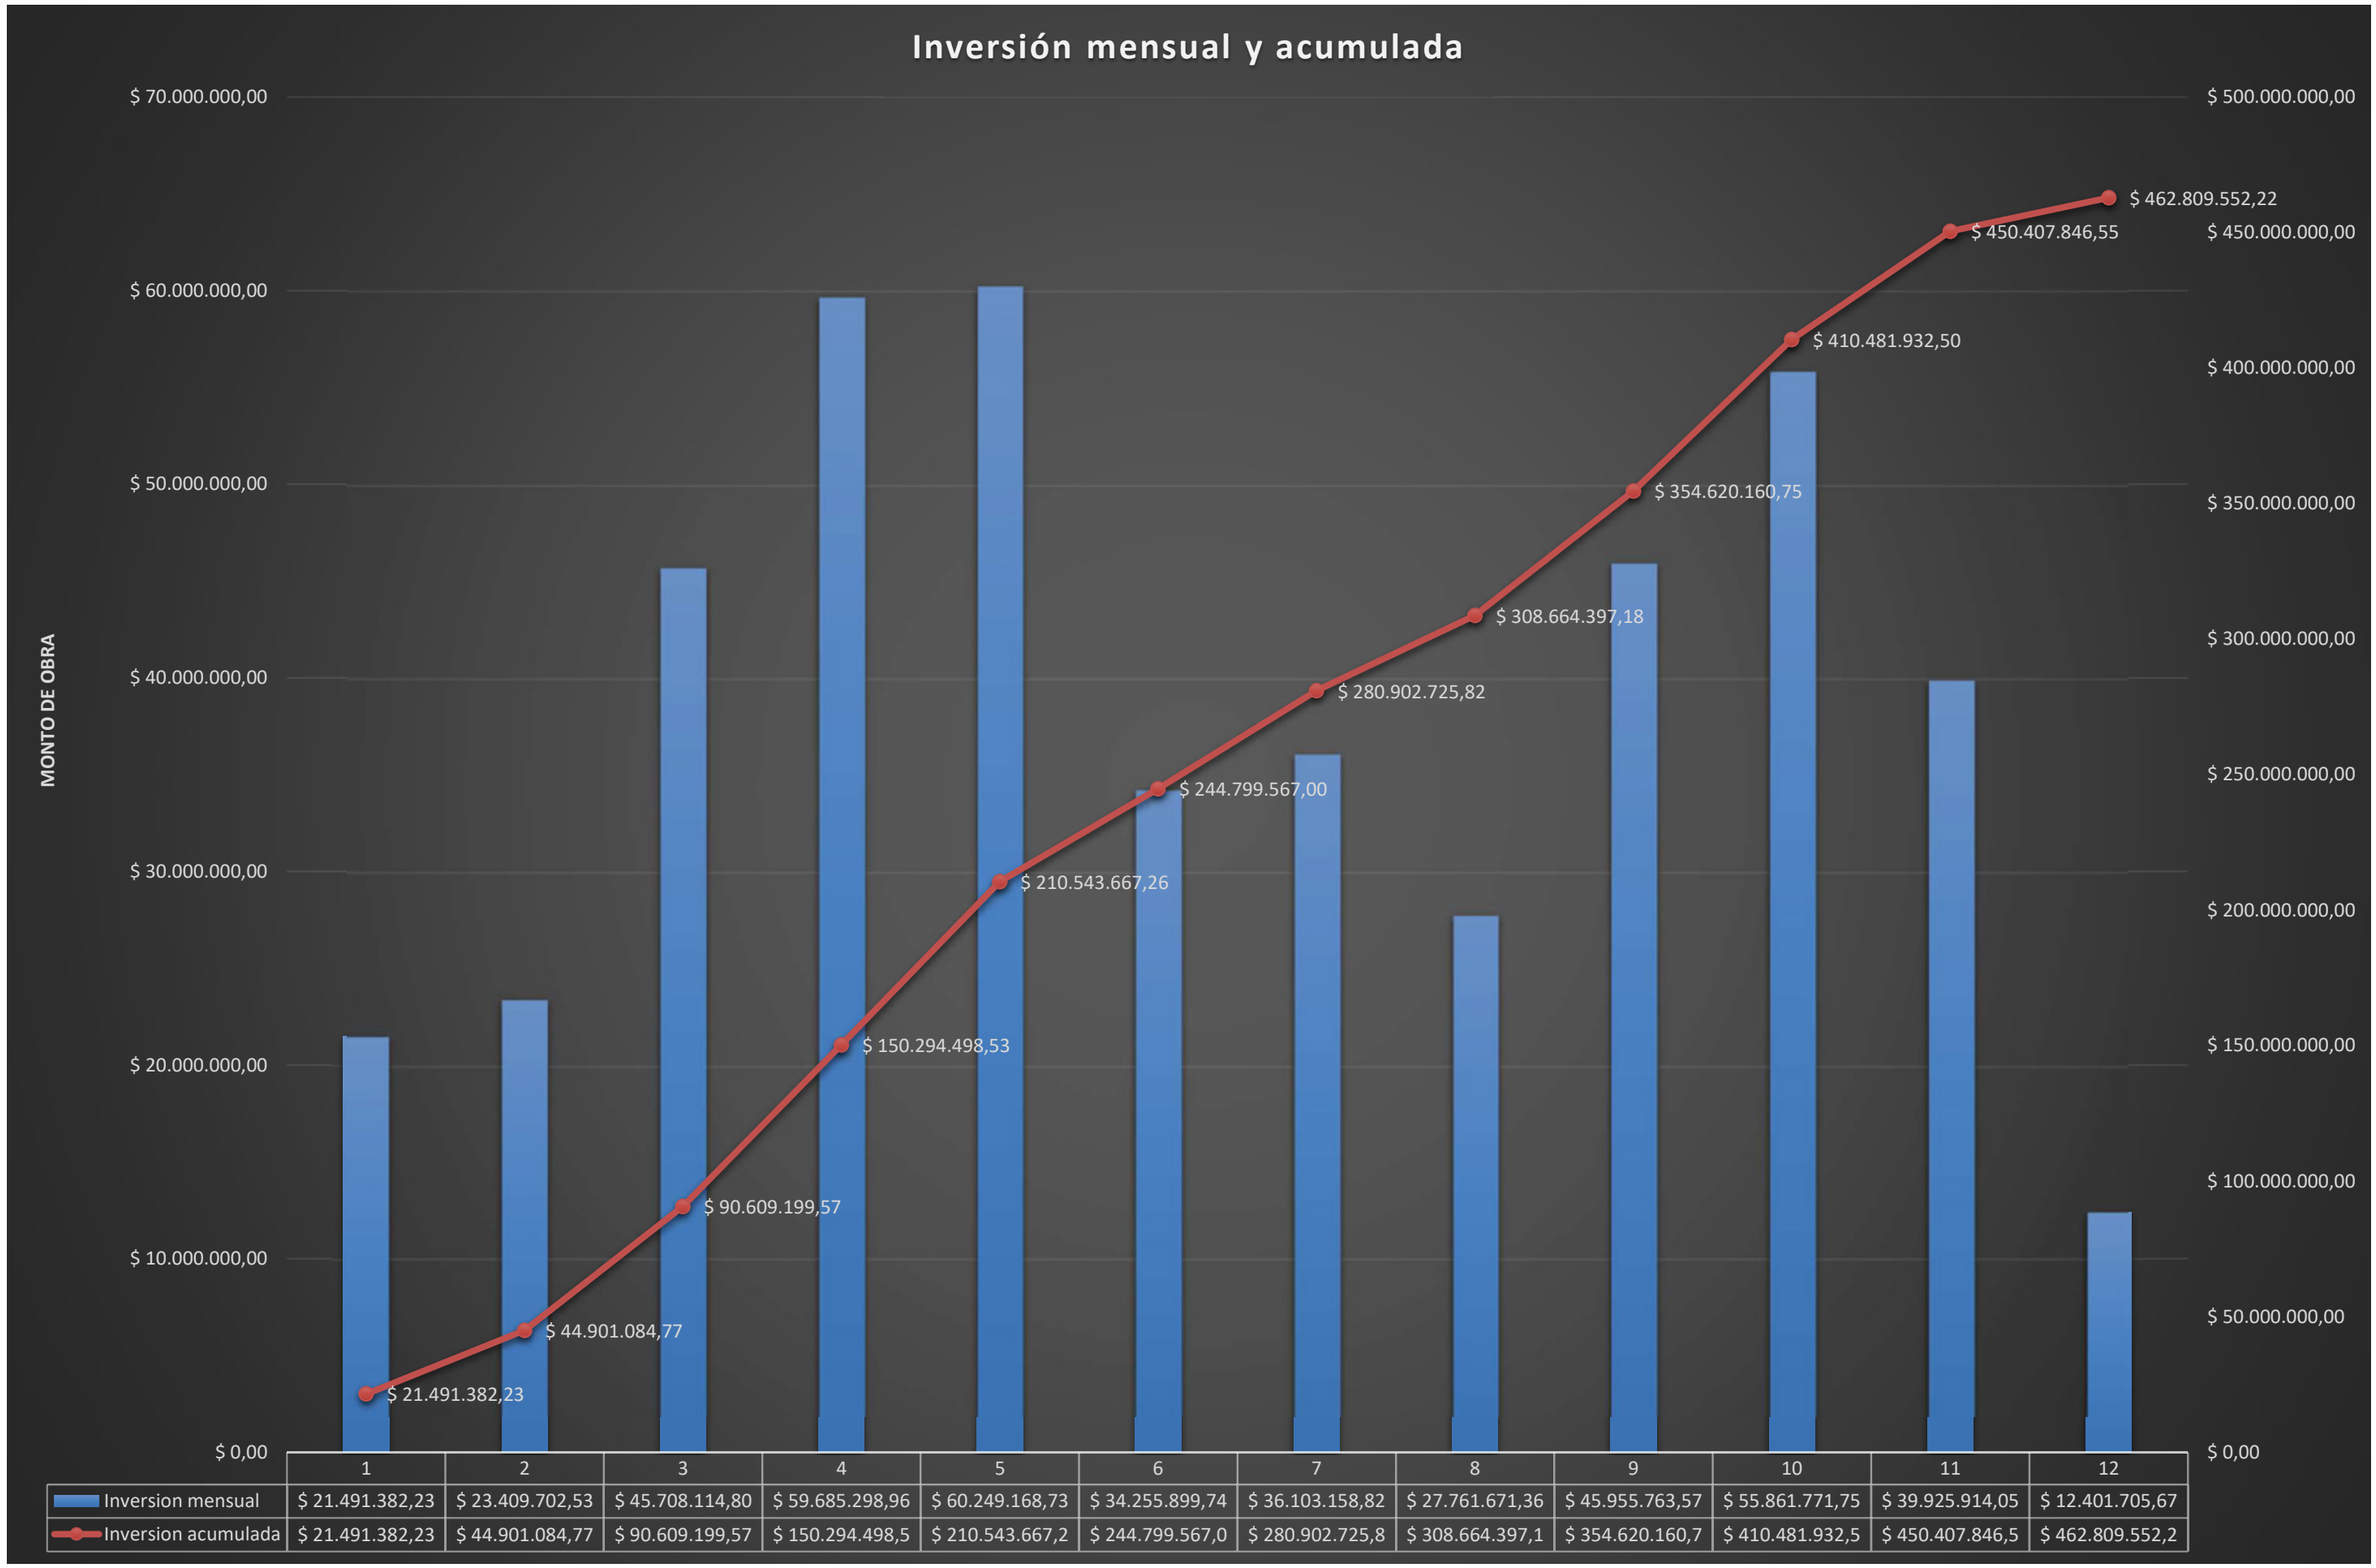

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inversion mensual	$ 21.491.382,23	$ 23.409.702,53	$ 45.708.114,80	$ 59.685.298,96	$ 60.249.168,73	$ 34.255.899,74	$ 36.103.158,82	$ 27.761.671,36	$ 45.955.763,57	$ 55.861.771,75	$ 39.925.914,05	$ 12.401.705,67
Inversion acumulada	$ 21.491.382,23	$ 44.901.084,77	$ 90.609.199,57	$ 150.294.498,5	$ 210.543.667,2	$ 244.799.567,0	$ 280.902.725,8	$ 308.664.397,1	$ 354.620.160,7	$ 410.481.932,5	$ 450.407.846,5	$ 462.809.552,2



CATEDRA GALAVERNA 2025

PLANILLAS DE CERTIFICACIÓN DE OBRA

INTEGRANTES **GRUPO 14**

Guajardo, Santiago
Dominguez, Juan Ignacio
Colavita, Juan Cruz

AYUDANTE:

Arq. Gabriel Babbicola
Arq. Nicolas Gacham

OBRA: 4 VIVIENDAS 2025 CATEDRA EyOO 2025

CERTIFICADO Nº 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL (del ítem)	INCIDENCIA %	Acumulado anterior %	Acumulado actual %	Presente cerificado %	Acumulado anterior $	Acumulado actual $	Presente cerificado $
01	TRABAJOS PRELIMINARES	$ 19453474,81	4,18%	100%	100%	0%	$ 19.453.474,81	$ 19.453.474,81	$ 0,00
02	MOVIMIENTO DE SUELOS	$ 8151624,70	1,73%	100%	100%	0%	$ 8.151.624,70	$ 8.151.624,70	$ 0,00
03	ESTRUCTURA RESISTENTE	$ 53944200,35	11,45%	75%	100%	25%	$ 40.458.150,27	$ 53.944.200,35	$ 13.486.050,09
04	MAMPOSTERIA	$ 50024289,08	12,35%	40%	70%	30%	$ 20.009.715,63	$ 35.017.002,35	$ 15.007.286,72
05	CAPAS AISLADORAS	$ 3381640,35	0,72%	75%	100%	25%	$ 2.536.230,27	$ 3.381.640,35	$ 845.410,09
06	CUBIERTAS	$ 24097893,25	5,11%	0%	50%	50%	$ 0,00	$ 12.048.946,63	$ 12.048.946,63
07	REVOQUES	$ 48815392,44	10,36%	0%	25%	25%	$ 0,00	$ 12.203.848,11	$ 12.203.848,11
08	YESERIA	$ 4983671,39	1,06%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09	CONTRAPISOS Y CARPETAS	$ 12795175,38	2,72%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10	PISOS Y REVESTIMIENTOS	$ 4461788,39	0,95%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11	CARPINTERIAS	$ 3659057,66	0,78%	0%	5%	5%	$ 0,00	$ 182.952,88	$ 182.952,88
12	HERRERIAS	$ 13160564,69	2,79%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
13	AMOBLAMIENTOS Y MESADAS	$ 3627836,92	0,77%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
14	INSTALACION ELECTRICA	$ 82678036,79	17,55%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
15	INSTALACION SANITARIA	$ 59108027,39	12,54%	0%	10%	10%	$ 0,00	$ 5.910.802,74	$ 5.910.802,74
16	INSTALACION DE GAS	$ 22858216,14	4,85%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
17	PERGOLA	$ 25077693,46	5,32%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
18	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 564248,10	0,12%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19	PINTURAS	$ 20372173,39	4,32%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
20	VARIOS	$ 1594527,52	0,34%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
21	OTROS	$ 0,00	0,00%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
22			0,00%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	TOTAL	$ 462809532,22	100,00%	20%	32%	9%	$ 90.609.195,67	$ 150.294.492,93	$ 59.685.297,26

ANTICIPO FINANCIERO		20,00%	$ -11.937.059,45
FONDO DE REPARO		5,00%	$ -2.984.264,86
SUB TOTAL			**$ 44.763.972,94**
	indice base	indice actual	
ACTUALIZACION	32,5%	12,9%	
		4,24%	**$ 1.897.642,21**
A COBRAR ACTUALIZADO			**$ 46.661.615,15**
IVA		21,00%	$ 9.798.939,18
TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 56.460.554,33**

OBRA: 4 VIVIENDAS 2025 CATEDRA JAVIER GALAVERNA EyOO 2025

CERTIFICADO Nº 5

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL (del ítem)	INCIDENCIA %	Acumulado anterior %	Acumulado actual %	Presente cerificado %	Acumulado anterior $	Acumulado actual $	Presente cerificado $
01	TRABAJOS PRELIMINARES	$ 19453474,81	4,18%	100%	100%	0%	$ 19.453.474,81	$ 19.453.474,81	$ 0,00
02	MOVIMIENTO DE SUELOS	$ 8151624,70	1,73%	100%	100%	0%	$ 8.151.624,70	$ 8.151.624,70	$ 0,00
03	ESTRUCTURA RESISTENTE	$ 53944200,35	11,45%	100%	100%	0%	$ 53.944.200,35	$ 53.944.200,35	$ 0,00
04	MAMPOSTERIA	$ 50024289,08	12,35%	70%	100%	30%	$ 35.017.002,35	$ 50.024.289,08	$ 15.007.286,72
05	CAPAS AISLADORAS	$ 3381640,35	0,72%	100%	100%	0%	$ 3.381.640,35	$ 3.381.640,35	$ 0,00
06	CUBIERTAS	$ 24097893,25	5,11%	50%	100%	50%	$ 12.048.946,63	$ 24.097.893,25	$ 12.048.946,63
07	REVOQUES	$ 48815392,44	10,36%	25%	50%	25%	$ 12.203.848,11	$ 24.407.696,22	$ 12.203.848,11
08	YESERIA	$ 4983671,39	1,06%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
09	CONTRAPISOS Y CARPETAS	$ 12795175,38	2,72%	0%	25%	25%	$ 0,00	$ 3.198.793,84	$ 3.198.793,84
10	PISOS Y REVESTIMIENTOS	$ 4461788,39	0,95%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11	CARPINTERIAS	$ 3659057,66	0,78%	5%	10%	5%	$ 182.952,88	$ 365.905,77	$ 182.952,88
12	HERRERIAS	$ 13160564,69	2,79%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
13	AMOBLAMIENTOS Y MESADAS	$ 3627836,92	0,77%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
14	INSTALACION ELECTRICA	$ 82678036,79	17,55%	0%	10%	10%	$ 0,00	$ 8.267.803,68	$ 8.267.803,68
15	INSTALACION SANITARIA	$ 59108027,39	12,54%	10%	20%	10%	$ 5.910.802,74	$ 11.821.605,48	$ 5.910.802,74
16	INSTALACION DE GAS	$ 22858216,14	4,85%	0%	15%	15%	$ 0,00	$ 3.428.732,42	$ 3.428.732,42
17	PERGOLA	$ 25077693,46	5,32%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
18	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 564248,10	0,12%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19	PINTURAS	$ 20372173,39	4,32%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
20	VARIOS	$ 1594527,52	0,34%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
21	OTROS	$ 0,00	0,00%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
22			0,00%	0%	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
				0%					
	TOTAL	$ 462809532,22	100,00%	32%	45%	9%	$ 150.294.492,93	$ 210.543.659,96	$ 60.249.167,03

ANTICIPO FINANCIERO		20,00%	$ -12.049.833,41
FONDO DE REPARO		5,00%	$ -3.012.458,35
SUB TOTAL			**$ 45.186.875,27**
	indice base	indice actual	
ACTUALIZACION	45,5%	13,0%	
		4,24%	**$ 1.915.569,96**
A COBRAR ACTUALIZADO			**$ 47.102.445,23**
IVA		21,00%	$ 9.891.513,50
TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 56.993.958,72**
